

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Gobierno de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 40.75%
- Real: 56.18%
- Semanal: 1.83%
- Financiero: 43.69%

Avance 2025

- Programado: 71.0%
- Real: 98.90%
- Semanal: 0.08%
- Financiero: 98.36%

Inversión total 2025-2026: 450 mdp
Inversión 2025: 200 mdp | 1.35 km del Deprimido

Meta total: 1 Deprimido | **1.5 km**
Gasas | 4.1 km

Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: Junio de 2026
Término meta 2025: Diciembre

351,000 habitantes beneficiados

1,350 empleos generados

25 min ahorro en tiempo


Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.



Baja California Sur

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance: Programado, Físico y Financiero

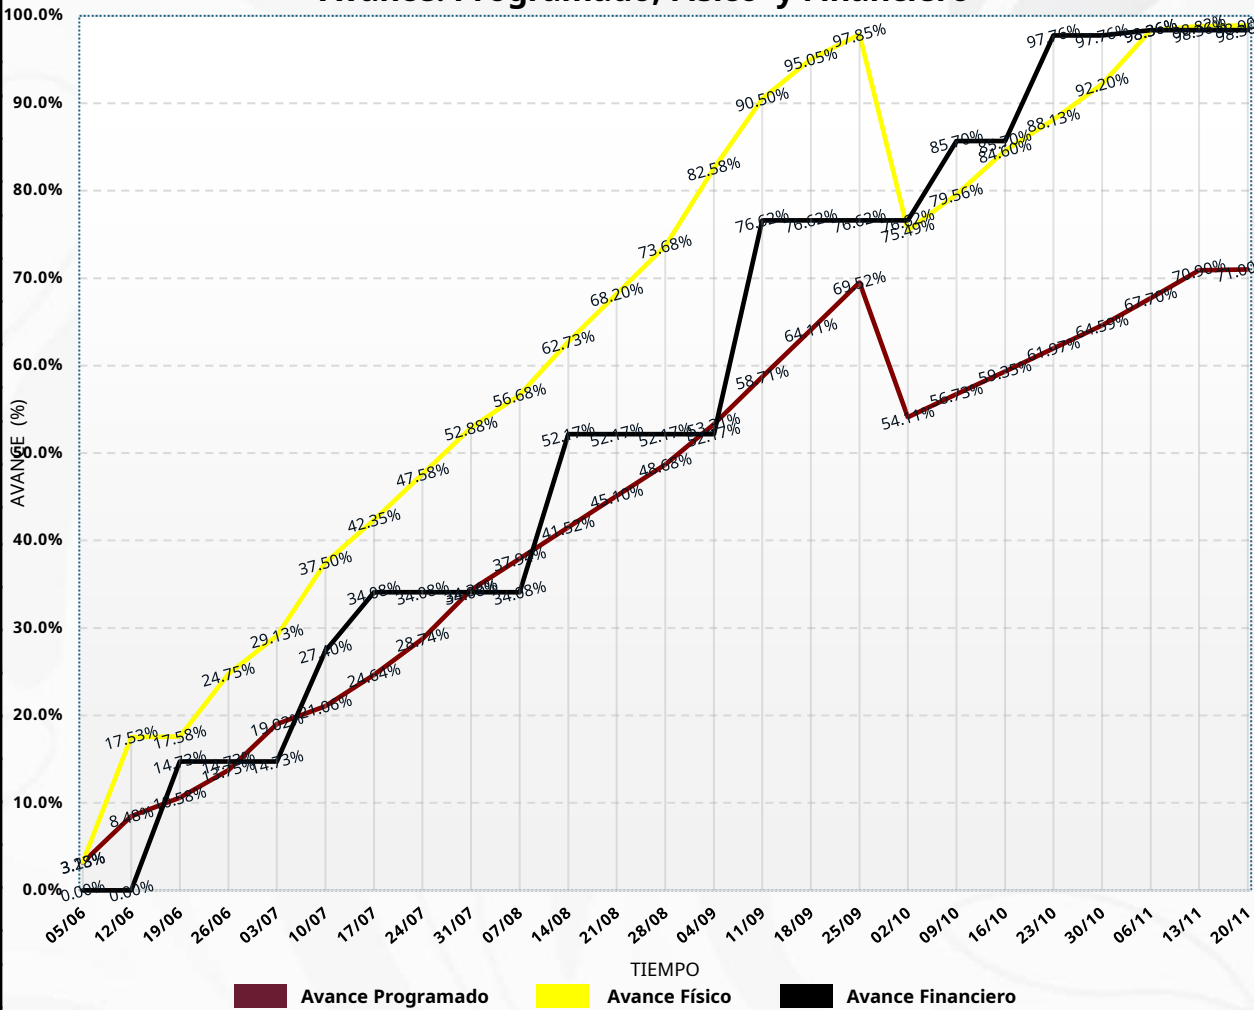

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Retiro de vegetación (pzas)	500.0	480.0	20.0	0.0	0.0	
Reubicación de Monumento FONATUR (pza)	1.0	0.70	0.30	0.0	0.0	
Terracerías						
Terracerías (m3)	14,112.0	5,370.0	8,742.0	0.0	200.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	17,420.5	82,648.7	7,697.6	380.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	0.0	0.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	4,445.0	7,395.0	0.0	380.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	20.0	9.0	11.0	0.0	1.0	
Muros de 2 a 7 m (pzas)	20.0	9.0	11.0	1.4	1.0	
Pilas tangentes (pzas)	1,100.0	1,062.0	38.0	0.0	63.0	
Trabes de liga (m)	1,123.6	410.0	713.6	0.0	40.0	
Fabricación de cabezal (pzas)	8.0	1.5	6.5	1.0	1.0	
Fabricación trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	33.0	19.0	6.5	4.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	0.0	52.0	7.4	0.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	0.0	1,642.8	0.0	0.0	
Guarnición y banquetas (m3)	3,629.2	29.0	3,600.2	0.0	4.0	
Pavimento rígido (m3)	5,227.0	0.0	5,227.0	0.0	0.0	
Pavimento flexible (m3)	34,720.0	142.08	34,577.92	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,795.2	0.0	1,795.2	0.0	0.0	
Semaforización						
Semaforización (%)	100	0.0	100	0.0	0.0	
Obra inducida						
Reubicación de línea de media tensión de CFE (m)	1,723.0	1,630.0	93.0	0.0	0.0	Cambio de volumen total por actualización de proyecto.
Reubicación de acueducto (m)	1,023.0	1,023.0	-	-	-	Concluido
Reubicación de línea de distribución (m)	910.0	910.0	-	-	-	Concluido

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	97	97
Maquinaria	16	16
