

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance global**
 - Programado: 21.25%
 - Real: 56.16%
 - Semanal: 3.9%
 - Financiero: 45.31%
- Avance 2025**
 - Programado 88.0%
 - Real: 92.0%
 - Semanal: 2.0%
 - Financiero: 80.67%

Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (50% de PSV)


Meta total: PSV | 0.811 km longitud total

Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: Agosto 2026
Término meta 2025: Diciembre

862,037 Habitantes beneficiados

1,140 empleos generados

20 min ahorro en tiempo

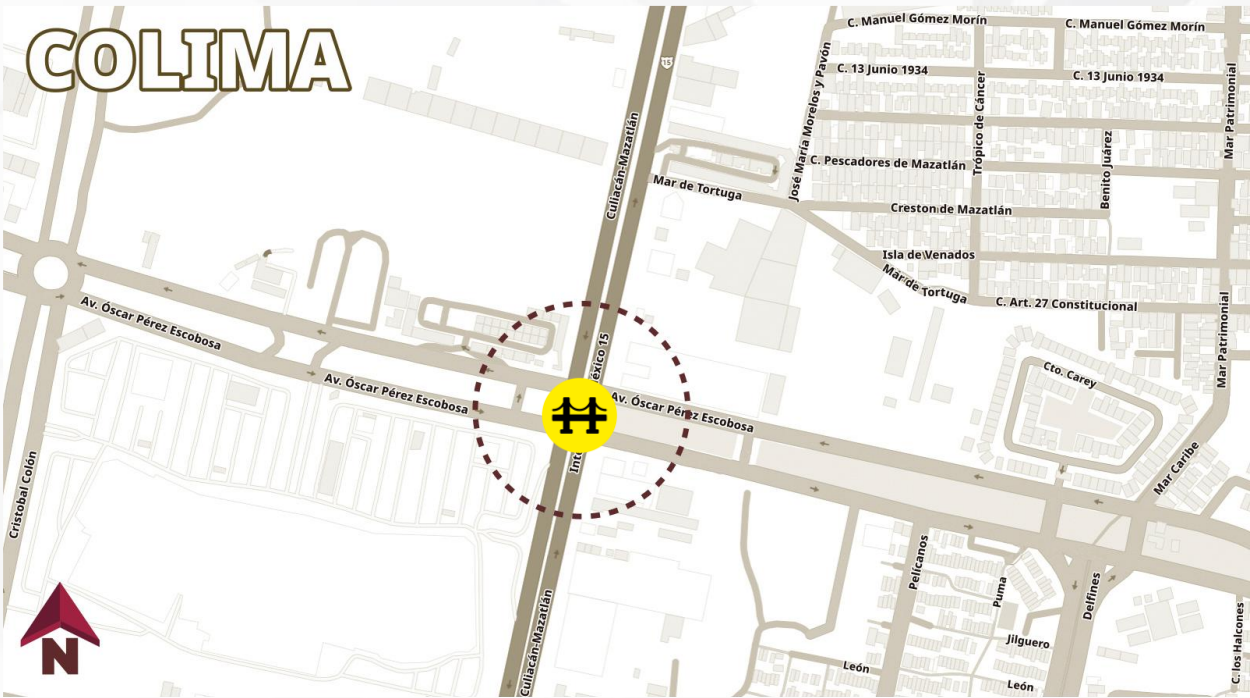


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

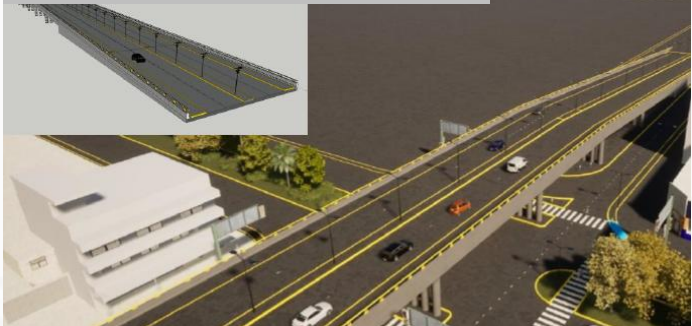

Proyecto

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 14 al 20/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Se continua trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.00	0.0	Se concluye la construcción de los
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	8.5	94.4%	0.5	0.50	0.2	Se tiene un total de 38 columnas concluidas
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	69	89.6%	8	8	8.0	Se tiene un total de 42 trabes AASHTO IV
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	55	71.4%	22	4.0	16.0	
Superestructura Fabricación de Trabes Nebrazka	pieza	11	6	54.5%	5	1.0	3.0	
Superestructura Montaje de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Se concluyó la fabricación de las
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	509.0	37.3%	856	122.3	93.0	Inició la colocación de escamas
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	2,491	19.3%	10,449	2,615.3	1,512.0	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0.0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

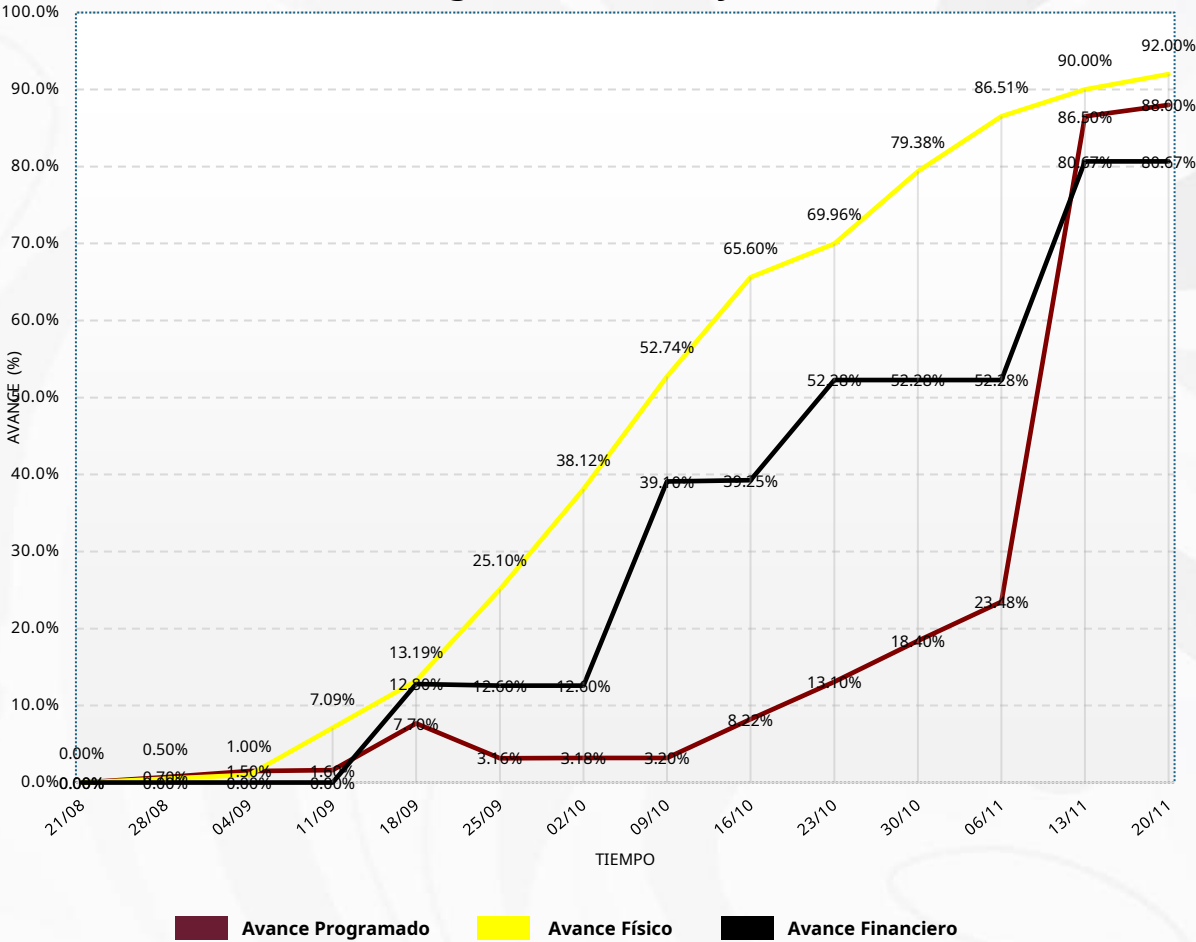

	Del 07 de noviembre al 13 de noviembre	Del 14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	178	178
Maquinaria	31	31
