

Circuito Tierra y Libertad

Puente Jojutla (Morelos)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

CONCLUIDA

- Inversión:** 26.6 mdp
- Meta:** 1 puente de 0.270 km (0.04 km estructura y 0.230 km de accesos)
- Avance programado :** 100.0%
Avance real: 100.0%
Avance financiero: 88.42%
- Fecha de inicio:** 26 de marzo, 2025
Fecha de término: 24 de septiembre, 2025
- 35,897** habitantes beneficiados
- 80** empleos generados
- 20 minutos** de ahorro de tiempo
- Optimiza la Conexión de las comunidades aledañas al Circuito Tierra y Libertad, modernizando el tramo vehicular existente

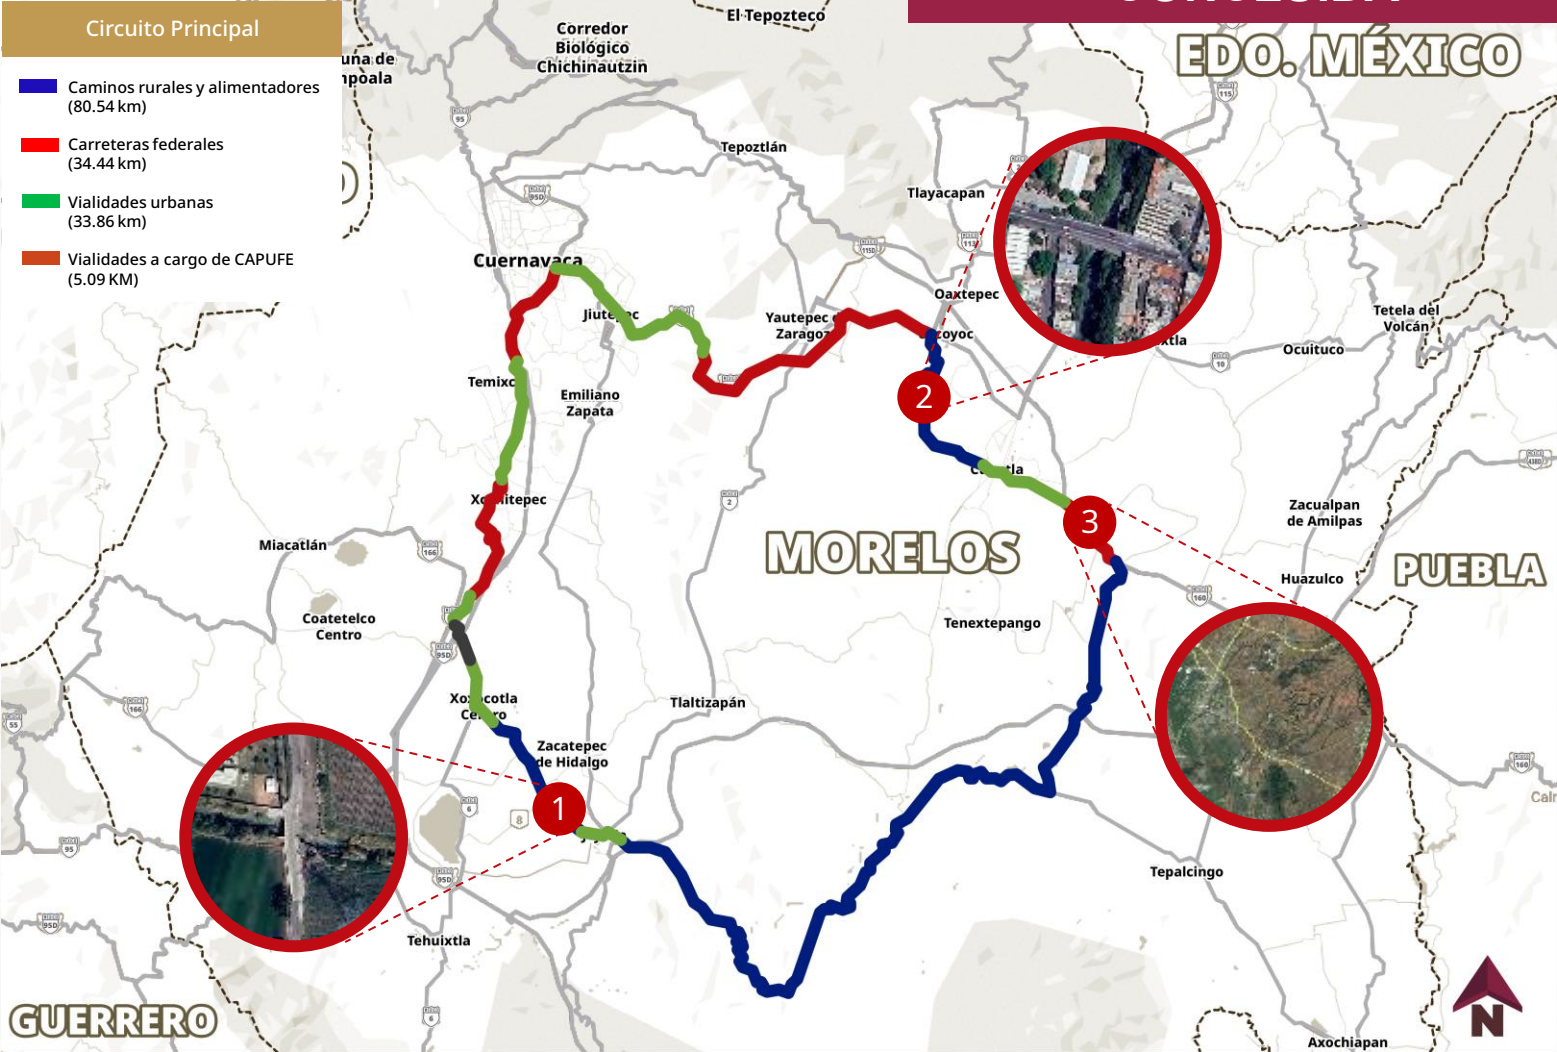

Tramo	Empresas
Construcción "Puente Jojutla"	Contratista: Consultoría y Construcciones SIBAMSA, S.A. de C.V. y Corporativo Constructor IOBSA, S.A. de C.V. Supervisión: Especialista en Diseño de Infraestructura Funcional, Ingenieros, S.A de C.V.

- 1 Puente Jojutla**
- 2 Libramiento del Hospital**
- 3 Conservación**

*Trabajos concluidos con fecha 27 de septiembre de 2025

Circuito Tierra y Libertad

Puente Jojutla (Morelos)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

CONCLUIDA

- Inversión:** 26.6 mdp
- Meta:** 1 puente de 0.270 km (0.04 km estructura y 0.230 km de accesos)
- Avance programado :** 100.0%
Avance real: 100.0%
Avance financiero: 88.42%
- Fecha de inicio:** 26 de marzo, 2025
Fecha de término: 24 de septiembre, 2025
- 35,897** habitantes beneficiados
- 80** empleos generados
- 20 minutos** de ahorro de tiempo
- Optimiza la Conexión de las comunidades aledañas al Circuito Tierra y Libertad, modernizando el tramo vehicular existente



Tramo	Empresas
Construcción "Puente Jojutla"	Contratista: Consultoría y Construcciones SIBAMSA, S.A. de C.V. y Corporativo Constructor IOBSA, S.A. de C.V. Supervisión: Especialista en Diseño de Infraestructura Funcional, Ingenieros, S.A de C.V.

Morelos

Puente Jojutla

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	03/10/25 al 09/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Cabezales (Pza)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Montaje de traves Pretensadas (Pza)	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	
Losa (m2)	367.2	367.2	0.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	11.43	11.43	0.0	0.0	0.0	
Terracerías Accesos (m3)	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	
Guarniciones, Parapetos y Banquetas (m)	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	
Armado de columnas en muro (Pza)	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Colado de columnas en muro (Pza)	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
Armado de muros (Pza)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Colado de muros (Pza)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	

