

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

• Programado: 10.96%

• Semanal: 1.80%

• Real: 17.60%

• Financiero: 15.20%

• **Nota:** La meta establecida para el 2025 (14 % de Distribuidor) ya se cumplió, sin embargo se siguen ejecutando trabajos que aumentan la meta global.

Avance 2025

• Programado: 78.29%

• Semanal: 12.86%

• Real: 100.00%

• Financiero: 100.00%

- 

Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial
- 

Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)
- 

Inicio: 16 de julio de 2025

Término: 31 de diciembre de 2026


Termino meta 2025: 31 de diciembre
- 

73,215 habitantes beneficiados
- 

1,950 empleos generados
- 

20 min ahorro en tiempo


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

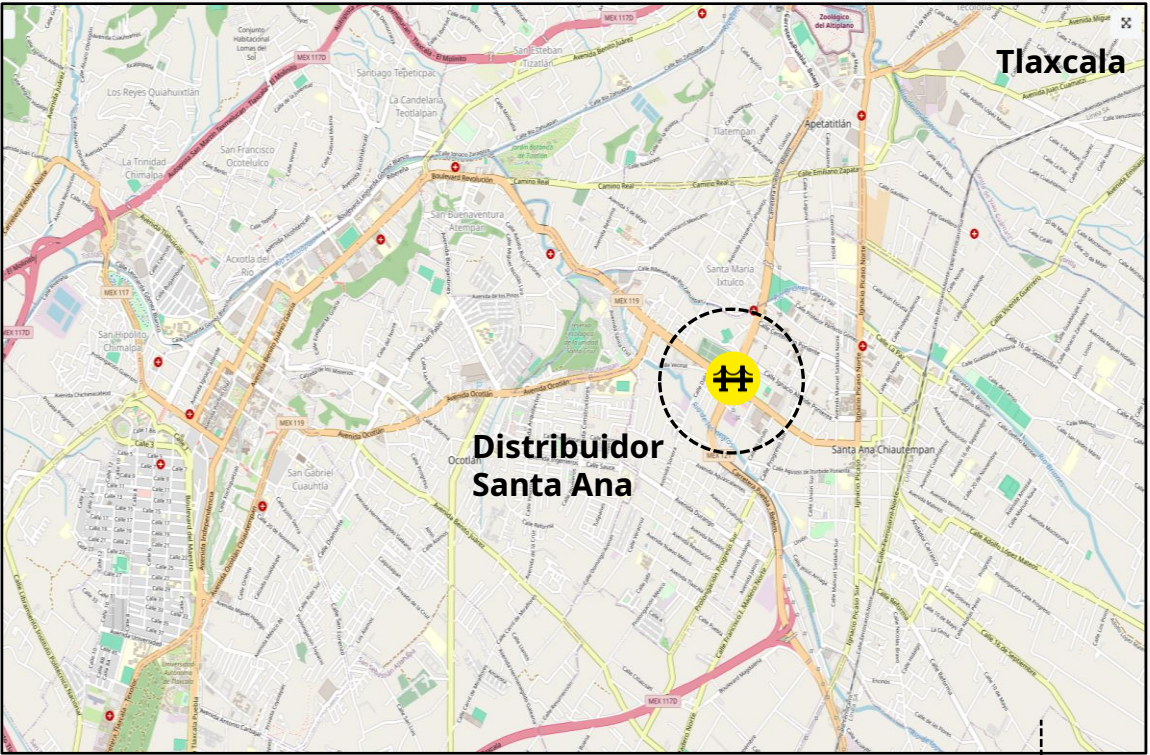

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	14 al 20-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	17.60% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	1.04%	1.80%	Se trabaja en zapatas de los ejes #5 y 7, columnas #10 al #15.

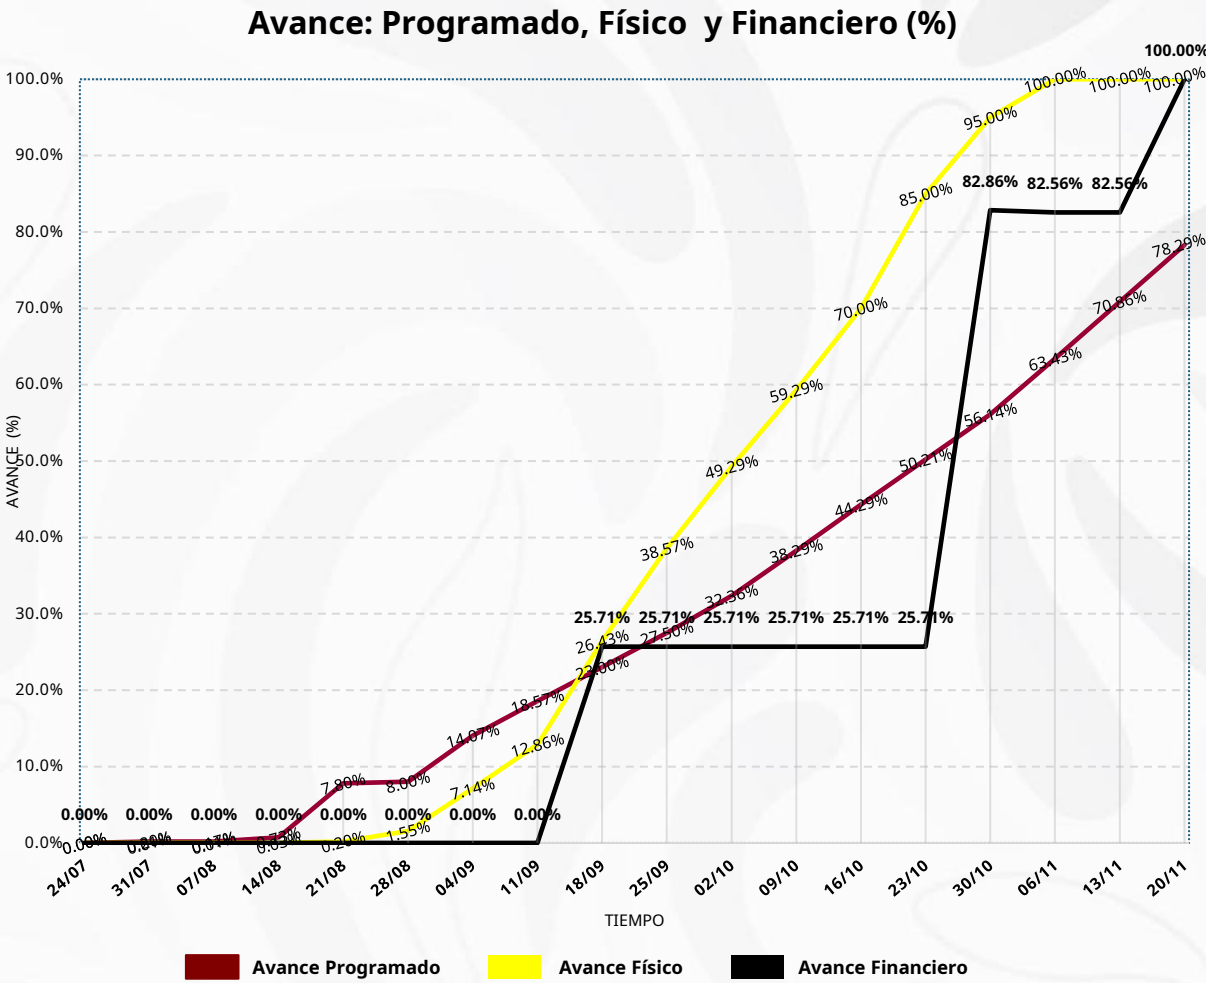

	07 al 13 de noviembre	14 al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	110	115
Maquinaria	20	15

Distribuidor Santa Ana Chiautempan

Programa de Obra

