

# Puente La Presa Trancas

## Colima

Avance global

• Programado: 29.32 %

• Real: 20.82 %

• Semanal: 7.56 %

• Financiero: 14.07 %

Avance 2025

• Programado: 73.30 %

• Real: 52.05 %

• Semanal: 18.90 %

• Financiero: 35.18 %

 **Inversión total 2025-2026:** 90.0 mdp

**Inversión 2025:** 30.0 mdp

 **Meta total:** 0.601 km

**Meta 2025:** 38.6 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025


**Fecha de término:** 10 de agosto, 2026

**Termino meta 2025:** 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

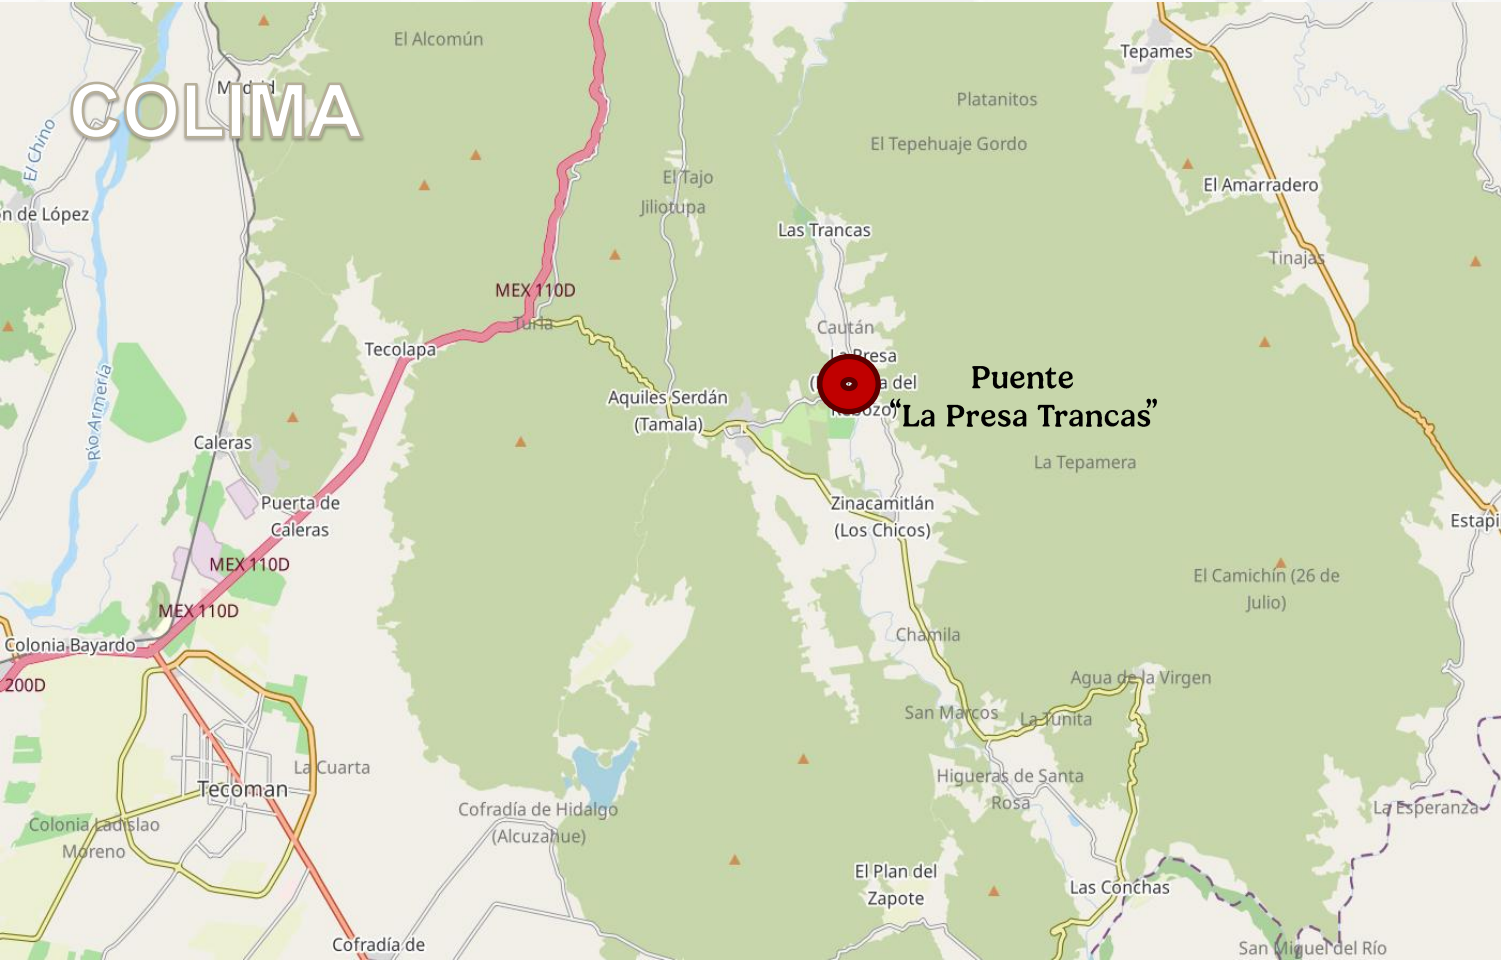

| Tramo                                    | Empresas                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Puente La Presa Trancas | <div><div>• <b>Contratista:</b> GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V</div><div>• <b>Supervisión:</b> ANMA INGENIERÍA, SA DE CV</div></div> |

# Puente La Presa Trancas

## Colima




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento                                              | Intervención | Ejecutado<br>acumulado | Faltante | 14/11/25 al 20/11/25 |           | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                                       |              |                        |          | Programado           | Ejecutado |               |
| Preliminares                                          |              |                        |          |                      |           |               |
| Desmonte y Despalme (Ha)                              | 0.83         | 0.83                   | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |               |
| Subestructura                                         |              |                        |          |                      |           |               |
| Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.              | 26.00        | 11.00                  | 15.00    | 2.4                  | 2.00      |               |
| Pilas de cimentación (Armado). Pza.                   | 26.00        | 21.00                  | 5.00     | 1.6                  | 1.00      |               |
| Pilas de cimentación (Colado). Pza.                   | 26.00        | 10.00                  | 16.00    | 2.6                  | 1.00      |               |
| Columnas. Pza.                                        | 2.00         | 0.00                   | 2.00     | 0.3                  | 0.00      |               |
| Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.               | 4.00         | 0.00                   | 4.00     | 1.3                  | 0.00      |               |
| Superestructura                                       |              |                        |          |                      |           |               |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación) | 18.00        | 7.00                   | 11.00    | 0.8                  | 2.00      |               |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)     | 18.00        | 0.00                   | 18.00    | 0.00                 | 0.00      |               |
| Colado de diafragma y losa. M3                        | 197.1        | 0.00                   | 197.1    | 0.00                 | 0.00      |               |
| Carpeta asfáltica. M3.                                | 220          | 0.00                   | 220      | 0.00                 | 0.00      |               |
| Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.              | 43.8         | 0.00                   | 43.8     | 0.00                 | 0.00      |               |
| Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.     | 182          | 0.00                   | 182      | 0.00                 | 0.00      |               |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

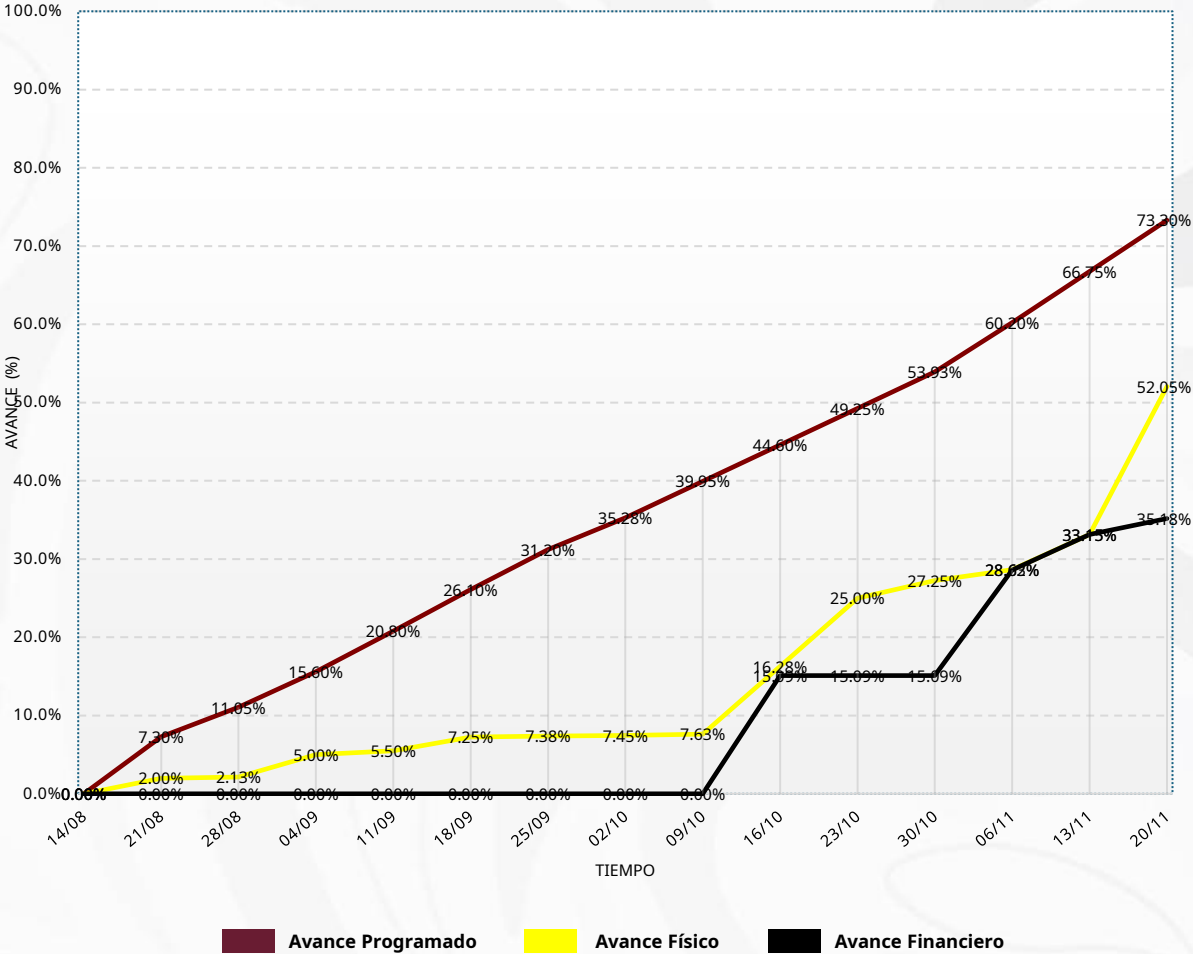

|                              | 07 de noviembre al 13 de noviembre | 14 de noviembre al 20 de noviembre |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 32                                 | 48                                 |
| Maquinaria                   | 7                                  | 11                                 |
