

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Comunicaciones


Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 21.45%
- Real: 36.00%
- Semanal: 1.13%
- Financiero: 30.59%

Avance 2025

- Programado: 76.0%
- Real: 100%
- Semanal: 0.4%
- Financiero: 86.1%

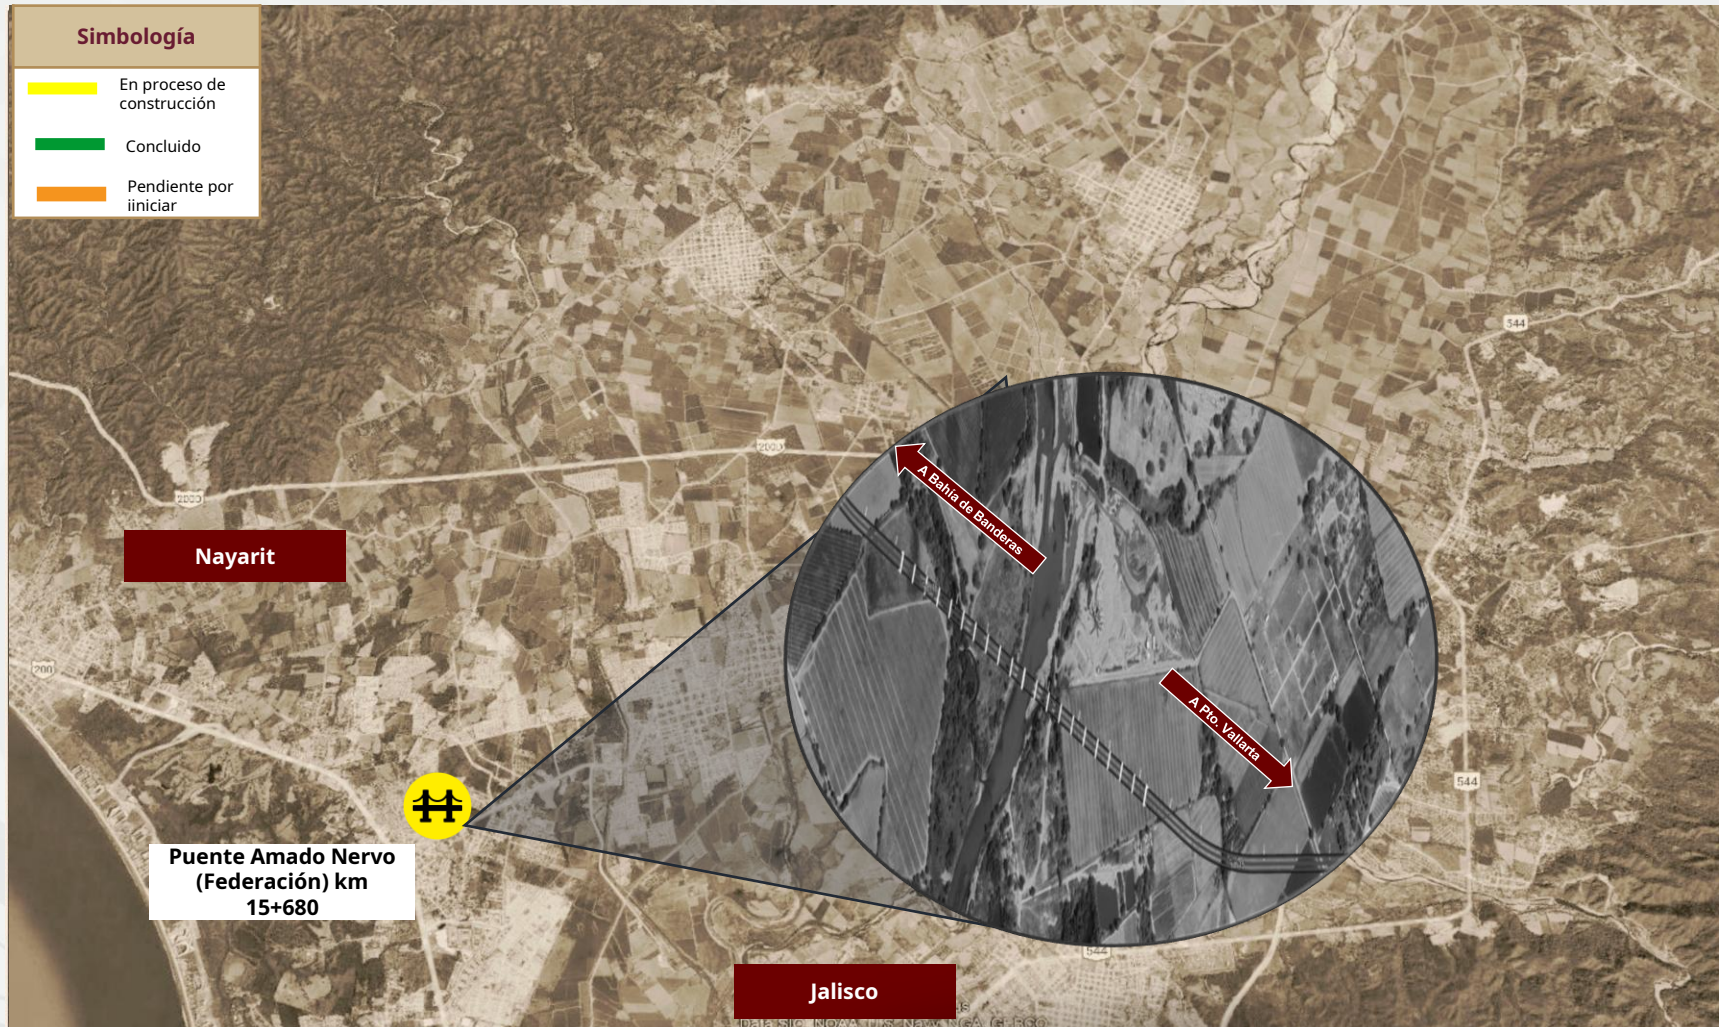

Inversión total 2025-2026: 900.0 mdp
Inversión 2025: 230.0 mdp | 0.6 km de Puente



Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Septiembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre



479,471 habitantes beneficiados



2,700 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 02 al 08/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,866.2	56.0%	6,175.8	6,175.80	177	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	47,250	29.3%	113,867.0	3,077.50	0	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Se tienen colados 125 pilotes
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	113	89.7%	13	1	0	Se tienen coladas 113 columnas
Cabezales	pza.	21	18	85.7%	3	0	1	Se tienen colados 15 cabezales de los apoyos 1, 2, 4 al 6 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	50	31.3%	110	4	7	Se tienen coladas 50 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	36	22.5%	124	8	1	Se tienen montados los claros 15-16, 16-17, 18-19 y 19-20, asimismo se encuentra en proceso el claro 14-15.
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2	43.8%	2.00	0	0	Se continúa el acomo de cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.3	65.0%	0.70	0.2	0.2	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

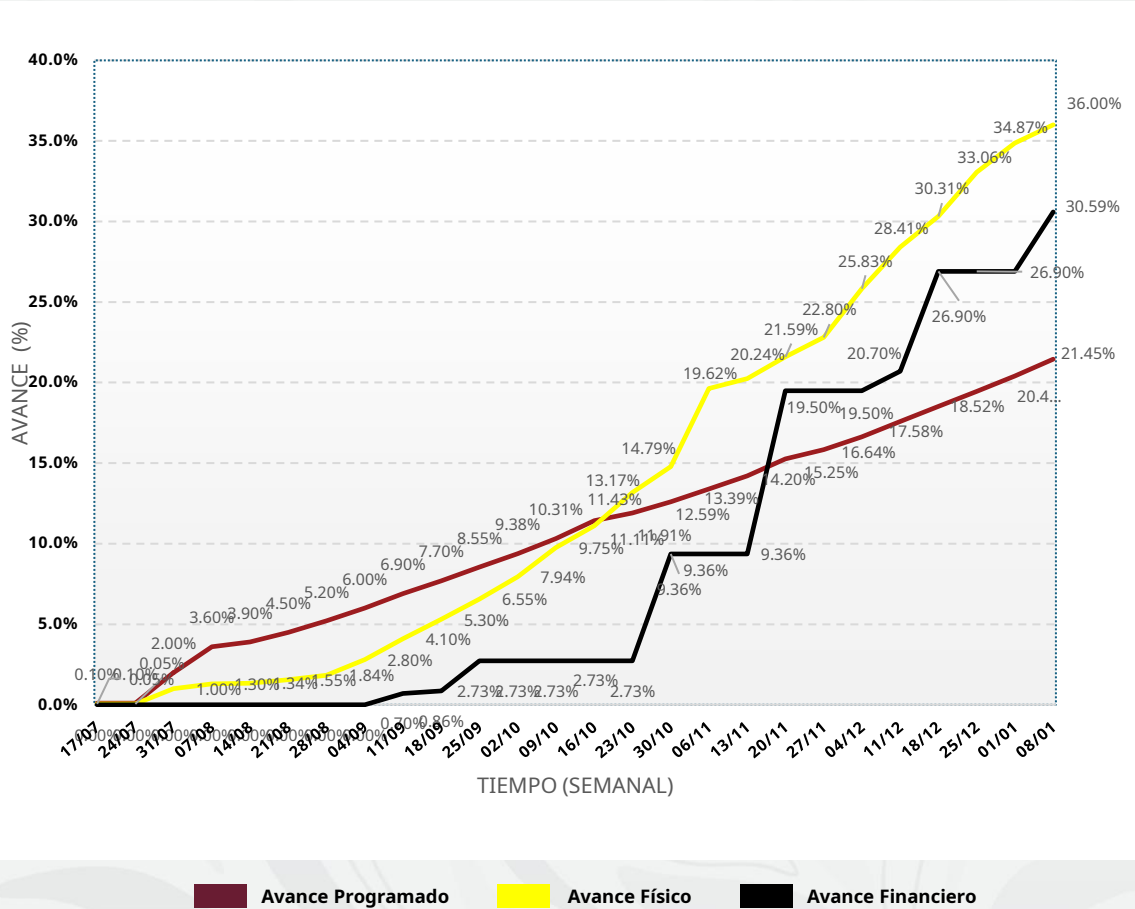

	26 de Diciembre al 01 de Enero	02 de Enero al 08 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	49	41
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
