

PSV Arco Norte

Colima

Avance global

- Programado: 37.43%
- Real: 55.86%
- Semanal: 01.1%
- Financiero: 34.11%

Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 100.00%*
- Financiero: 70.0%**

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.
** Se autorizaron recursos adicionales

 **Inversión total 2025-2026:** 436.0 mdp
Inversión 2025: 185.0 mdp

 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))


 **Inicio:** 10 de junio de 2025
Término: abril 2026
Término meta 2025: diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V
	• Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

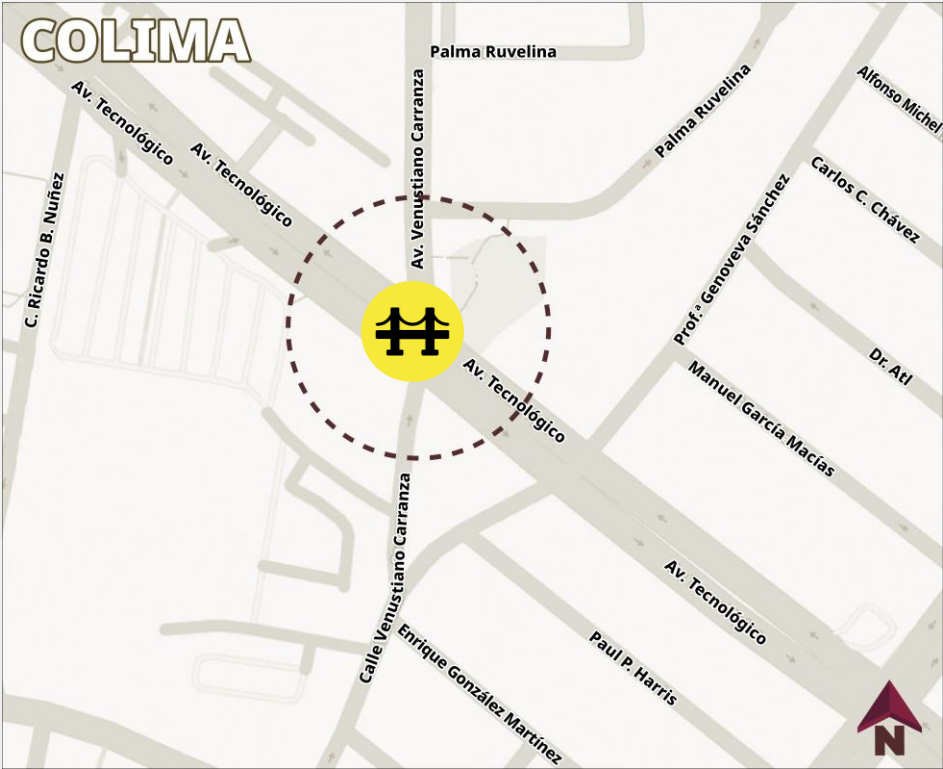


PSV Libramiento Arco Norte

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/26 al 08/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	4.13	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	1.25	0.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	2.63	0.00	Trabajos concluidos
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	1.38	0.00	Trabajos concluidos

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

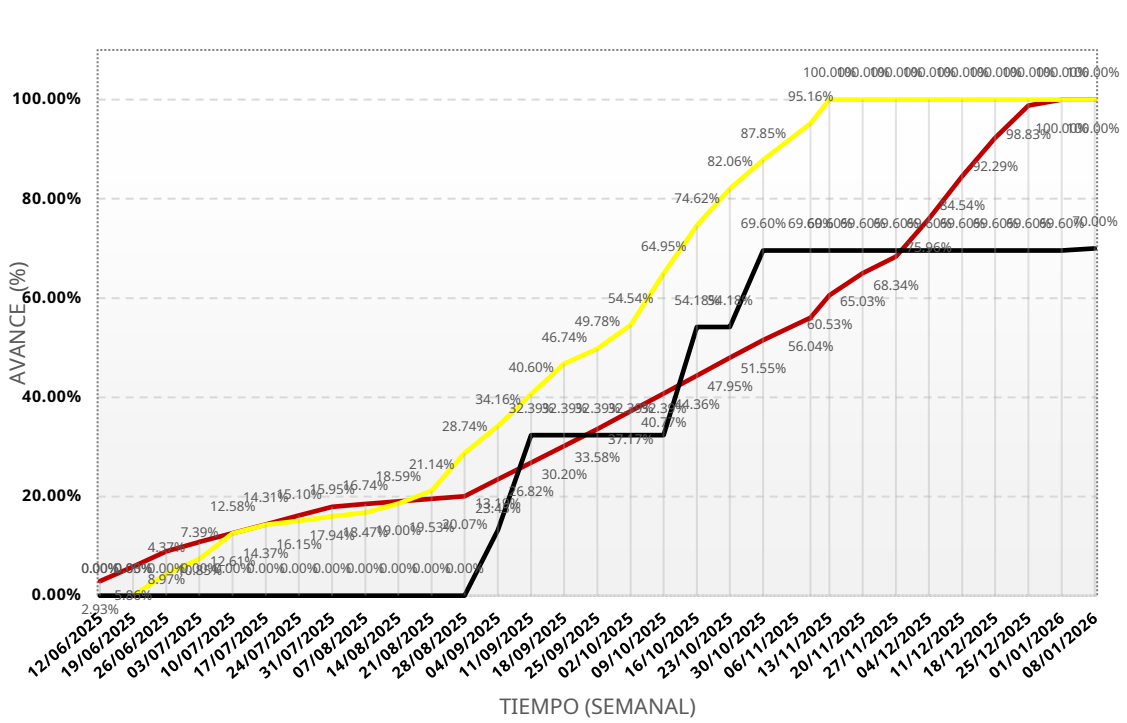

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	26 de diciembre al 01 de enero	02 de enero al 08 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
