

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 50.04%
- Real: 58.55%
- Semanal: 1.03%
- Financiero: 37.77%

Avance 2025

- Meta 2025: CONCLUIDA


Avance 2026

- Programado: 6.46%
- Real: 7.56%
- Semanal: 7.56%
- Financiero: 0.0%

-  **Inversión total 2025-2026:** 630.0 mdp
 - Inversión 2025:** 227.4 mdp
 - Inversión 2026:** 402.6 mdp
-  **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
 - Meta 2026:** 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
-  **Inicio:** 03-Julio de 2025
 - Término:** abril de 2026
 - Término meta 2025:** Diciembre
 - Término meta 2026:** Abril


-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **1,431** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V

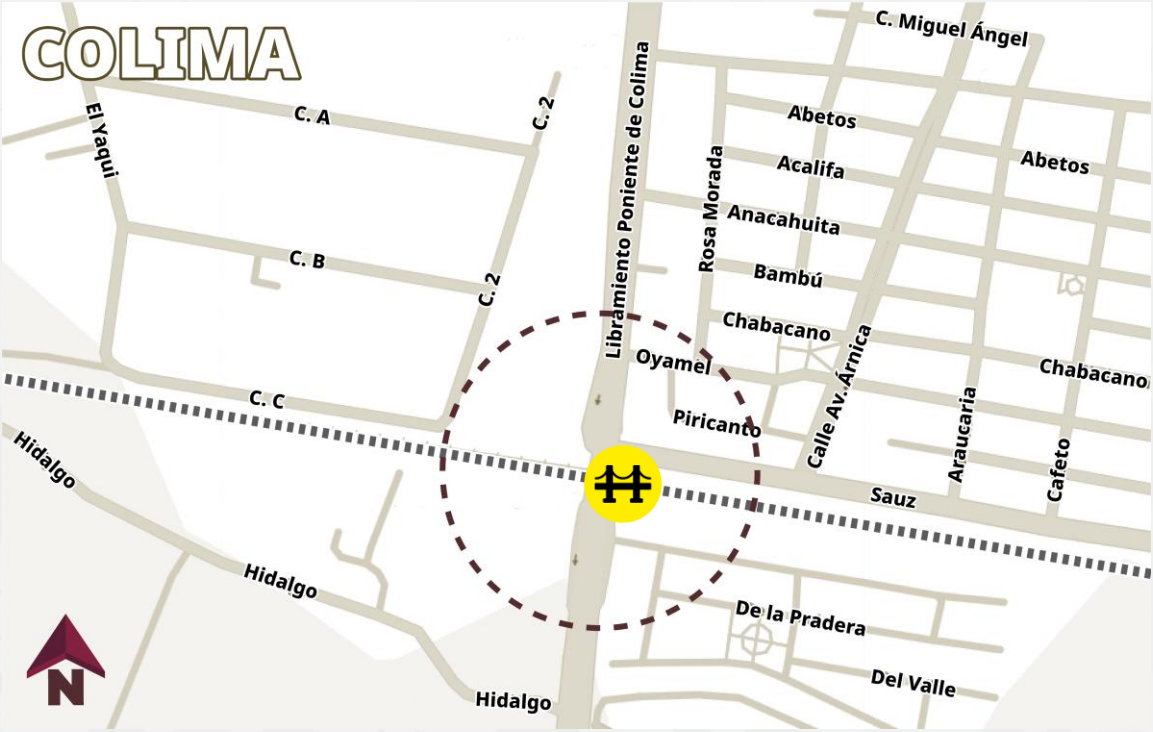

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/2026 al 08/01/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.0	129.63	124.37	2.24	0.52	
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 322.01	155.54	6.49	0.00	
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	219.44	3.56	6.88	0.00	
Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3)	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	
SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL						
Pilas (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Cabezales (pza)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Accesos (m3)	210.02	12.45	197.57	7.32	0.00	
Superestructura puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.04	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	962.25	32.31	70.70	0.00	
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	737.76	52.66	38.82	0.00	
Accesos al PSF (m)	896.00	315.11	580.89	12.77	29.90	

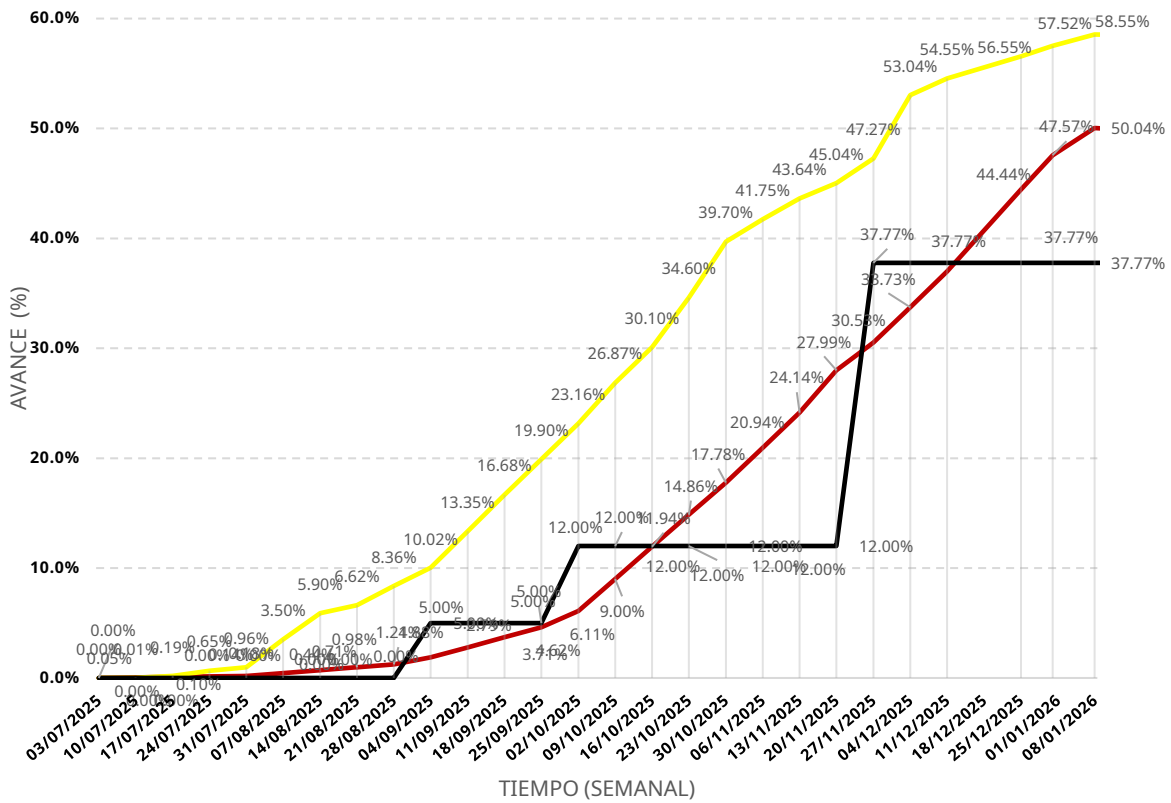

	26 de diciembre al 01 de enero	02 al 08 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	176	176
Maquinaria	60	60
Fuerza de trabajo	11	11
