

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado:25.66 %
• Real: 72.87%


• Semanal: 1.28 %
• Financiero: 24.0 %

Avance 2025

• Programado: 100.0 %
• Real: 100.0 %

• Semanal: 1.54 %
• Financiero: 100.0%

- **Inversión total 2025-2026:** 115.6 mdp
Inversión 2025: 42.6 mdp
- **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente
- **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025
- **4,053** habitantes beneficiados
- **330** empleos generados
- **15 min** ahorro en tiempo

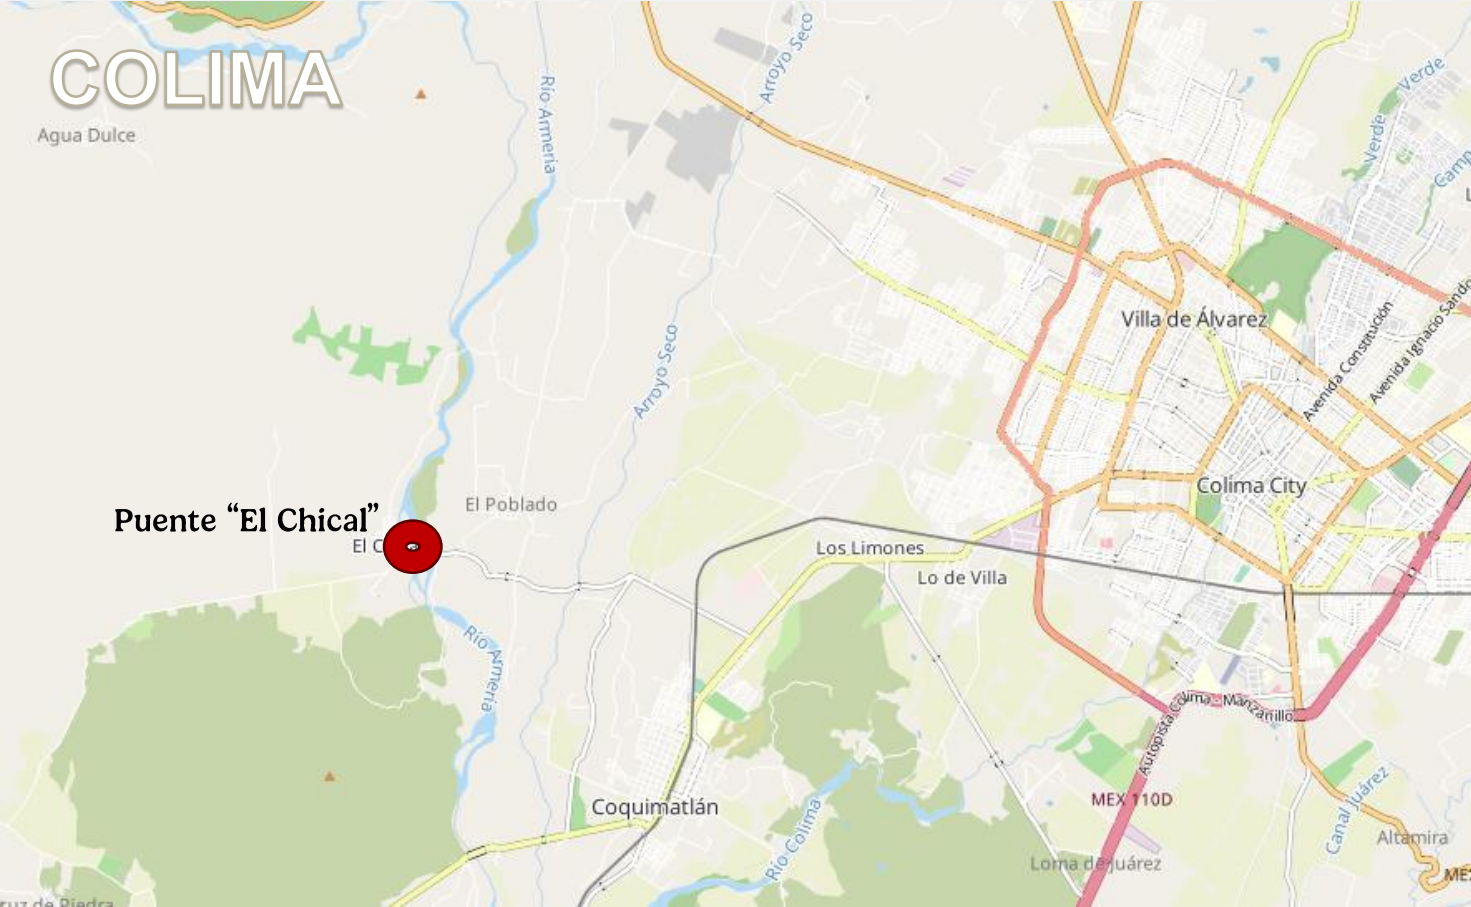


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLAOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/26 al 08/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	40.0	5.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	35.0	10.0	5.0	5.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	216.0	432.0	72.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

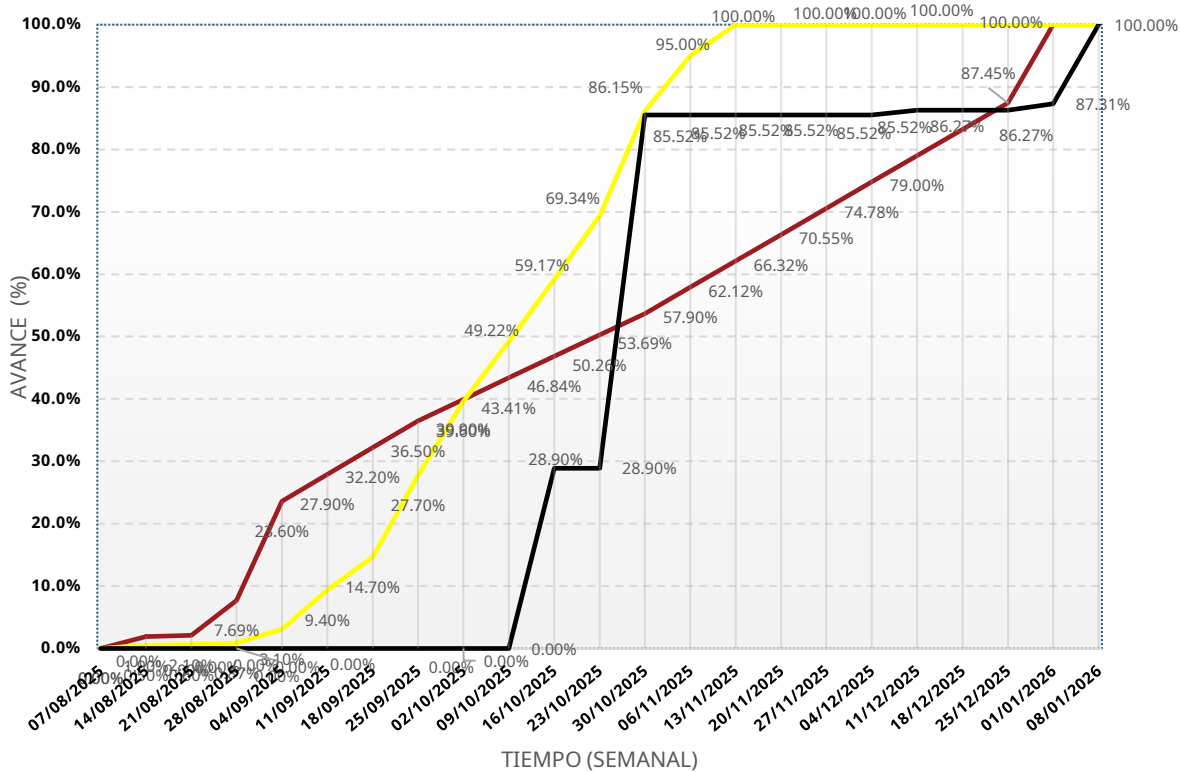

	26 de Diciembre al 01 de Enero	02 de Enero al 01 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	15	31
Maquinaria	5	5
Frentes de trabajo	5	5
