




Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 66.06%
- Real: 88.11%
- Semanal: 1.97%
- Financiero: 78.6%

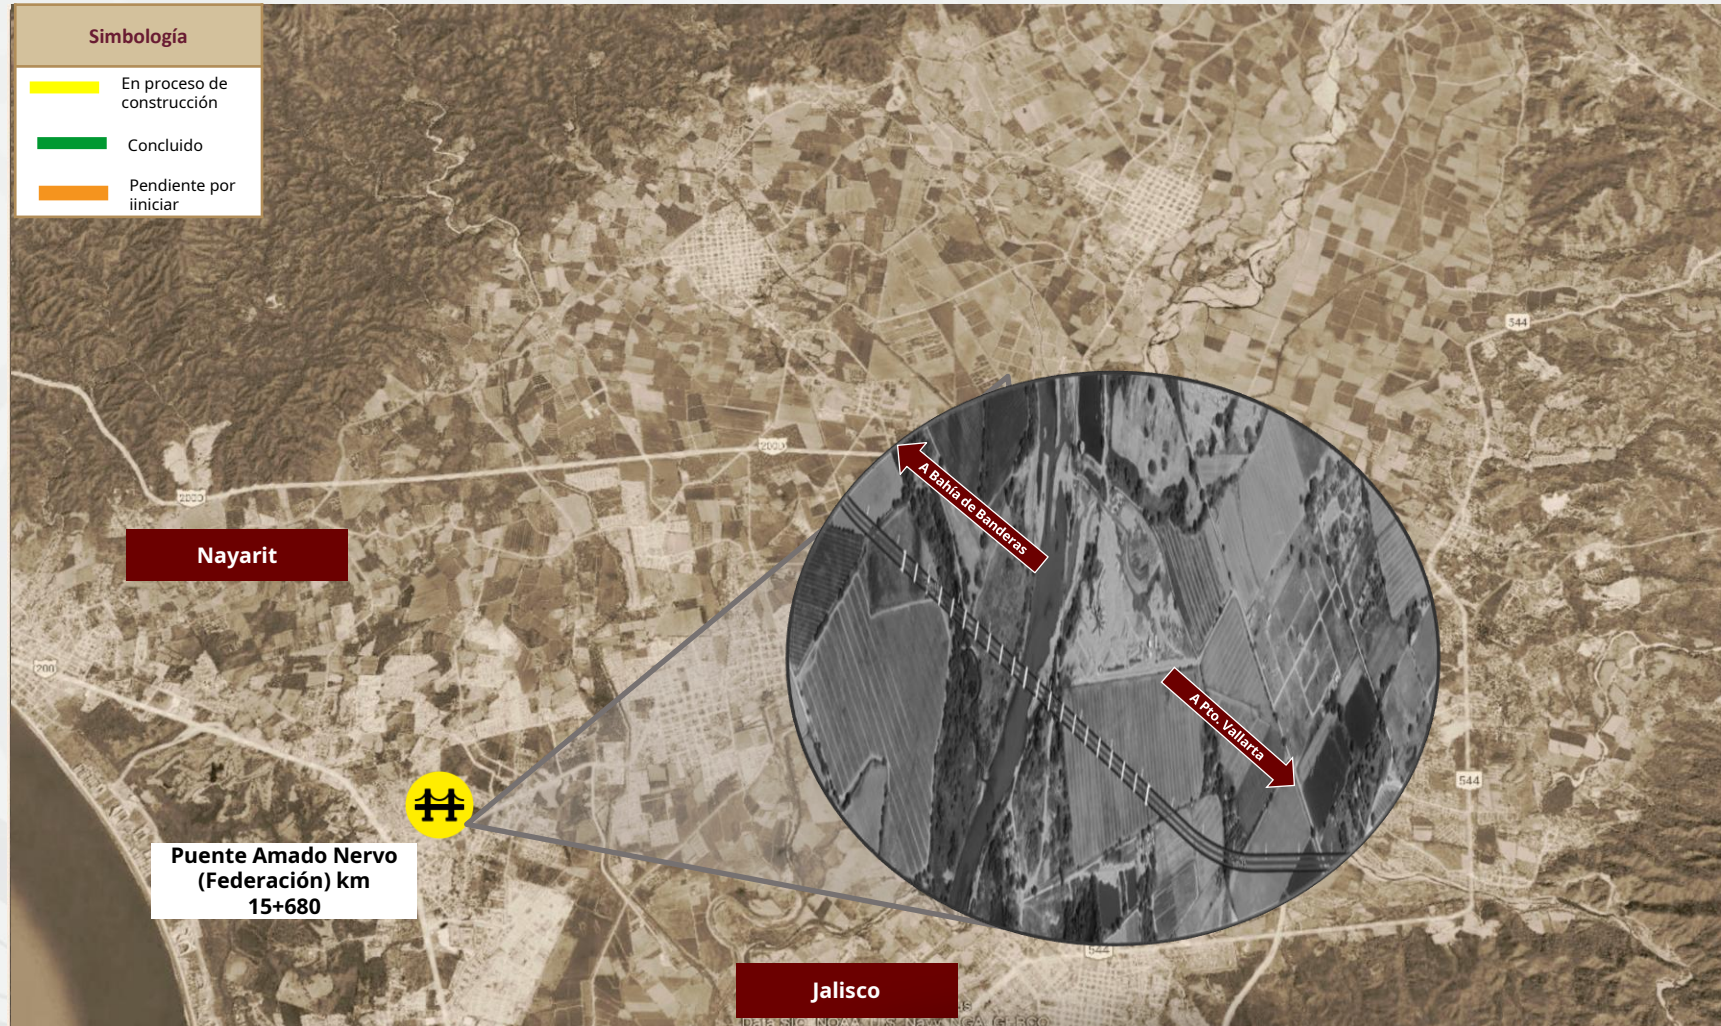

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Inversión total 2025-2026: 718 mdp
Meta total: 1 Puente | 2.0 km



Inversión 2025: 198.9 mdp
Meta 2025: 0.7 km de Puente
Inversión 2026: 519.1 mdp
Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: 15 agosto de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Construcción de un puente de 2.02 km de longitud para alojar 6 carriles de circulación.


Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

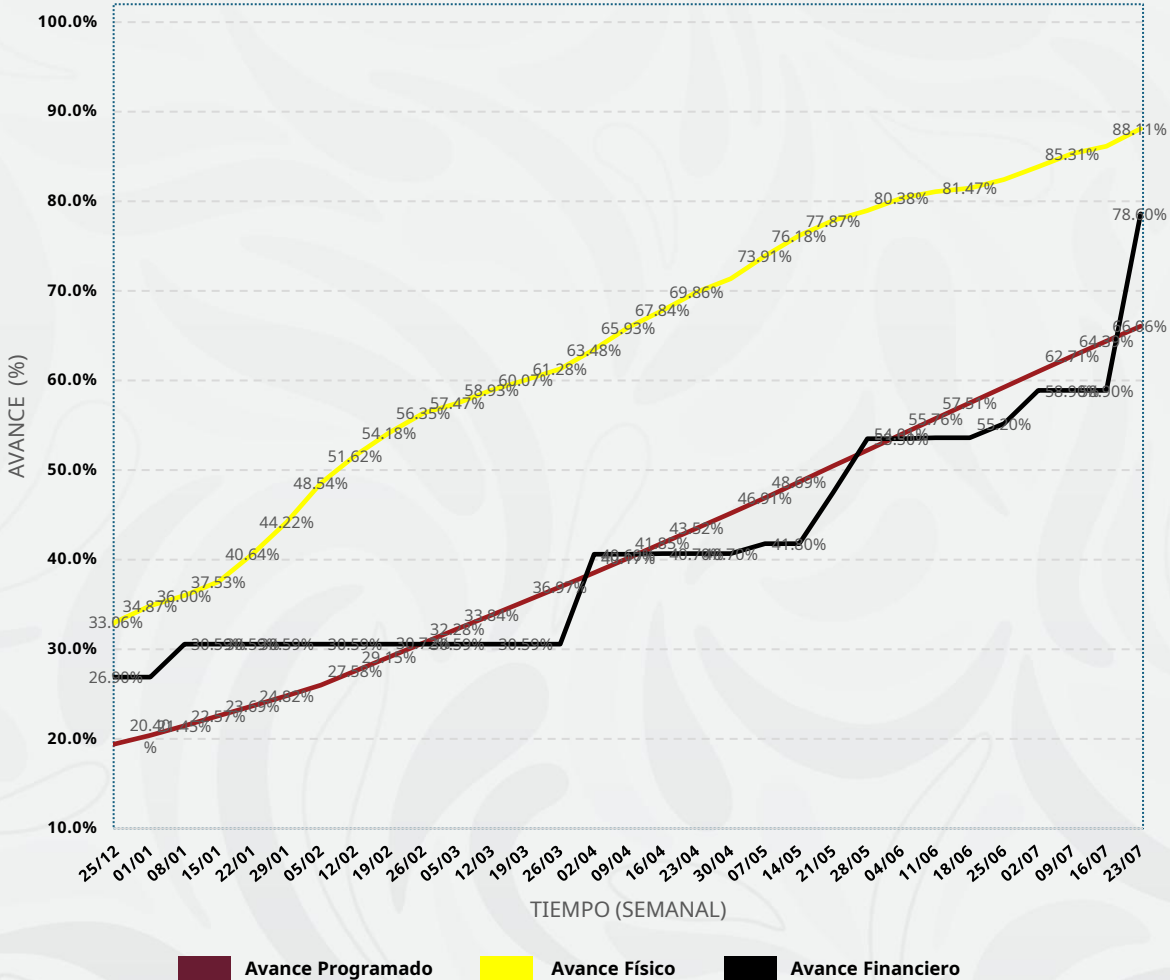

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 17 al 23/07/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	2.0	2.00	100.0%	0.00	-	0	Concluidos
Despalme	m3	13,099.0	13,099.0	100.0%	0.0	-	0	Concluidos
Cortes	m3	10,823.0	4,514.0	41.7%	6,309.0	6,309.00	0	En proceso
Terraplenes	m3	143,768.0	143,768.0	100.0%	0.0	-	1,401	Concluidos
Base Estabilizada	m3	6,192.0	4,127.3	66.7%	2,064.7	309.60	1,820	Sin actividades
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,734.0	4,177	42.9%	5,557.2	486.70	1,172	Sin actividades
Losas de Acceso	m3	81.3	81.3	100.0%	0.0	-	0	Concluidos
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	-	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	-	0	Concluidos
Cabezales	pza.	21	21	100.0%	0	-	0	Concluidos
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	160	100.0%	0	-	0	Concluidos
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	160	100.0%	0	-	0	Concluidos
Losas y Diafragmas	m3	4,388.0	4,350.5	99.1%	37.50	274.3	0	Se tienen coladas 7 losas y 29 líneas de disfragmas
Parapeto	m	1,597.0	238.4	14.9%	1,358.60	398.5	83	Sin actividades
Guarnición	m	1,591.0	1,221.6	76.8%	369.40	0	274	En proceso
Obras de Drenaje	pza.	4.0	2.7	67.5%	1.30	1.3	0	En proceso
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.0	2.0	100.0%	0.00	-	0	Concluidos
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.0	0.3	30.0%	0.70	0	0	En proceso
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.0	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.0	0.5	50.0%	0.50	0	0	En proceso

	10 de Julio al 16 de Julio	17 de Julio al 23 de Julio
Fuerza de Trabajo (personas)	68	71
Maquinaria	27	27
Frentes de trabajo	6	6
