

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Inversión total: 484 MDP



Meta total: 1.92 km longitud total.
• 0.77 km puente



Inicio: 27 Abril de 2026
Término: 03 de noviembre 2026



Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados
2,890 empleos generados



5 minutos ahorro en tiempo



Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales.

Tramo

Empresas


- **Contratista:** Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .

Construcción distribuidor vial Kukulcán.

Avance físico

- Programado: 62.17%
- Semanal: 2.67%
- Real: 33.32%
- Financiero: 0.00%

- Desviación: 28.85% no imputable a la contratista debido a interferencias con obras inducidas y modificaciones de proyecto ejecutivo.

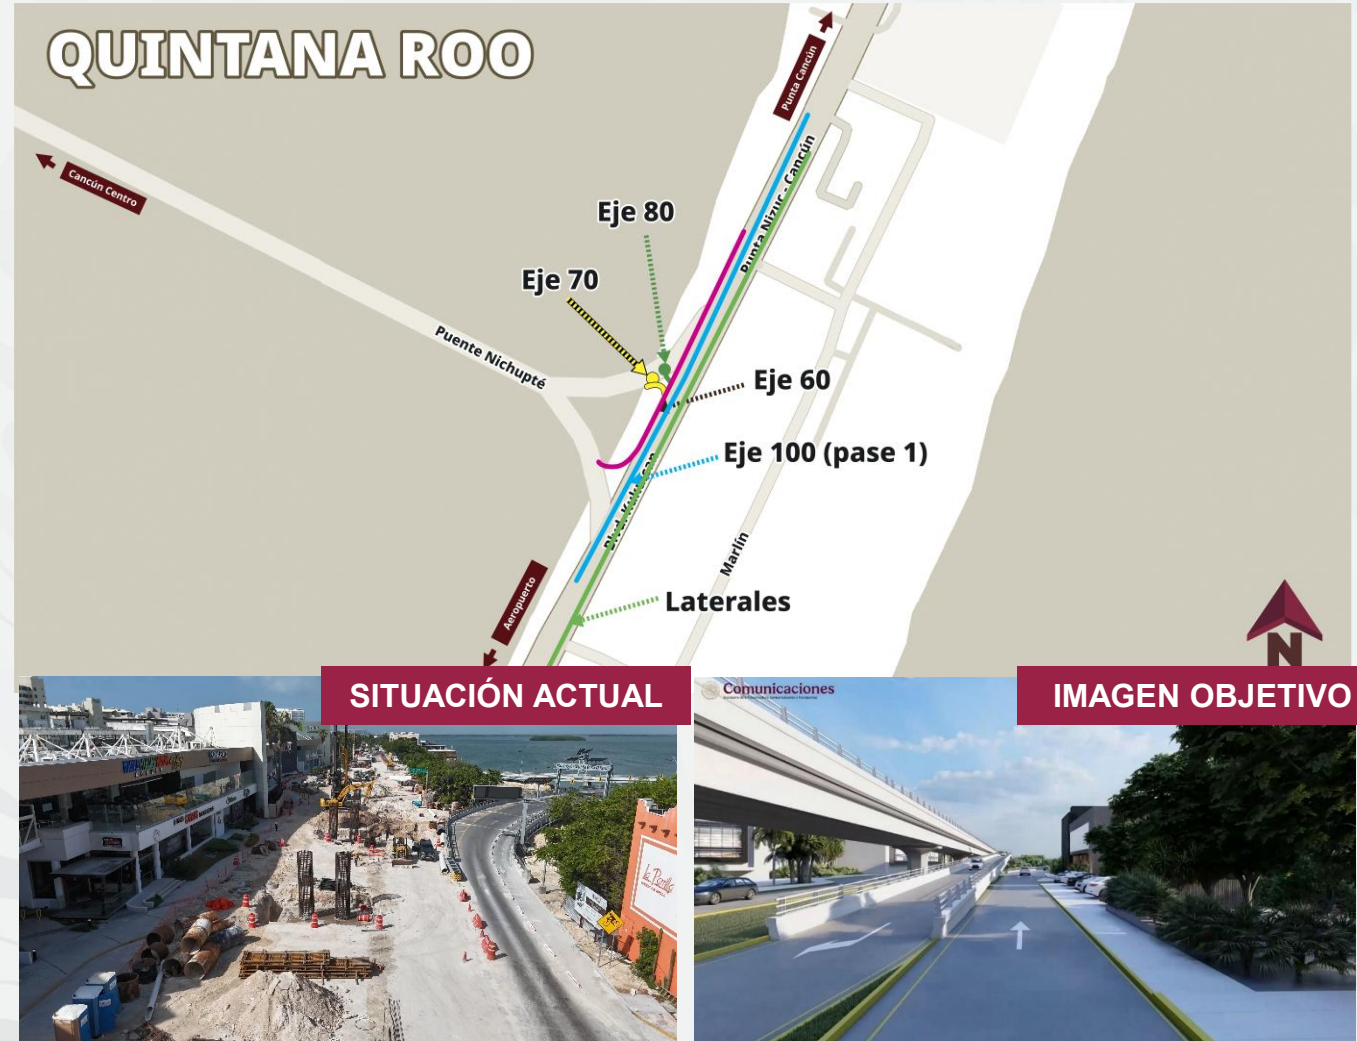


Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 17 al 23 de julio de 2026
Pilas de cimentación (pza)	103	92	89%	11	6
Zapatas (pza)	18	4.75	26%	13.25	1.75
Columnas (pza)	30	0.75	3%	29.25	0.25
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

•Nota: se tienen 274.3 mdp (C/IVA) de obra ejecutada no pagada por trámites ante FONADIN

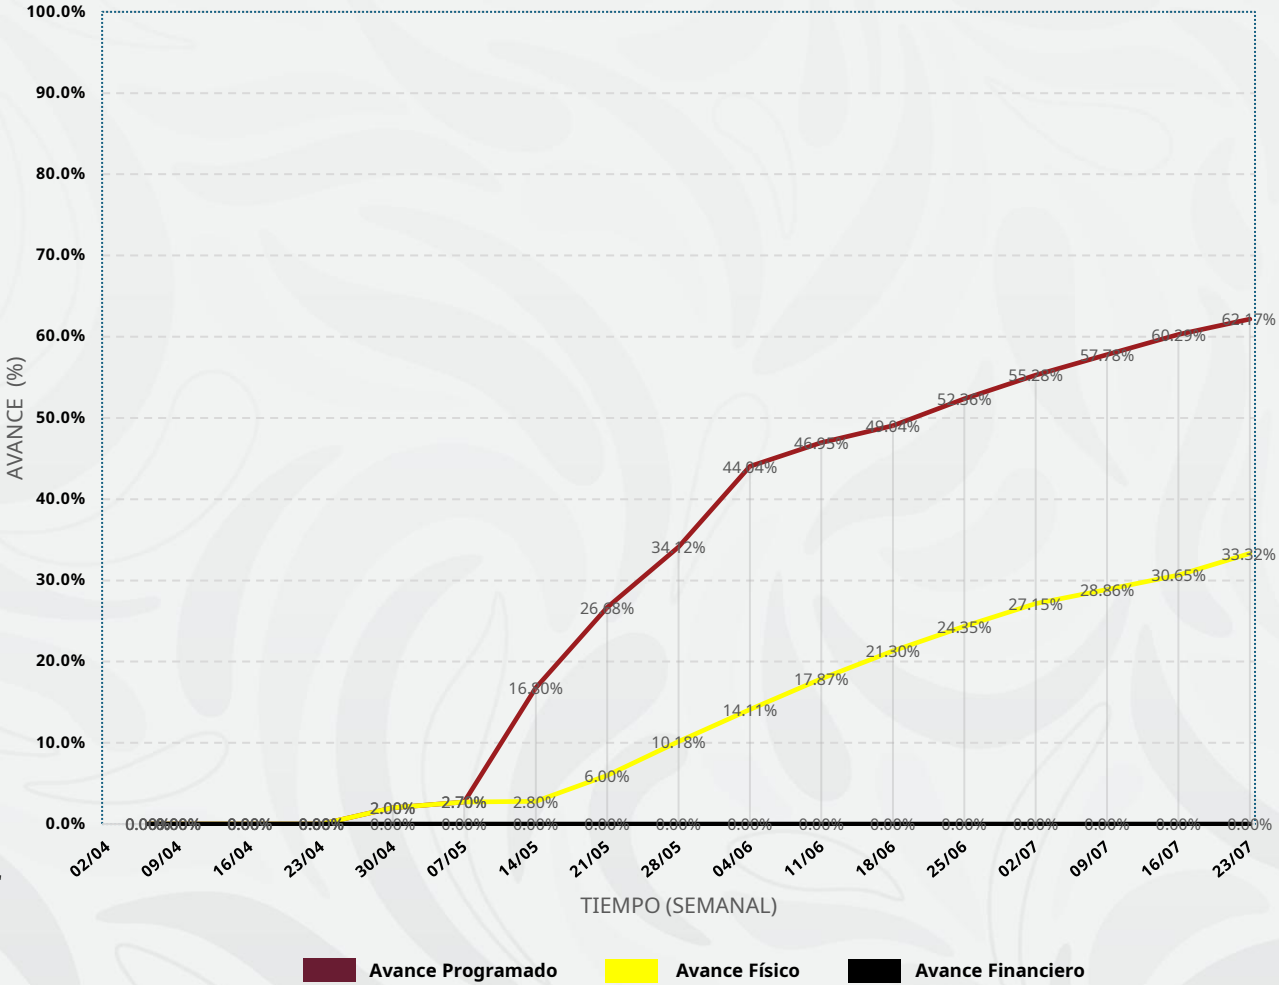

	10 al 16 de julio 2026	17 al 23 de julio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	99	90
Maquinaria	33	34
Frentes de trabajo	6	6
