

# Distribuidor Vial Santa Ana

## Tlaxcala

### Avance global

- Programado: 64.79%
- Real: 70.10%
- Semanal: 4.20%
- Financiero: 70.00%

 **Inversión total 2025-2026:** 701 mdp  
**Meta total:** 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 **Inversión 2025:** 140 mdp  
**Meta 2025:** 38% de 1 Distribuidor Vial  
**Inversión 2026:** 561 mdp  
**Meta 2026:** 62% de 1 Distribuidor Vial

 **Inicio:** 16 de julio de 2025  
**Término meta 2025:** Diciembre 2025  
**Término meta total:** 31 de Agosto de 2026


 **73,215** habitantes beneficiados

 **2,220** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

**Beneficios** Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

| Tramo                        | Empresas                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM 29+980 AL<br>KM 30+183.58 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,</li><li>• Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</li></ul> |

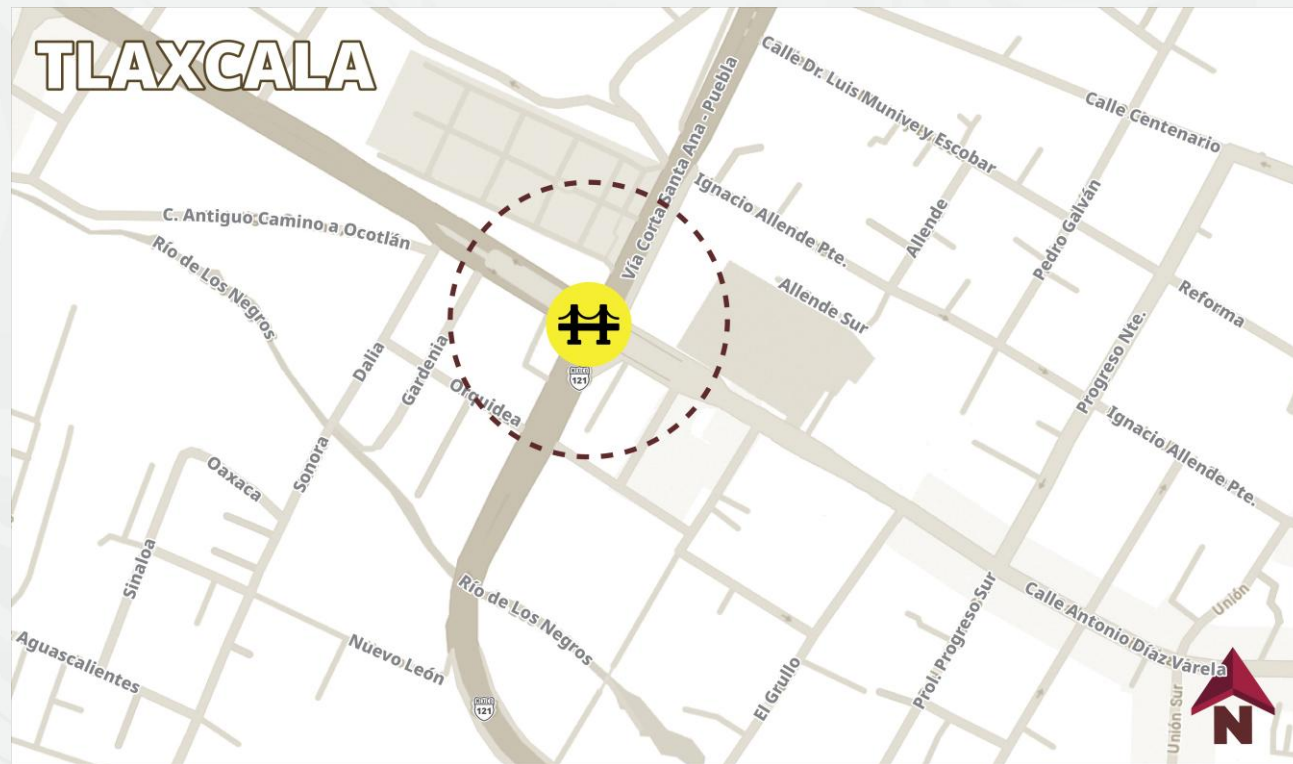

Situación actual




Proyecto

# Distribuidor Vial Santa Ana

## Tlaxcala

| Elemento          | Meta                | Ejecutado Acumulable       | Faltante                      | 17 al 23-06-26 |           | Observaciones                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |                            |                               | Programado     | Ejecutado |                                                                                                                                                    |
| Distribuidor Vial | 1 Distribuidor Vial | 70.10% 1 Distribuidor Vial | 29.90% de 1 Distribuidor Vial | 1.84%          | 4.20%     | Se trabaja en: diafragmas, losas, drenaje pluvial, ampliación del puente de los negros, fabricación de trabes y muros mecánicamente estabilizados. |

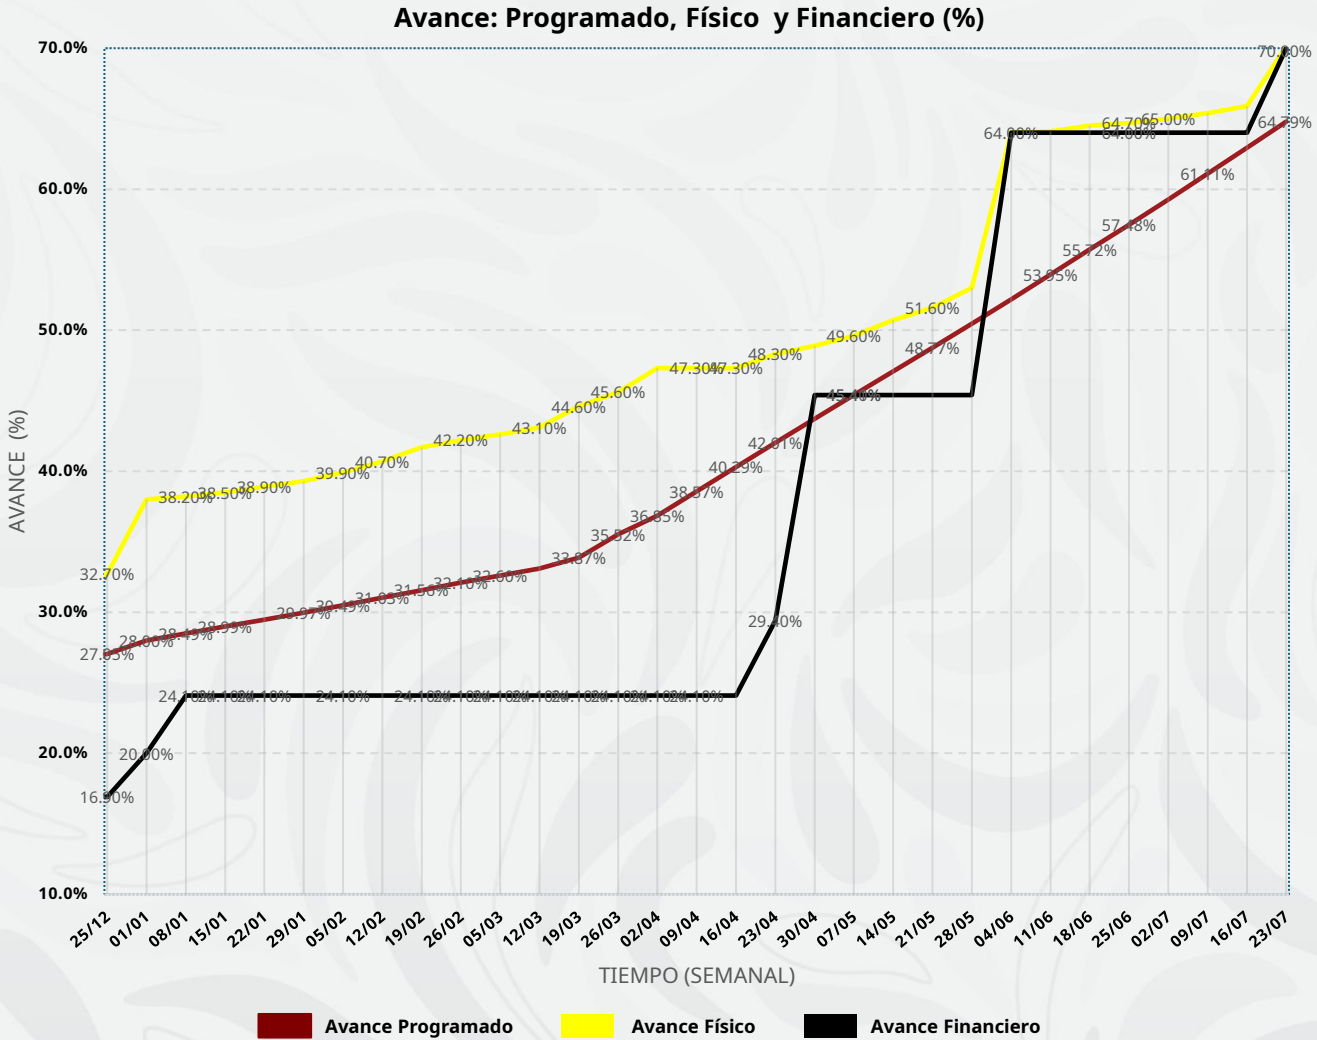

|                              | 10 al 16 de julio | 17 al 23 de julio |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 139               | 131               |
| Maquinaria                   | 17                | 20                |
| Frente de trabajo            | 10                | 10                |
