


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 74.76%
- Real: 81.73%
- Semanal: 0.8%
- Financiero: 86.0%

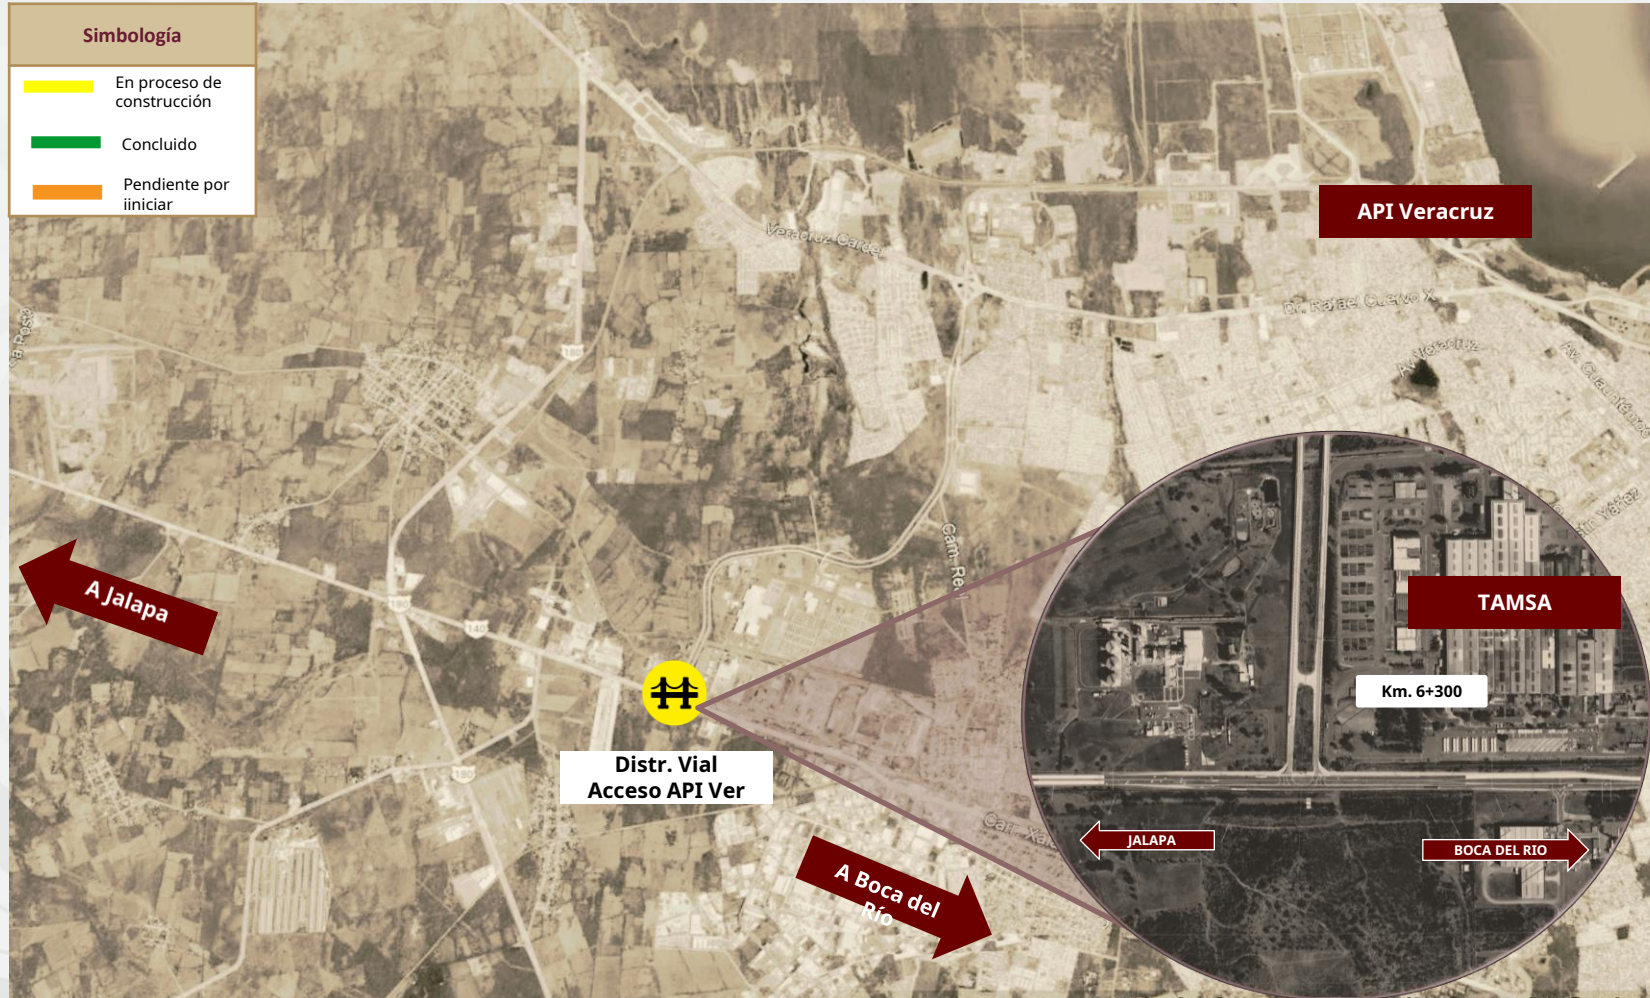

Inversión total: 866 mdp
Meta total 2025-2026: 1.97 km
De acuerdo al cierre de la SHCP 2026

Meta 2025: 0.69 km de PSV

Meta 2026: 1.28 km de PSV
Costo Paramétrico: 0.4 mdp/ml

Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: 15 agosto de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

780,441 habitantes beneficiados

2,598 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas


- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

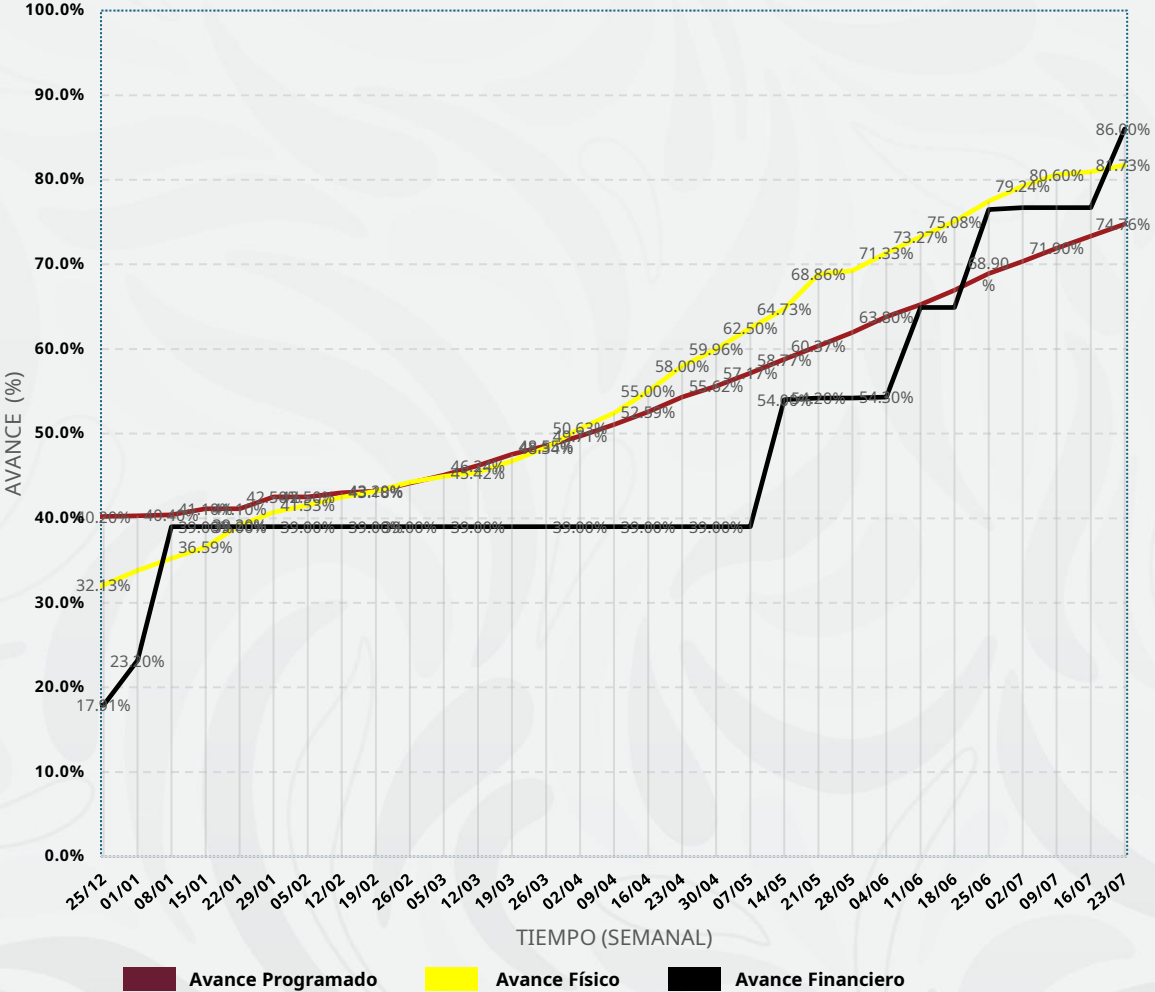

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 17 al 23/07/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
Muro Mecánicamente Relleno	m³	19,295.00	19,250.0	99.8%	45.0	45.00	0.0	Reprogramación
Muro Mecánicamente Escamas	m³	2,456.7	2,456.7	100.0%	-	-	0.0	Concluido
Subrasante	m³	2,706.00	2,244.0	82.9%	462.0	462.00	120.0	Reprogramación
Base Hidraulica	m³	3,267.00	2,462.0	75.4%	805.0	805.00	194.0	Reprogramación
Base asfáltica	m³	1,039.00	0.0	0.0%	1,039.0	1,039.00	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	871.00	0.0	0.0%	871.0	871.00	0.0	Reprogramación
Dala Cerramiento	m³	726.80	655.0	90.1%	71.8	71.80	225.0	Reprogramación
Defensa Metalica	m³	726.80	520.0	71.5%	206.8	206.80	180.0	Reprogramación
Barrera Central (Transporte)	pza.	850	444	52.2%	-	-	324.0	Reprogramación

	09 de Junio al 16 de Julio	17 de Junio al 23 de Julio
Fuerza de Trabajo (personas)	95	97
Maquinaria	24	24
Frentes de trabajo	5	5
