



Puente "Las Tunas"

Colima

Avance global

- Programado: 68.03%
- Real: 69.80%
- Semanal: 3.90%
- Financiero: 31.33%



Inversión total: 102.0 MDP



Meta total: 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)



Inicio: 25 de febrero de 2026
Término: 31 de agosto de 2026



157,048 habitantes beneficiados




235 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

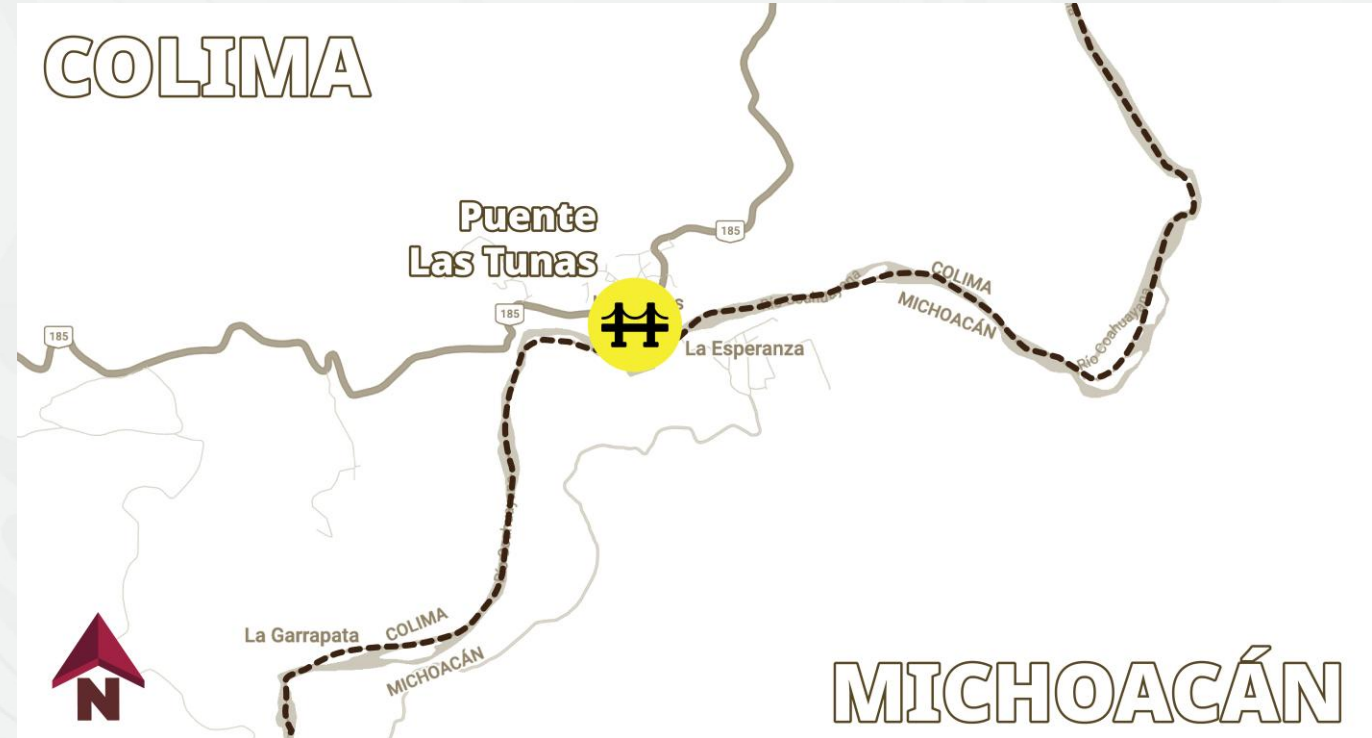

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES VITED35 A.A DE C.V.

Puente “Las Tunas”

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	17/07/26 al 23/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.00	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Columnas (Pza)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	
Fabricación de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	Trabajos Concluidos
Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	25.00	0.00	4.00	0.00	Trabajos Concluidos
Prelosas (pza)	600.0	450.00	150.00	31.00	160.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	209.03	167.78	87.92	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	12.46	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	24.96	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	6.46	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

