

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 100%
- Real: 99.9%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 94.8%

Inversión total 2025-2026: 433.5 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total

Inversión 2025: 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 208.6 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km

Inicio: 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

862,037 Habitantes beneficiados

1,300 empleos generados

20 min ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas


- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

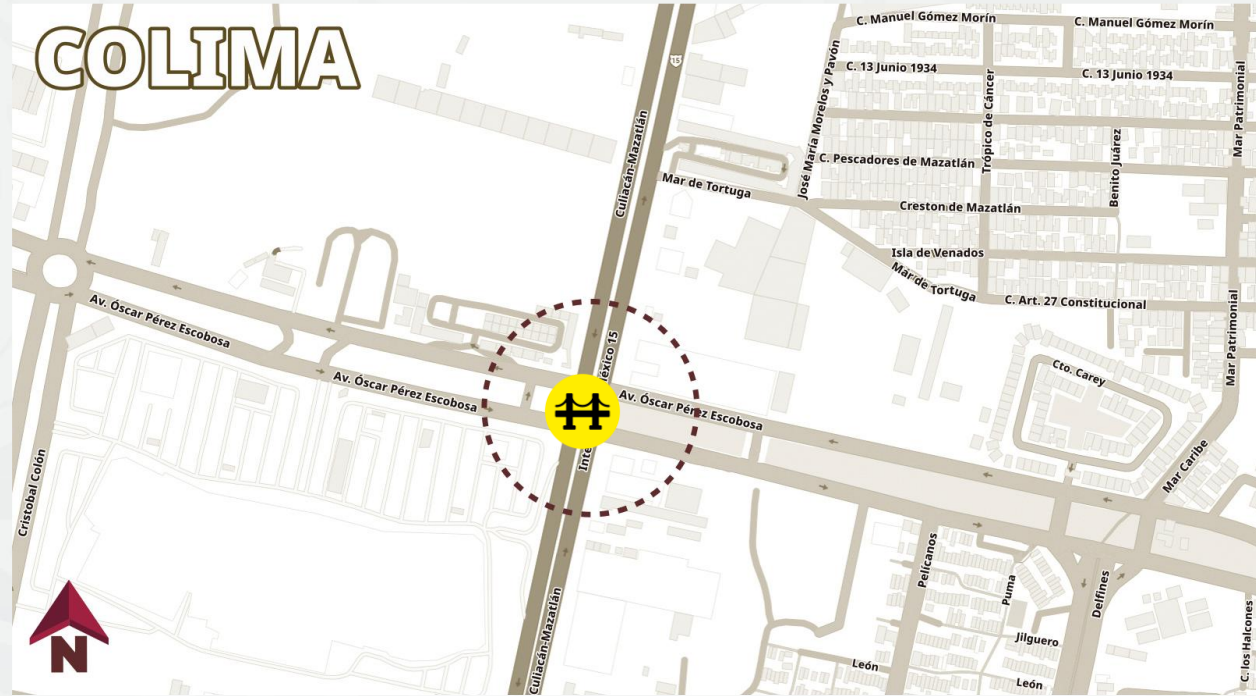

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

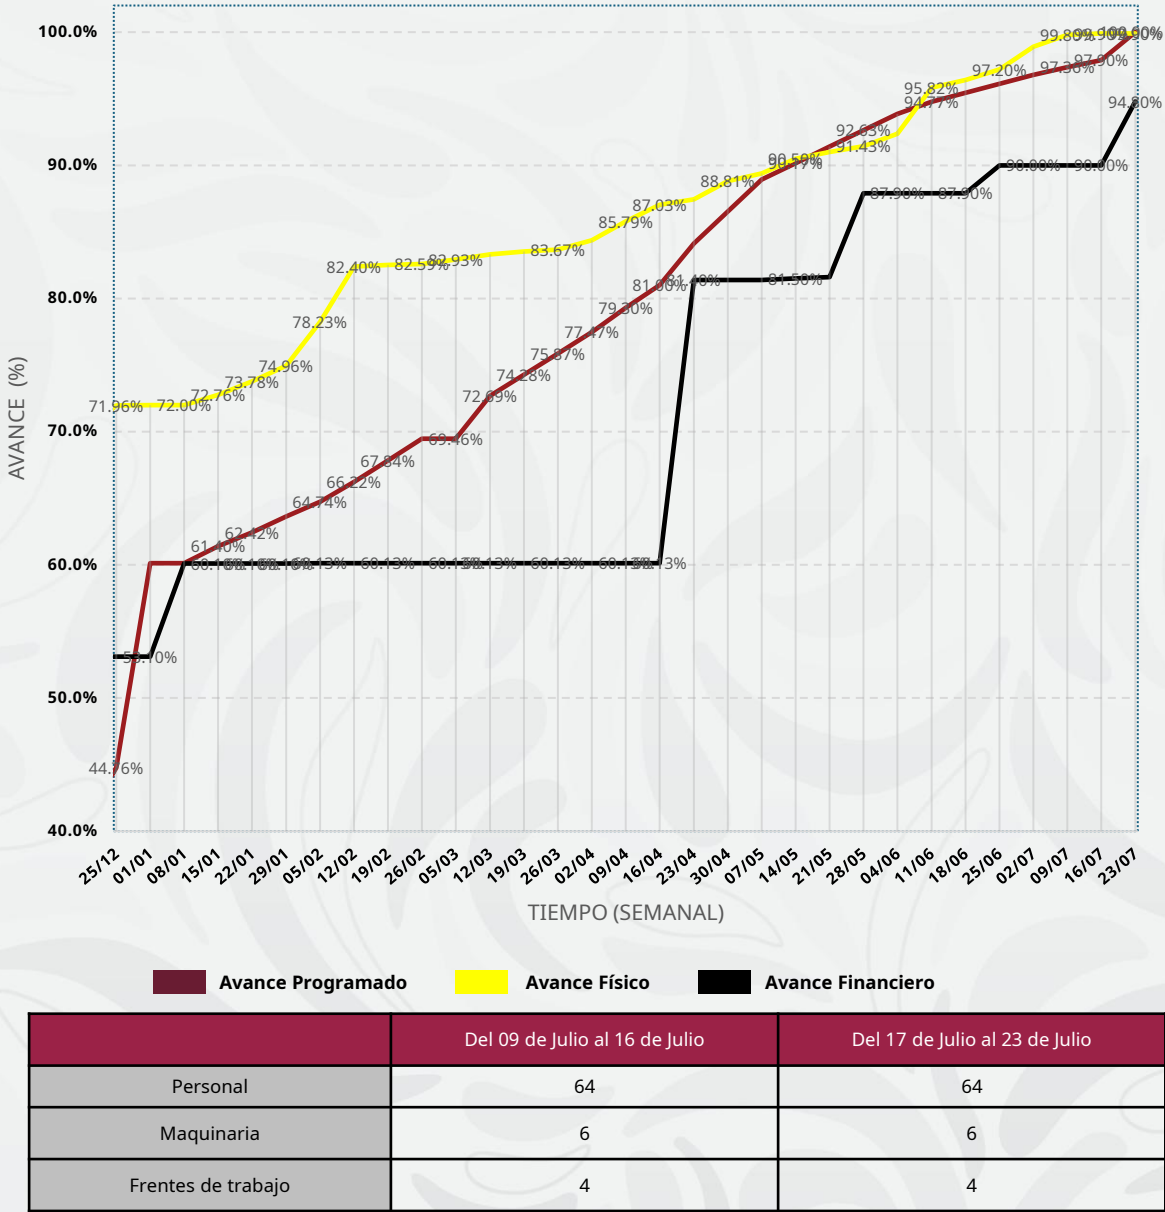

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 17/07/26 al 23/07/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	2.0	100.0%	0.0	0	0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	2.00	100.0%	0.0	1.5	0.5	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,465.0	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Relleno	m3	1,358.00	1,358.0	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	1,239.0	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Coladera de piso y banqueta	pza	37.00	37	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	3,329.8	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Relleno	m3	3,206.11	3,206.1	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	773.3	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	1,041.5	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Relleno	m3	975.80	975.8	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	1,030.1	100.0%	0.00	-	0.0	Concluido
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	5,032.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Base Hidráulica	m3	2,835.00	2,835.0	100.0%	0	-	0.0	Concluido
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	12,357.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Base Asfáltica	m3	1,862.0	1,862.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	863.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Fresado de superficie	m2	18,623.0	18,623.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Banqueta	m2	10,526.0	10,526.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
Relleno	m3	2,052.0	2,052.0	100.0%	0.0	-	0.0	Concluido
