

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 10.71%
- Real: 9.13%
- Semanal: 0.41%
- Financiero: 6.77%

Avance 2025

- Programado: 66.94%
- Real: 57.06%
- Semanal: 2.56%
- Financiero: 50.67%

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 267 mdp | (16% de 2 puentes)

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

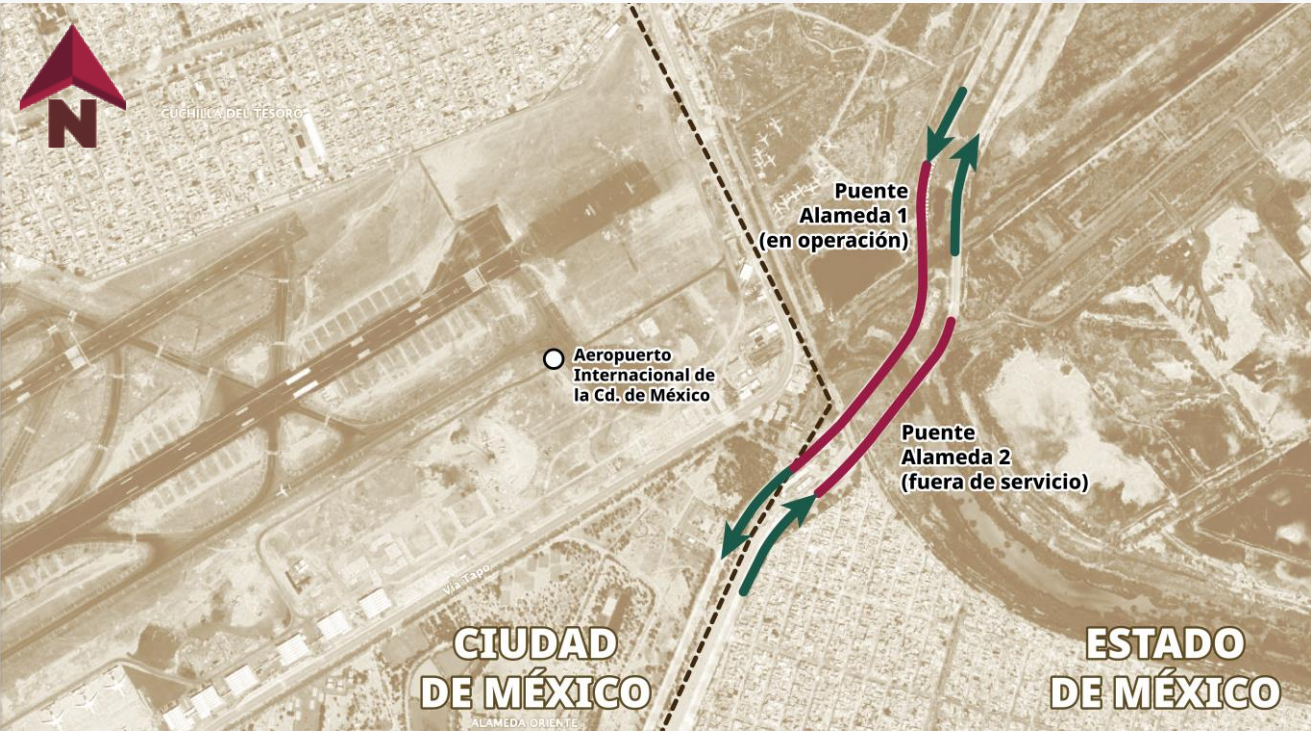

Nivel de Servicio en estudio



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado		07/nov/25 al 13/nov/25	
			Acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	M	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	175.77	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	9,076.71	49,038.45	2,181.67	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	11,813.99	30,801.04	1,782.13	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto armado (Puente 2)	2,292	Pzs	570	1,722	106.7	88
Hincado de pilotes de 40 cm x 40 cm de perforación (Puente 2)	2,292	Pzs	324	1,968	109.84	82
Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.10	0	0
Construcción de Zapatas (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3.00	0	0
Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.10	0	0
Construcción de Cajones (Puente 2)	8.00	Pzs	0	8.00	0	0
Construcción de Columnas (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11.00	0	0
Construcción de Cabezales (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11.00	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44.00	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44.00	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3.00	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3.00	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puente 2)	10.00	Claros	0	10.00	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)	960.00	m	0	960.00	0	0
Construcción de Accesos (Puente 2)	1.00	Accesos	0	1.00	0	0
Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)	1.00	Línea	0	1.00	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)	1.00	Lote	0	1.00	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 1)	5,222.6	m3	707.9	4,514.7	0	197.47
Excavación en caminos de servicio (Puente 1)	64,026.84	m3	2,403.8	61,623.04	0	1,177.18
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)	46,949.97	m3	2,850.69	44,099.28	0	1,157.61

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

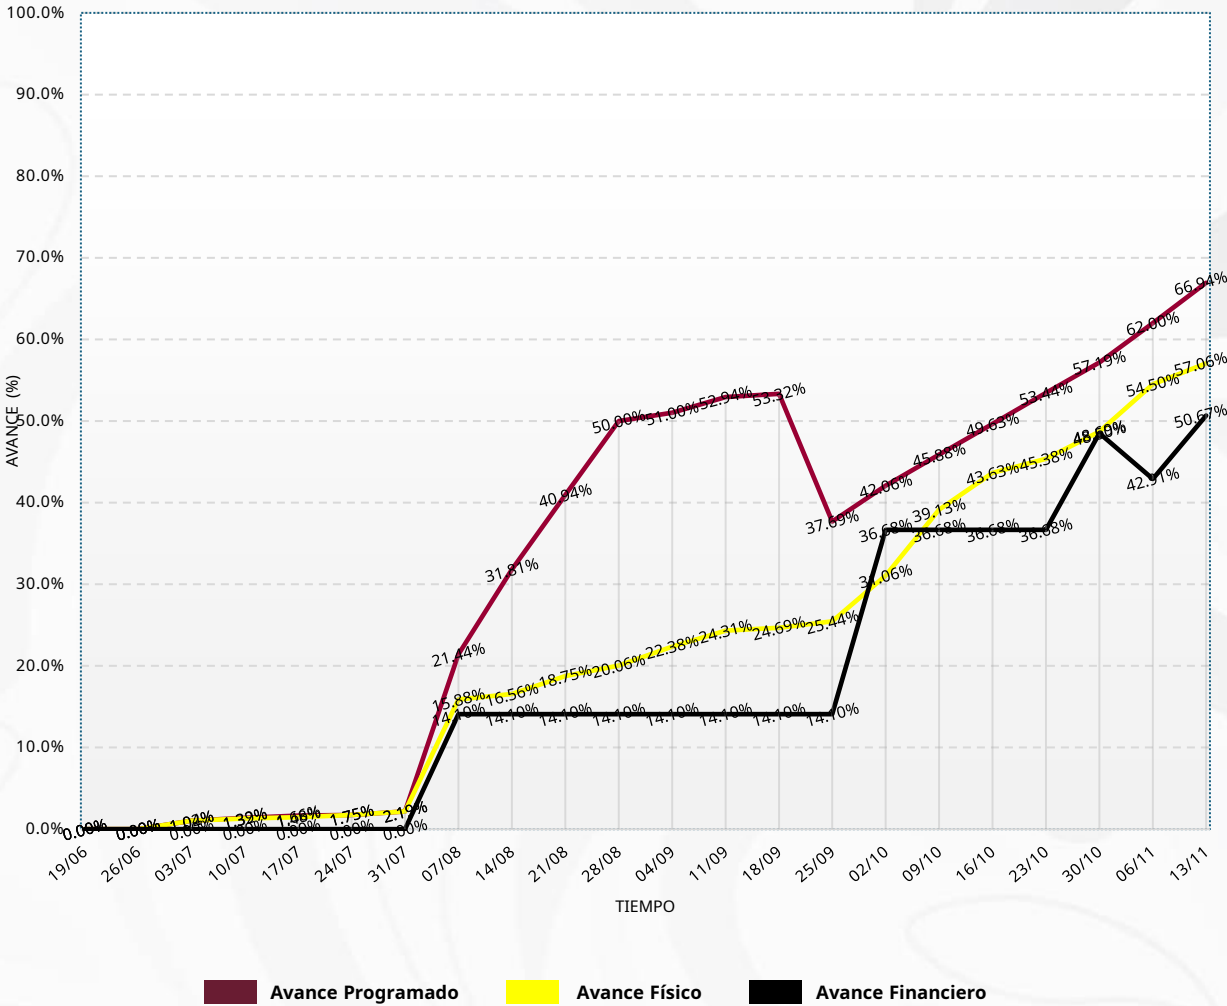

	Del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2025	Del 07 al 13 de noviembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	67	62
Maquinaria	12	20
