

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680


(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 14.2%
- Real: 20.24%
- Semanal: 0.6%
- Financiero: 9.36%

Avance 2025

- Programado: 68.0%
- Real: 85.0%
- Semanal: 4.9%
- Financiero: 28.8%

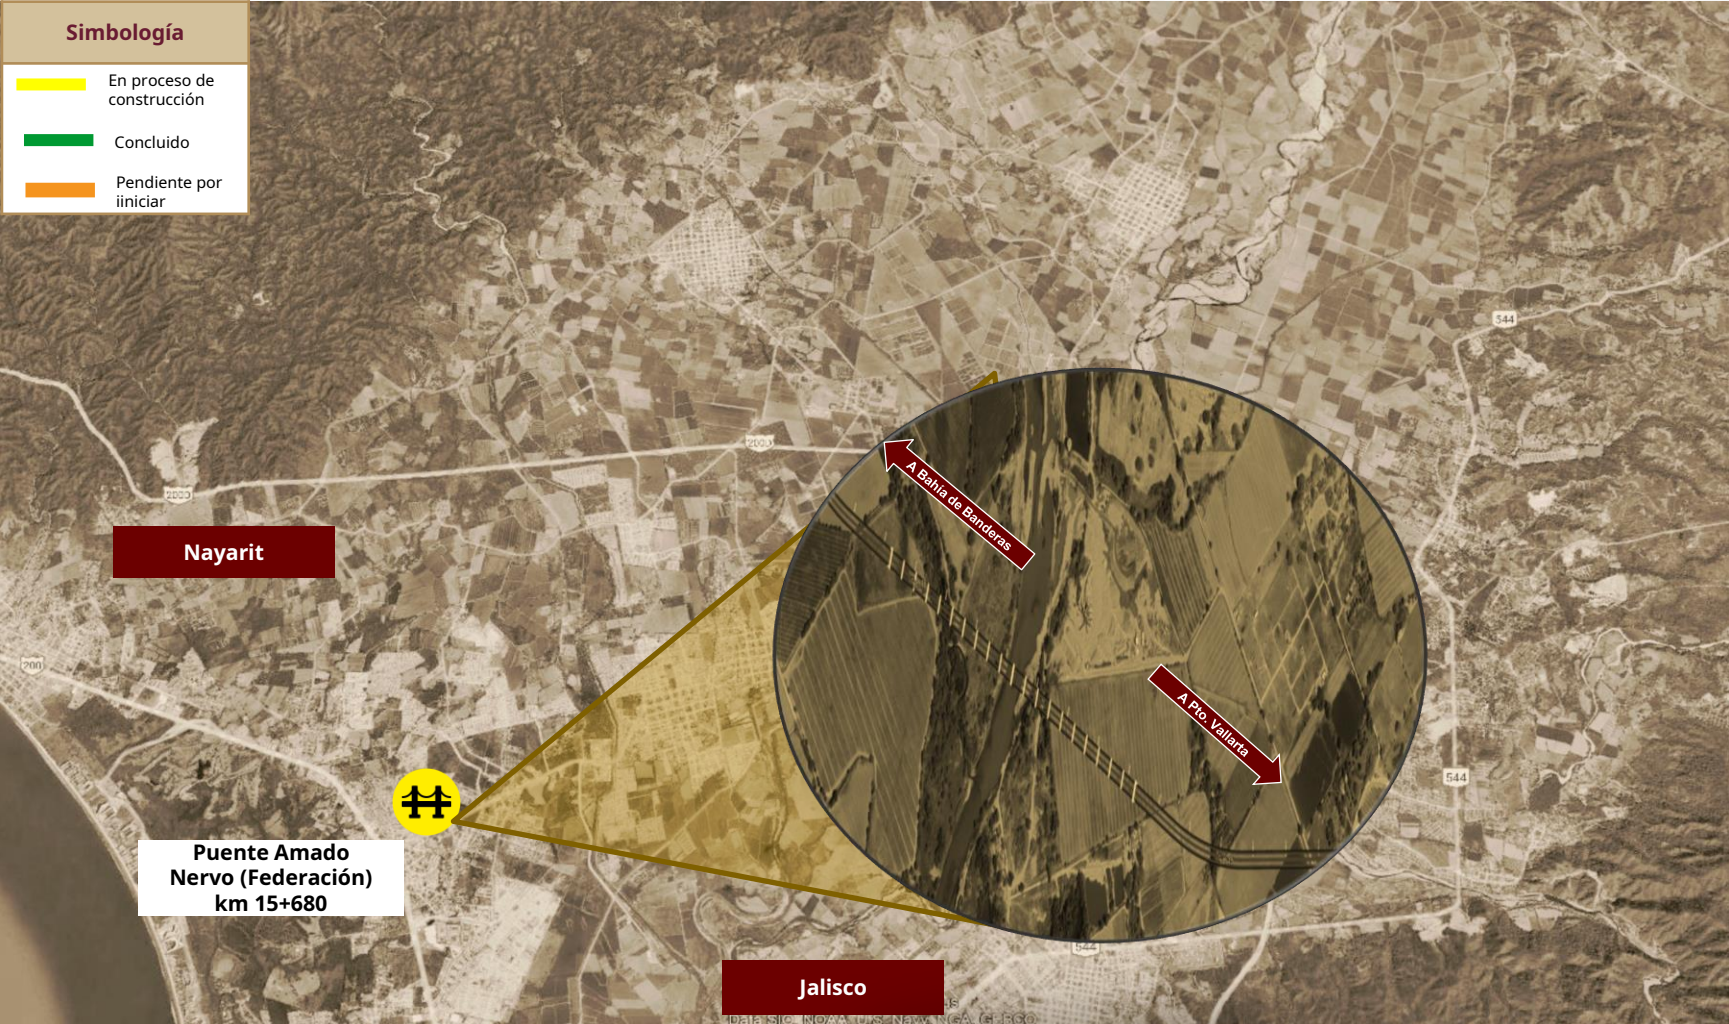

-  **Inversión total 2025-2026:** 900.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | 0.4 km de Puente
-  **Meta total:** 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km
-  **Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: 31 Diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre
-  **479,471** habitantes beneficiados
-  **2,700** empleos generados
-  **25 min** ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo(Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 07/11/25 al 13/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	2.50	1.40	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,689.00	54.8%	6,353.0	1,058.80	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	1,803.80	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	30,145	18.7%	130,972.0	3,788.50	1,872	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	114	90.5%	12	2	1	Se tienen armados 12 pilotes adicionales
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	63	50.0%	63	5	9	Se tienen coladas 54 columnas del apoyo 14 al 21
Cabezales	pza.	21	6	28.6%	15	1	2	Se tienen colados los cabezales de los apoyos 17, 18, 19 y 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	1	0.6%	159	6	1	Se tiene colada 1 trabe y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	0	0.0%	4.00	1	0	Llegada de cajones prefabricados al sitio de los trabajos
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	0.7	35.0%	1.30	0.4	0.0	Se trabaja en armado y colado para PSV lado Nayarit.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

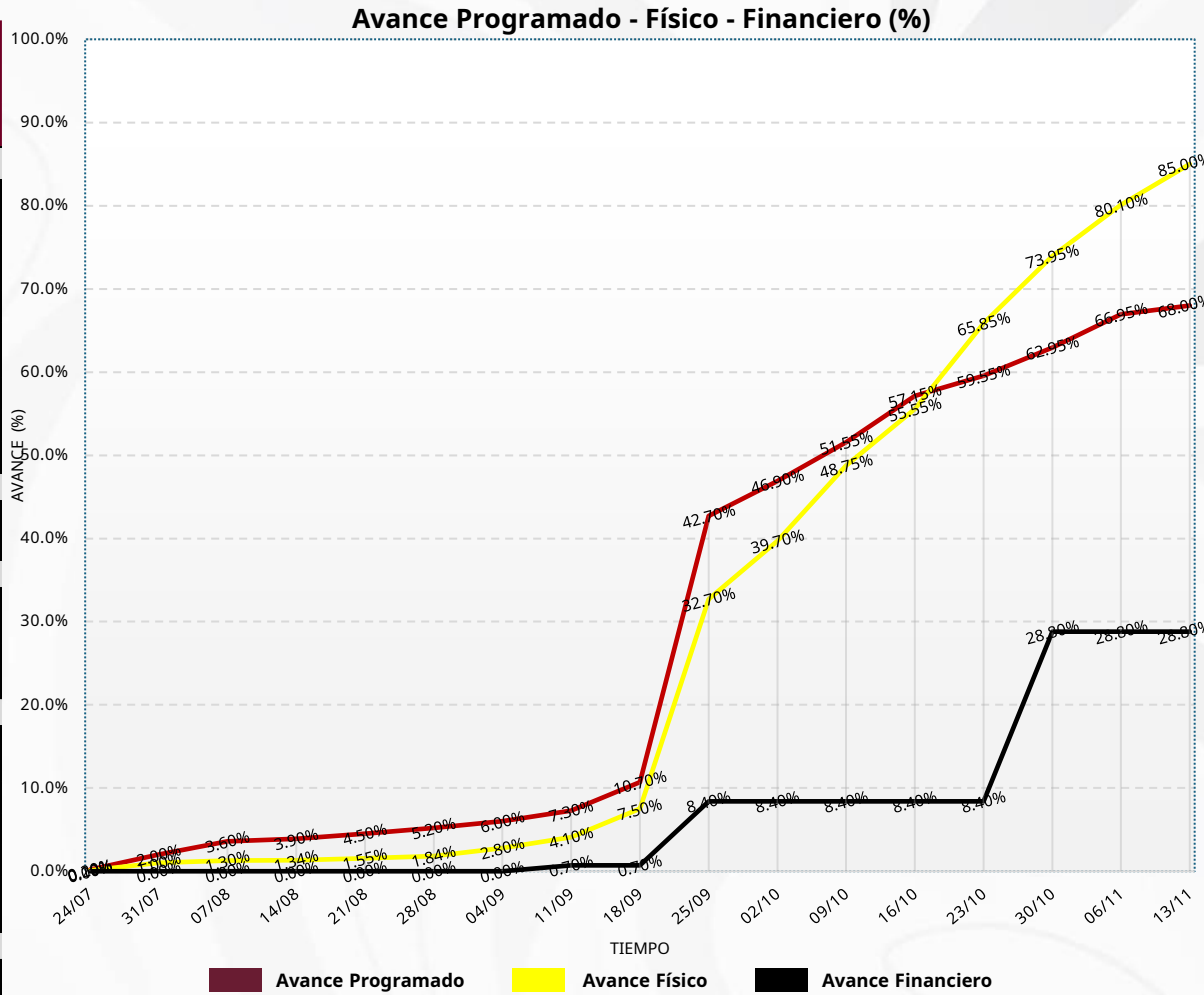

	31 de octubre al 06 de Noviembre	07 de noviembre al 13 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	93	86
Maquinaria	19	19
