

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 33.73%
- Real: 53.04%
- Semanal: 0.04%
- Financiero: 33.64%

Avance 2025

- Programado: 72.96%
- Real: 100.0%
- Semanal: 0.09%
- Financiero: 70.51%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp
Inversión 2025: 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

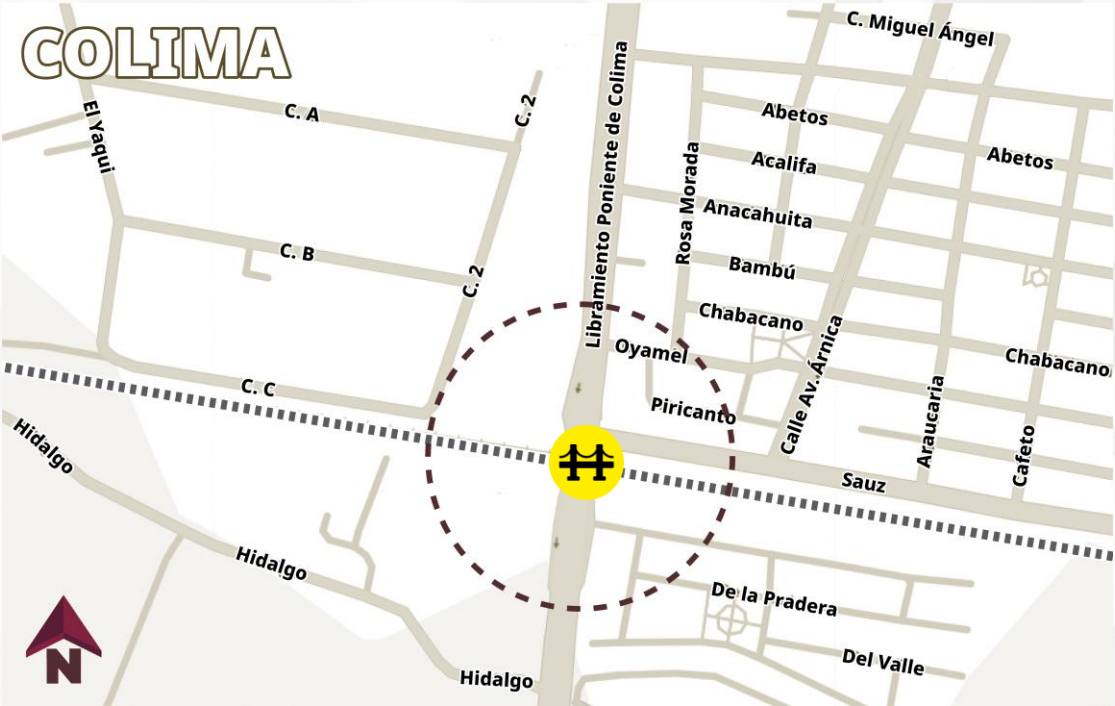

PSF Arco Sur
Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

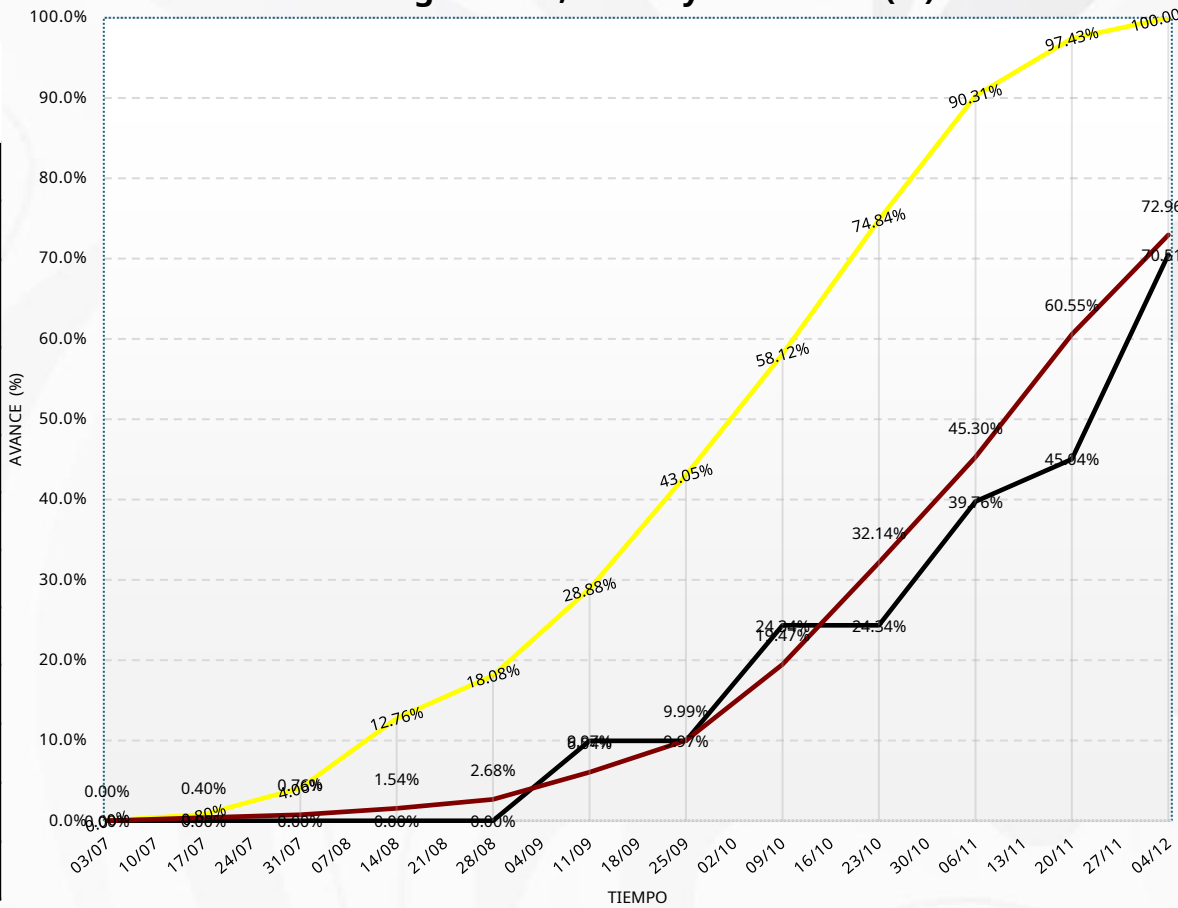

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	21 de al 27 de noviembre	28 de noviembre de al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	268	268
Maquinaria	45	55
Fuerza de trabajo	13	13
