

PSV Arco Norte Colima

Avance global

- Programado: 33.71%
- Real: 53.90%
- Semanal: 1.49%
- Financiero: 31.5%

Avance 2025

- Programado: 98.83%
- Real: 100.00%
- Financiero: 76.0%

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.
* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.

 **Inversión total 2025-2026:** 436 mdp
Inversión 2025: 185.0 mdp


 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))

 **Inicio:** 10 de junio de 2025
Término: abril 2026
Término meta 2025: diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

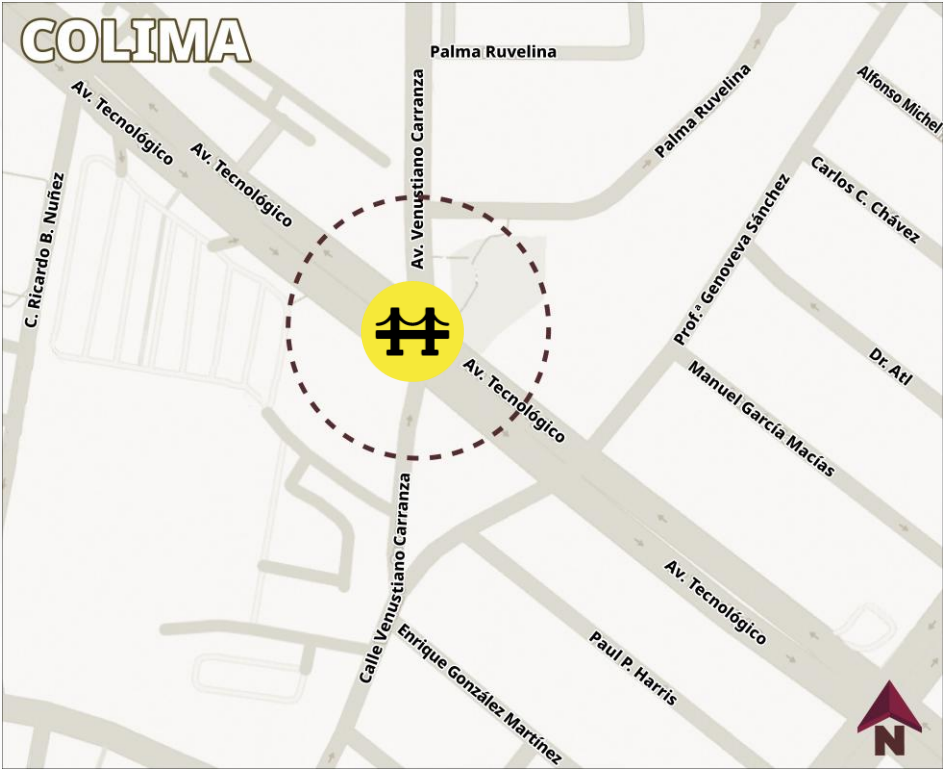

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Libramiento Arco Norte

Colima


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	4.13	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	1.25	0.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	2.63	0.00	Trabajos concluidos
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	1.38	1.00	Trabajos concluidos



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

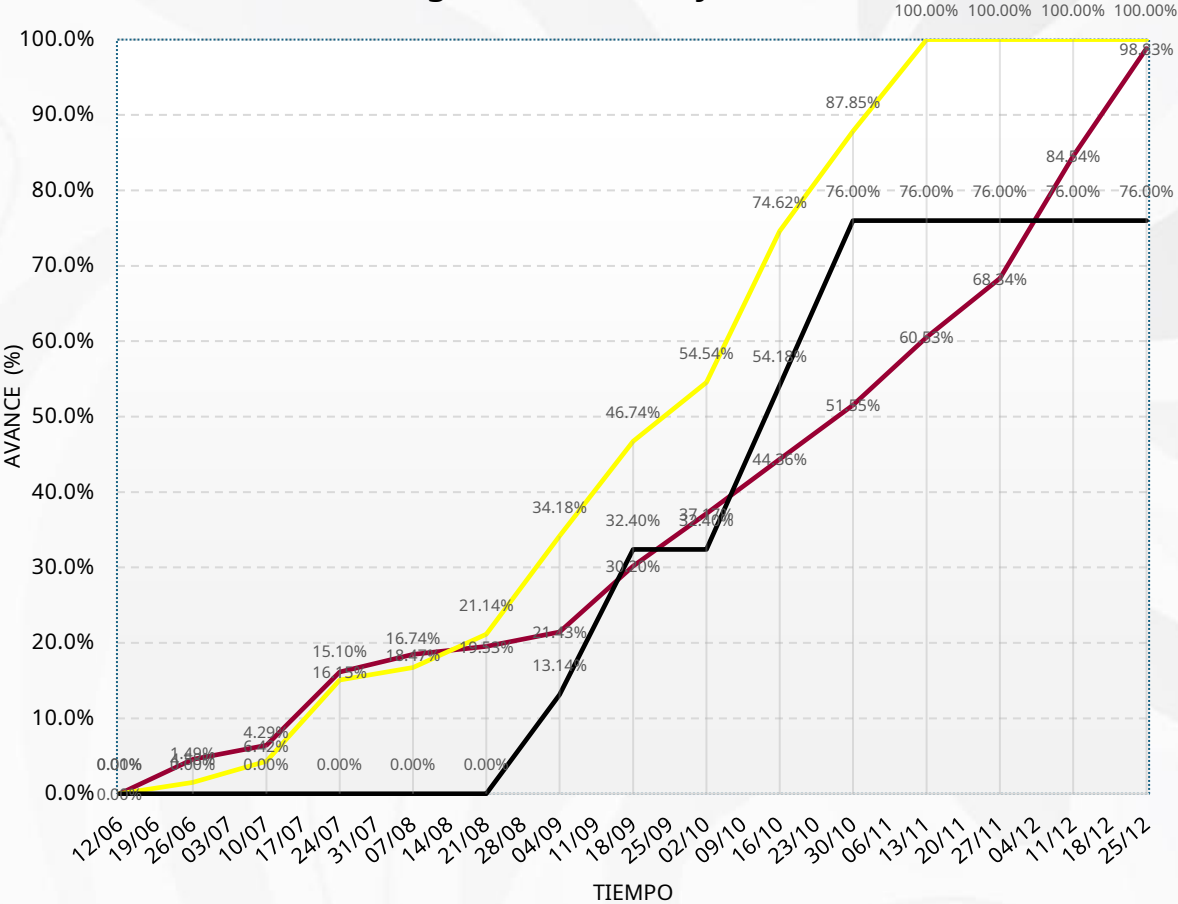

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	90	70
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	6	5
