

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 44.44%
- Real: 56.55%
- Semanal: 0.95%
- Financiero: 36.4%


Avance 2025

- Programado: 96.13%
- Real: 100.0%
- Semanal: 2.05%
- Financiero: 70.51%

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.

-  **Inversión total 2025-2026:** 630 mdp
Inversión 2025: 280 mdp
-  **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)
-  **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre
-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **1,431** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V

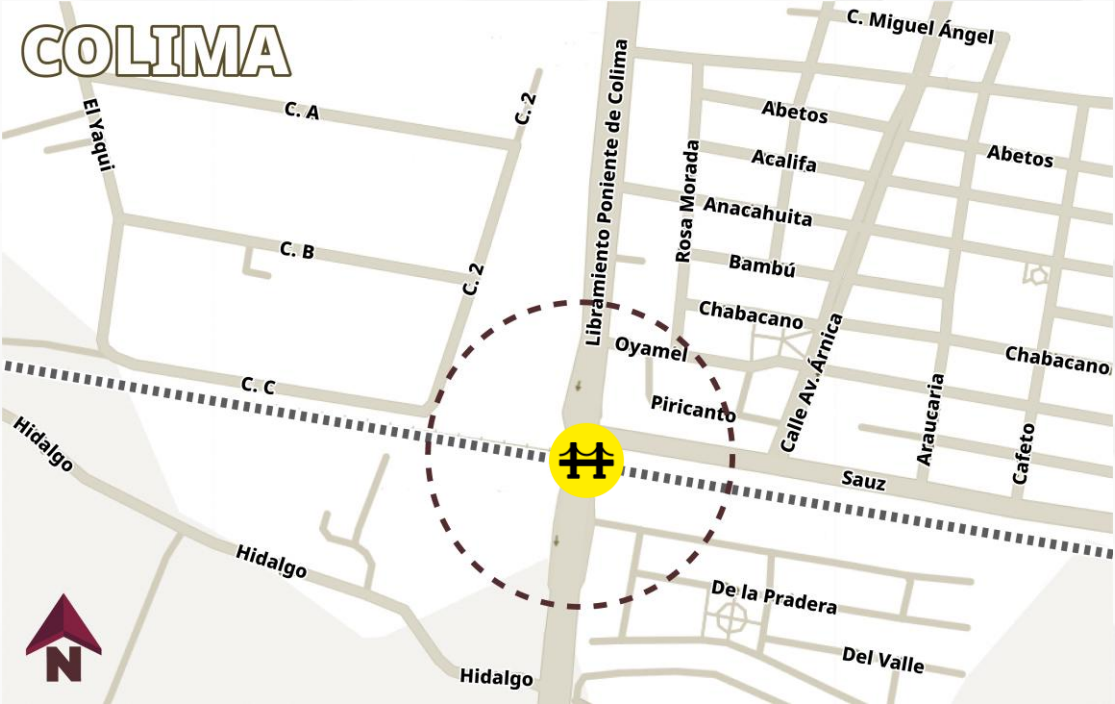

PSF Arco Sur

Colima




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.0	129.11	124.89	2.24	1.43	
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 322.01	155.54	16.68	0.00	
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	219.44	3.56	4.18	0.00	
Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3)	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	
SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL						
Pilas (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Cabezales (pza)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Accesos (m3)	210.02	12.45	197.57	3.76	0.00	
Superestructura puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.41	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	962.25	32.31	12.13	0.00	
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	737.76	52.66	62.55	0.00	
Accesos al PSF (m)	896.00	260.48	635.52	6.48	28.00	

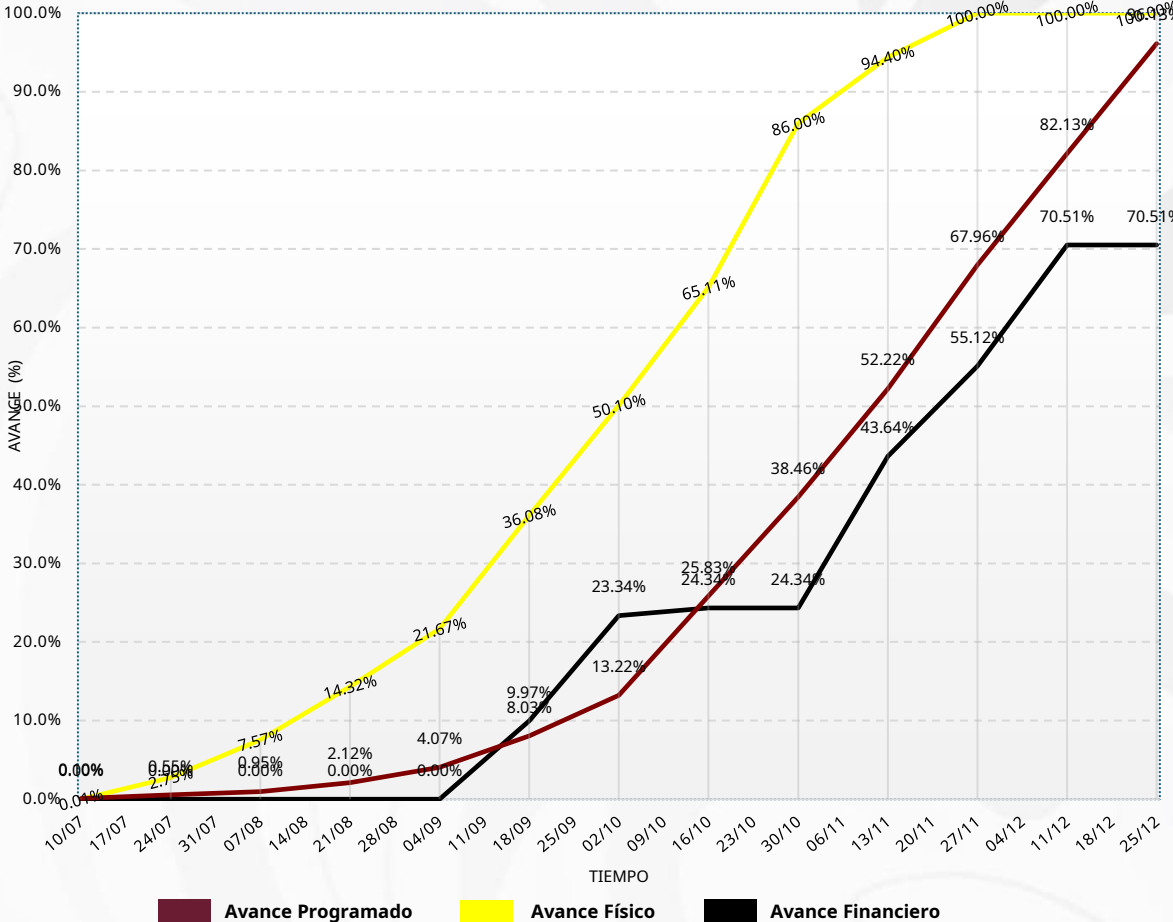

	12 al 18 de diciembre	19 al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	268	176
Maquinaria	55	60
Fuerza de trabajo	13	11
