


Puente El Chical

Colima

- Avance global**
 - Programado: 19.94 %
 - Real: 71.10%
 - Semanal: 3.15 %
 - Financiero: 19.78 %
- Avance 2025**
 - Programado: 87.45 %
 - Real: 100 %
 - Semanal: 10.31 %
 - Financiero: 86.27%

-  **Inversión total 2025-2026:** 115.6 mdp
Inversión 2025: 42.6 mdp
-  **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente
-  **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025
-  **4,053** habitantes beneficiados
-  **330** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

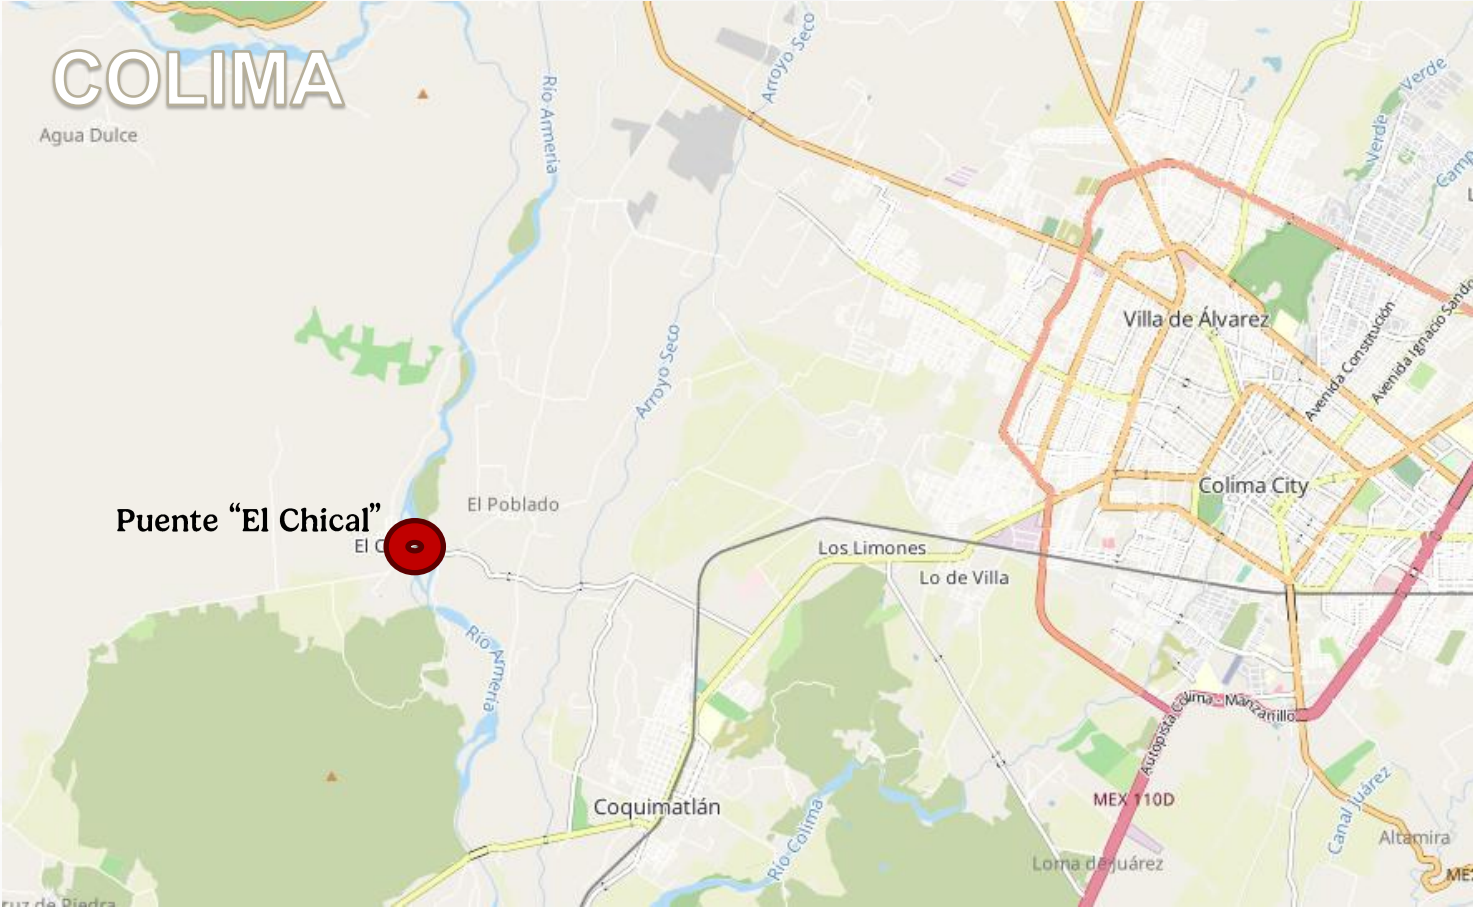

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25	
				Programado	Ejecutado
Resumen de Obra					
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	40.0	5.0	3.0	3.0
Montaje de trabes (Pza)	45.0	30.0	15.0	5.0	5.0
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	216.0	432.0	0.0	0.0
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0

