

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 40.2%

• Real: 32.13%
- Semanal: 1.88%

• Financiero: 17.91%


Avance 2025

- Programado: 100%

• Real: 80.3%
- Semanal: 4.7%

• Financiero: 45.62%

Convenio de reprogramación SICT 6.29-303-2396-2025

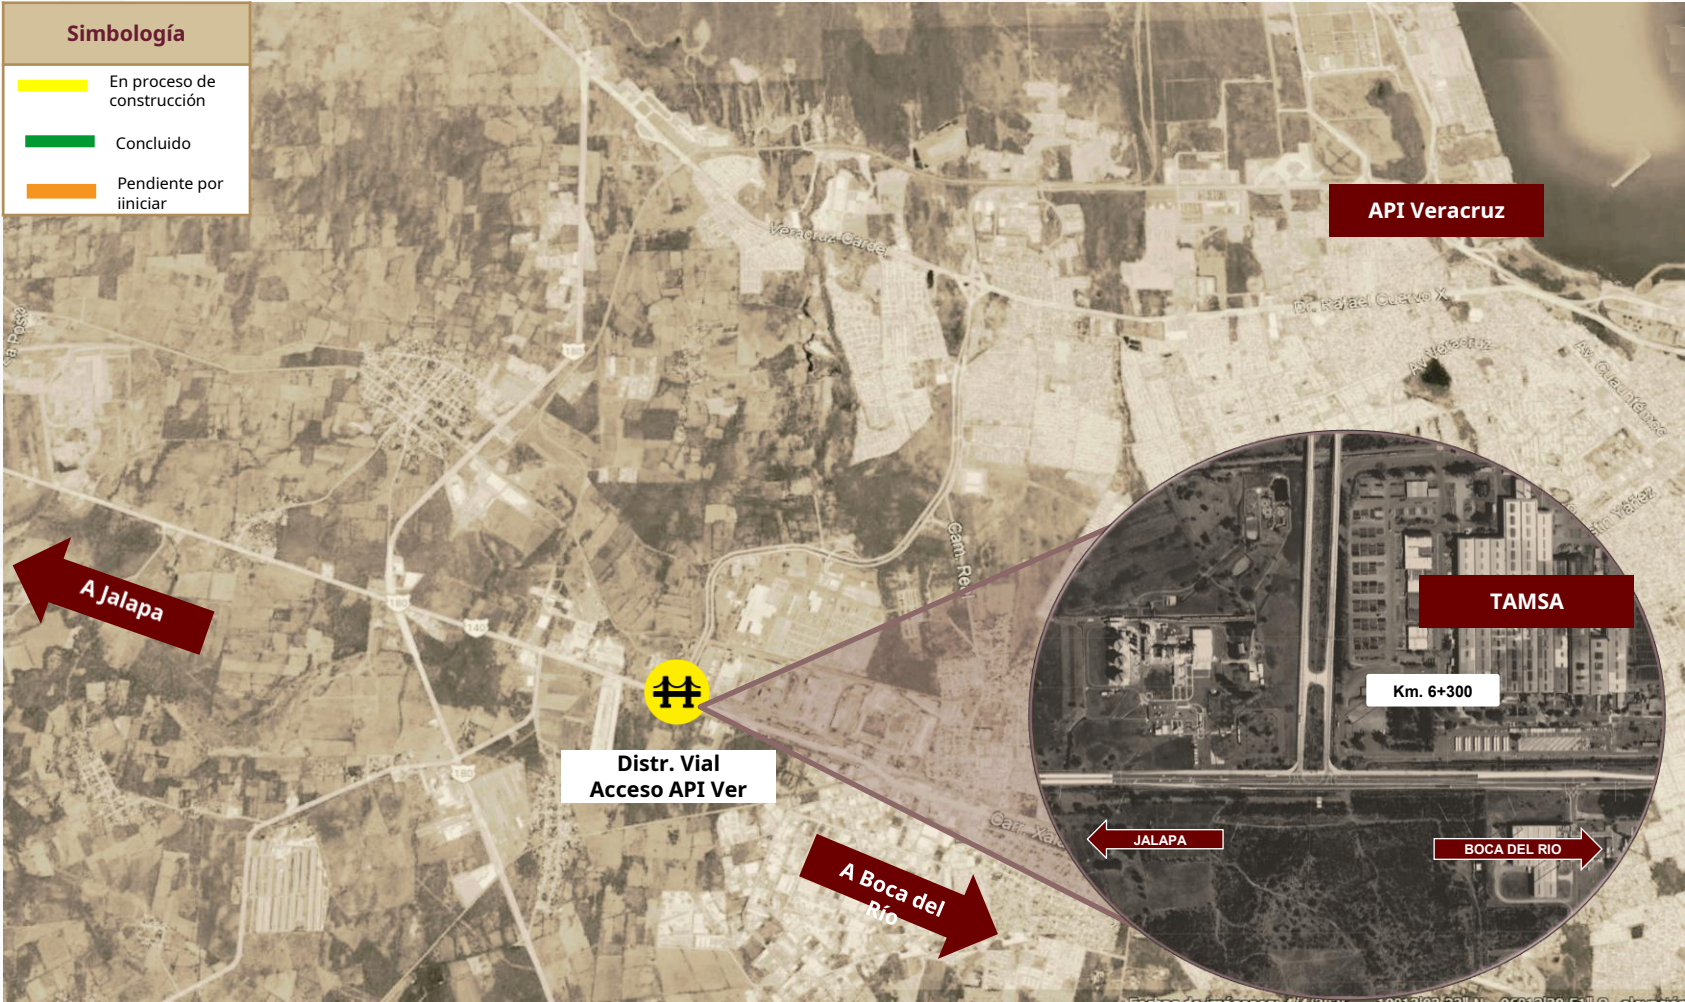

 **Inversión total 2025-2026: 902 mdp**  
**Inversión 2025:** 367.3 mdp | 0.78 km de PSV

 **Meta total 2025-2026: 1.97 km**  
1 PSV: 0.872 km  
Accesos: 0.532 km  
Transiciones: 0.566 km

 **Inicio:** 14 de julio de 2025  
**Término:** junio de 2026  
**Termino meta 2025:** Diciembre

 **780,441** habitantes beneficiados

 **2,235** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

| Elemento                        | Unidad | Volumen<br>Total | Ejecutado<br>Acumulado | Faltante | Ejecutado del 19 al<br>25/12/25 |           | Observaciones |                                                                                                     |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |        |                  |                        |          | Programado                      | Ejecutado |               |                                                                                                     |
| TERRACERÍAS                     |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                                                     |
| Desmonte                        | Ha     | 4.10             | 4.10                   | 100%     | 0.00                            | 0.00      | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| Despalme                        | m³     | 7,213.00         | 7,213                  | 100.0%   | 0.00                            | 622.50    | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| Obra Inducida                   | Lote   | 1                | 0                      | 0        | 1                               | 0.00      | 0.0           |                                                                                                     |
| Excavaciones                    | m³     | 52,059.00        | 36,571.0               | 70.2%    | 15,488.00                       | 15,488.00 | 0.0           |                                                                                                     |
| Terraplenes                     | m³     | 36,650.00        | 27,530.0               | 75.1%    | 9,120.00                        | 9,120.00  | 0.0           | Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500                               |
| Muro Mecánicamente Estabilizado | m³     | 1,531.00         | 0                      | 0.0%     | 1,531.00                        | 510.30    | 0.0           |                                                                                                     |
| Terraplenes en Rampa            | m³     | 4,384.00         | 0                      | 0.0%     | 4,384.00                        | 4,384.00  | 0.0           |                                                                                                     |
| Pavimentos asfálticos           | m³     | 3,090.00         | 0                      | 0.0%     | 3,090.00                        | 1,545.00  | 0.0           |                                                                                                     |
| Paraderos                       | pza.   | 1                | 0                      | 0.0%     | 1                               | 0.00      | 0.0           |                                                                                                     |
| INFRAESTRUCTURA                 |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                                                     |
| Pilotes                         | pza.   | 132              | 132                    | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| Zapatas                         | pza.   | 21               | 21                     | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| SUBESTRUCTURA                   |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                                                     |
| Columnas (pza)                  | pza.   | 21               | 21                     | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| Cabezales                       | pza.   | 23               | 23                     | 100.0%   | 0                               | 2         | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                                               |
| SUPERESTRUCTURA                 |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                                                     |
| Trabes tipo AASHTO VI           | pza.   | 132              | 88                     | 66.7%    | 44                              | 44        | 10.0          | Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado                                    |
| Montaje de trabes               | pza.   | 132              | 78                     | 59.1%    | 54                              | 22        | 6.0           | Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.                                                   |
| Diafragmas                      | pza.   | 110              | 50                     | 45.5%    | 60                              | 14        | 10.0          |                                                                                                     |
| Losa (claro)                    | pza.   | 22.00            | 10                     | 45.5%    | 12                              | 4         | 2.0           | Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas |

