

- Avance global

- Programado: 48.02%
 - Real: 64.20%

- Semanal: 1.05%
 - Financiero: 28.46%
- Avance 2025

- Programado: 97.67%
 - Real: 99.53%

- Semanal: 0.10%
 - Financiero: 62.26%

- 

Inversión total 2025-2026: 700 mdp

Inversión 2025: 319.94 mdp | 1.35 km del Deprimido
- 

Meta total: 1 Deprimido | **1.5 km**

Gasas | 4.1 km
- 

Inicio: 12 de mayo de 2025

Término: abril de 2026

Término meta 2025: Diciembre
- 

351,000 habitantes beneficiados
- 

1,350 empleos generados
- 

25 min ahorro en tiempo



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Baja California Sur

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur


(Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero

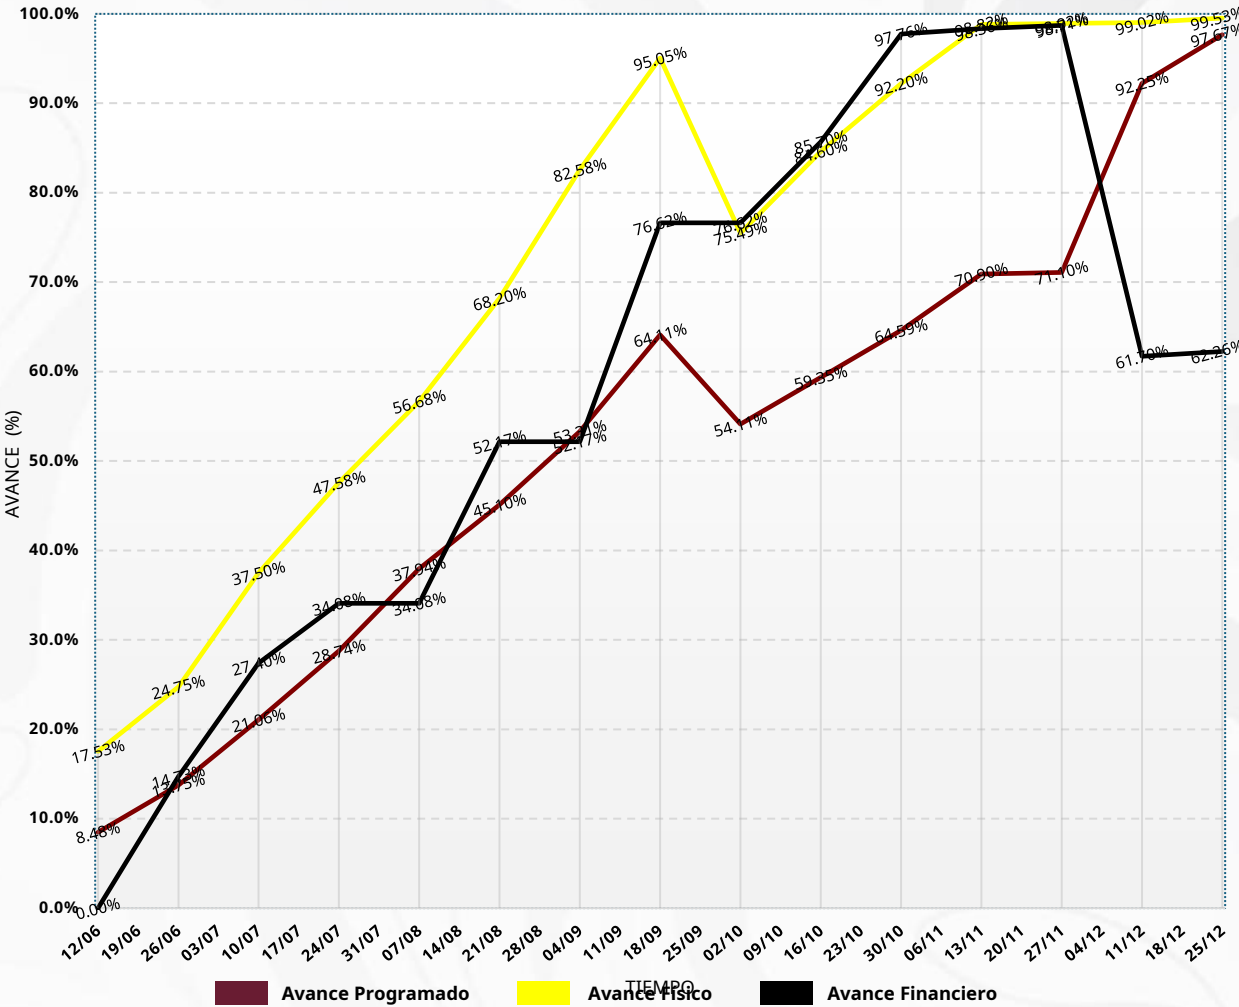

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	97	60
Maquinaria	16	16
Frentes de trabajo	9	6

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Retiro de vegetación (pzas)	480.0	480.0	-	-	-	Concluido
Reubicación de Monumento FONATUR (pza)	1.0	1.0	-	-	-	Concluido
Terracerías						
Terracerías (m3)	14,112.0	6,540.4	7,571.6	940.8	0.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	68,564.0	31,505.2	7,697.6	4,000.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	0.0	0.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	5,643.3	6,196.7	0.0	200.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Muros de 2 a 7 m (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Pilas tangentes (pzas)	1,311.0	1,311.0	0.0	0.0	16.0	Cambio de meta por cambio de proyecto.
Trabes de liga (m)	1,123.6	454.0	669.6	0.0	0.0	
Fabricación de cabezal (pzas)	8.0	8.0	0.0	0.0	1.0	Concluido
Fabricación trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	-	-	-	Concluido
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	20.0	32.0	7.0	8.0	
Losas de acceso (m2)	609.8	225.0	384.8	152.5	75.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	0.0	1,642.8	410.7	0.0	
Guarnición (m3)	375.0	43.1	331.9	0.0	0.0	
Banquetas (m3)	3,304.2	35.0	3,269.2	0.0	35.0	
Pavimento rígido (m3)	5,227.0	0.0	5,227.0	0.0	0.0	
Pavimento flexible (m3)	34,720.0	142.1	34,577.9	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,795.2	0.0	1,795.2	0.0	0.0	
Semaforización						
Semaforización (%)	100	0.0	100	0.0	0.0	
Obra inducida						
Reubicación de línea de media tensión de CFE (m)	1,723.0	1,723.0	-	-	-	Concluido
