

# PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

## Sinaloa



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance global

- Programado: 44.76%
- Real: 71.96%
- Semanal: 2.08%
- Financiero: 53.1%

### Avance 2025

- Programado 97.5%
- Real: 100%
- Semanal: 1.2%
- Financiero: 88.2%



**Inversión total 2025-2026:** 452.0 mdp  
**Inversión 2025:** 225.0 mdp | (50% de PSV)



**Meta total:** 1 PSV | 0.811 km longitud total



**Inicio:** 18 de agosto de 2025  
**Término:** abril 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre




**862,037** Habitantes beneficiados



**1,140** empleos generados



**20 min** ahorro en tiempo

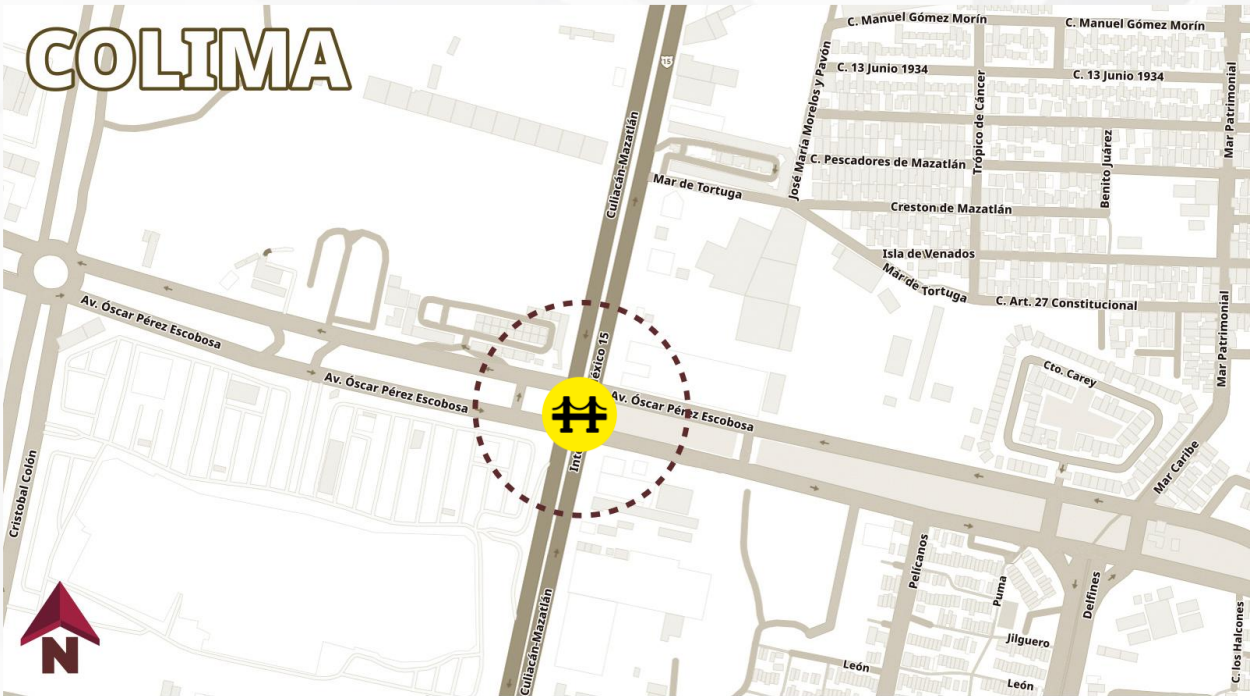


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

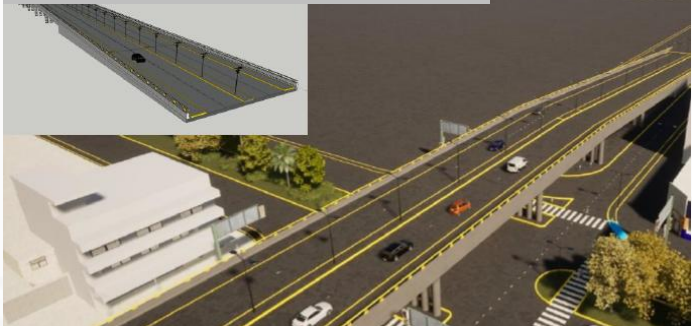

Proyecto


### Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

# PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

## Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

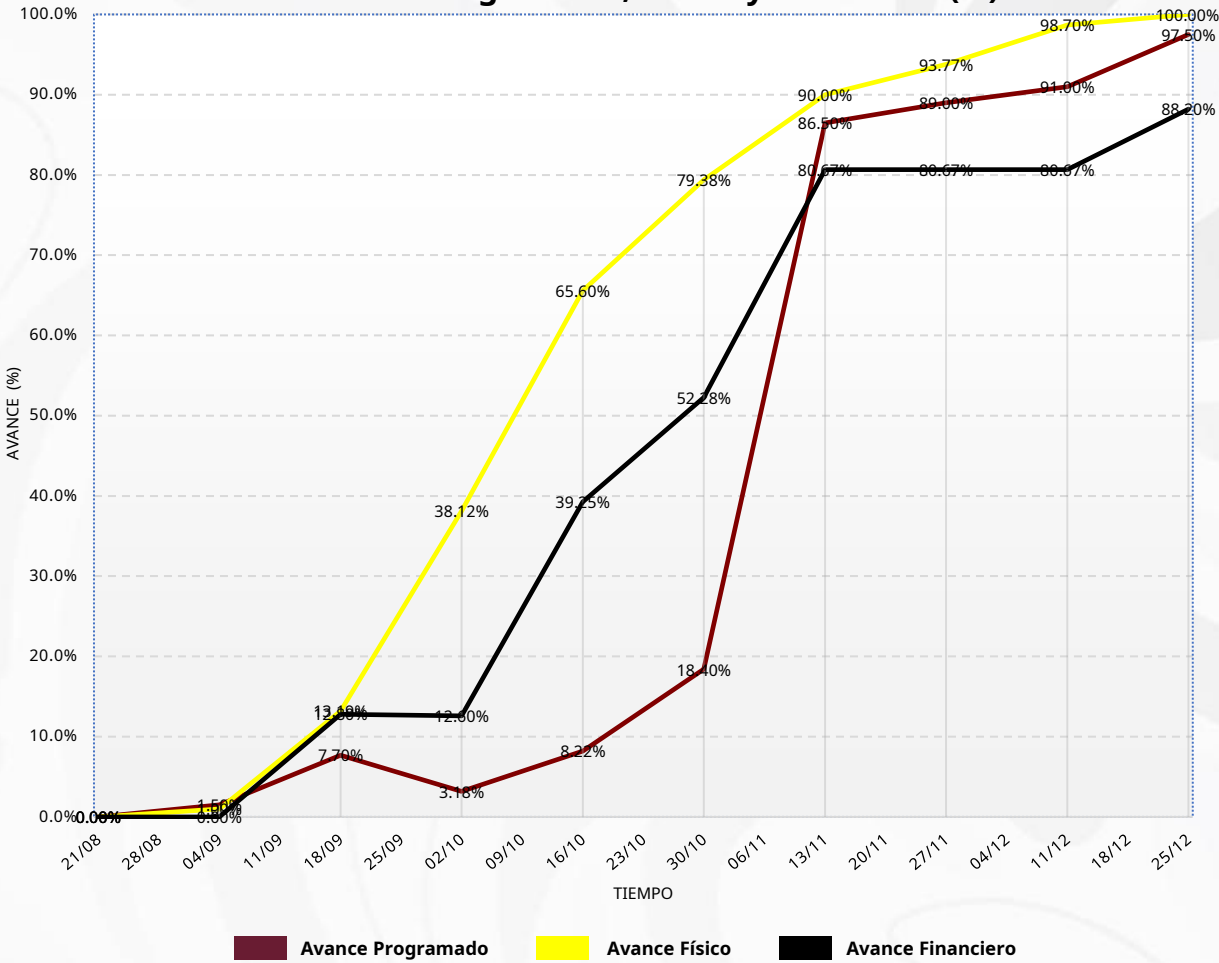

|                    | Del 12 de Diciembre al 18 de Diciembre | Del 19 de Diciembre al 25 de Diciembre |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Personal           | 142                                    | 80                                     |
| Maquinaria         | 18                                     | 17                                     |
| Frentes de trabajo | 9                                      | 7                                      |

| Elemento                                                     | Unidad    | Volumen Total | Ejecutado Acumulado | Faltante | Ejecutado del 19 al 25/12/25 |           | Observaciones |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
|                                                              |           |               |                     |          | Programado                   | Ejecutado |               |                                                |
| PRECIO ALZADO                                                |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Estudios y Proyecto Ejecutivo                                | Actividad | 2             | 1.9                 | 95.0%    | 0.1                          | 0.1       | 0.0           | Falta proyecto de semaforización y diseño      |
| Cimentación                                                  | Apoyo     | 9             | 9                   | 100.0%   | 0.0                          | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Columnas y Cabezales                                         | Apoyo     | 9             | 9                   | 100.0%   | 0.0                          | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Superestructura<br>Fabricación de Traves AASHTO IV           | Actividad | 77            | 77                  | 100.0%   | 0                            | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Superestructura<br>Montaje de Traves AASHTO IV               | pieza     | 77            | 77                  | 100.0%   | 0                            | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Superestructura<br>Fabricación de Traves Nebraska            | pieza     | 11            | 11                  | 100.0%   | 0                            | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Superestructura<br>Montaje de Traves Nebraska NU240          | pieza     | 11            | 11                  | 100.0%   | 0                            | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Muro Mecánicamente estabilizado<br>(Frabricacion de Escamas) | m2        | 1,365         | 1,365.0             | 100.0%   | 0.0                          | 0.0       | 0.0           | Concluido                                      |
| Muro Mecánicamente estabilizado<br>(Colocacion de Escamas)   | m2        | 1,365         | 1,365.0             | 100.0%   | 0                            | 0.0       | 0.0           | Se continúan trabajos de colocación de escamas |
| Muro Mecánicamente estabilizado<br>Relleno                   | m3        | 12,940        | 12,940              | 100.0%   | 0                            | 0.0       | 3,592.0       | Se continua con los trabajos de relleno        |
| Losa de concreto Hidráulico                                  | pieza     | 3             | 2.0                 | 66.7%    | 1.0                          | 0.23      | 0.5           | Se inicio con el armado de acero de refuerzo   |
| Pavimento de concreto Hidráulico                             | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Alumbrado                                                    | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Señalamiento                                                 | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Semaforización                                               | Actividad | 1             | 0                   | 0.0%     | 1                            | 0         | 0.0           |                                                |
| PRECIO UNITARIO                                              |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Terraplenes                                                  | m3        | 5,032.0       | 0                   | 0.0%     | 5,032.00                     | 0         | 0.0           |                                                |
| Base Hidráulilca                                             | m3        | 3,992.0       | 0                   | 0.0%     | 3,992.00                     | 0         | 0.0           |                                                |
| Riego de impregnación                                        | m2        | 20,330.0      | 0                   | 0.0%     | 20,330.00                    | 0         | 0.0           |                                                |
| Fresado de superficie                                        | m2        | 23,420.0      | 0                   | 0.0%     | 23,420.00                    | 0         | 0.0           |                                                |
| Banqueta                                                     | m2        | 6,922.0       | 0                   | 0.0%     | 6,922.00                     | 0         | 0.0           |                                                |
| Relleno                                                      | m3        | 692.0         | 0                   | 0.0%     | 692.00                       | 0         | 0.0           |                                                |
