

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 27.05%
• Real: 32.70%

• Semanal: 0.40%
• Financiero: 16.90%

Avance 2025

• Programado: 100.00%
• Real: 100.00%

• Financiero: 70.72%

 Inversión total 2025-2026: 700 mdp

Inversión 2025: 140 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 Inicio: 16 de julio de 2025

Término: julio de 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre


 73,215 habitantes beneficiados

 7,306 empleos generados

 20 min ahorro en tiempo

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

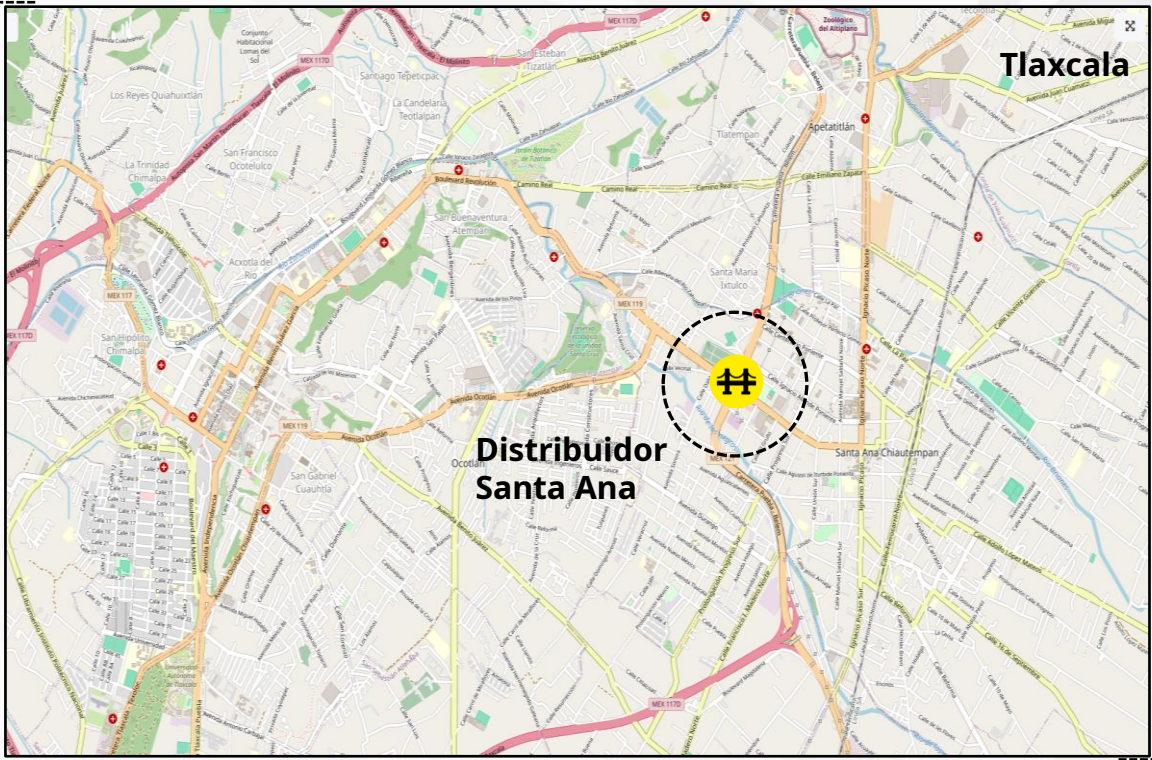

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

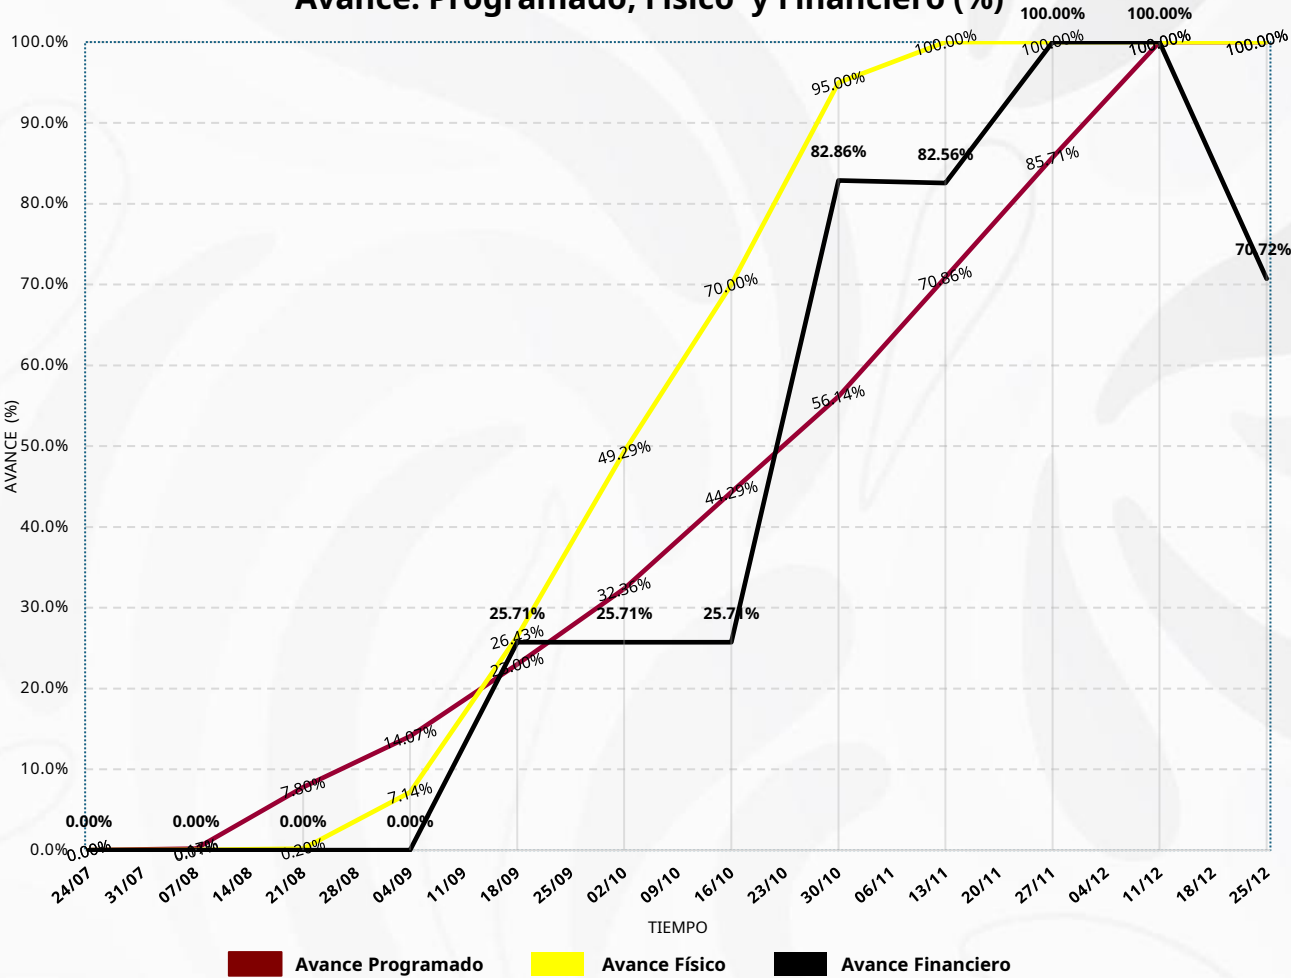

Elemento	Meta	Ejecutado Acumable	Faltante	19 al 25-12-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	32.70% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.51%	0.40%	Se trabaja en cabezales eje 2 y 11; así como columnas #4,5 y 7 al #9.

	12 al 18 de diciembre	19 al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	122	127
Maquinaria	18	18
Frente de trabajo	13	13
