

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

• Programado: 38.56 %

• Real: 35.18 %

• Semanal: 2.32 %

• Financiero: 29.98 %

Avance 2025

• Programado: 96.40 %

• Real: 87.95 %

• Semanal: 5.80 %

• Financiero: 82.15 %

 **Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp

Inversión 2025: 31.0 mdp

 **Meta total:** 0.601 km

Meta 2025: 38.6 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025


Fecha de término: Abril, 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

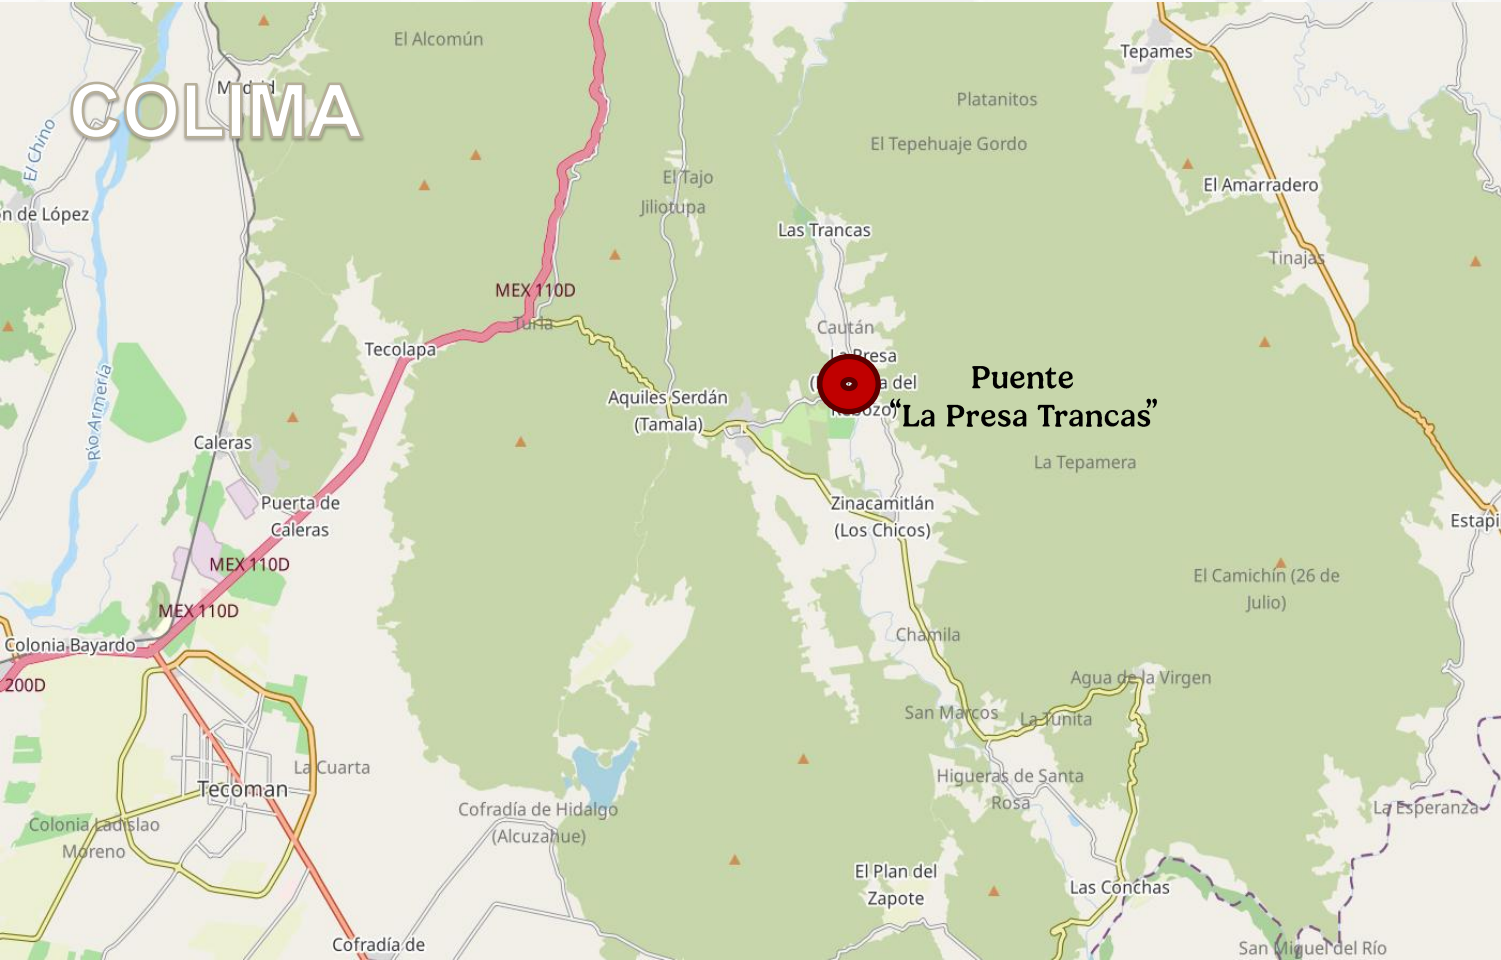


Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00
Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.	4.00	0.00	4.00	0.80	0.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Armado)	18.00	17.00	1.00	1.0	1.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Colado)	18.00	14.00	4.00	2.00	2.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	0.00	18.00	2.6	0.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	39.4	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220.00	73.3	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	11.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182.00	30.3	0.00

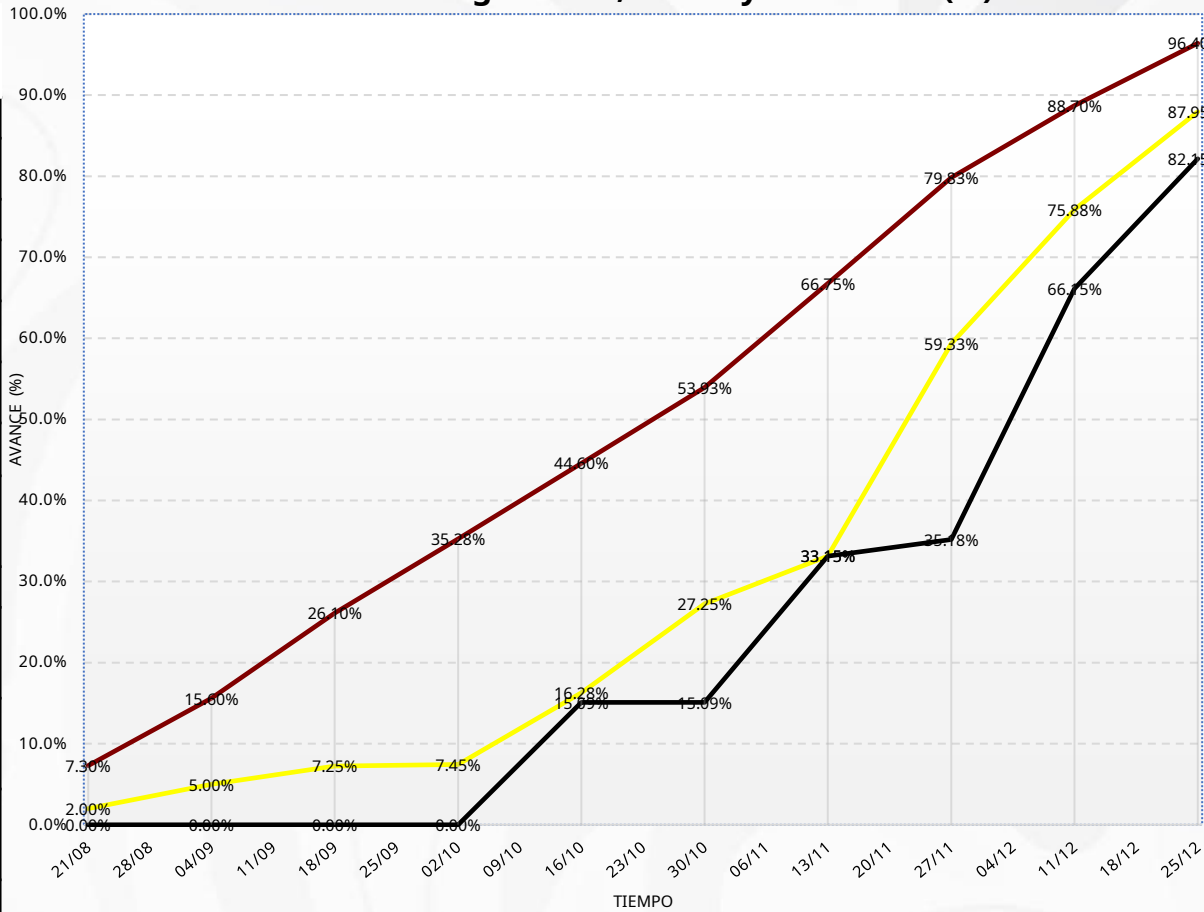

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	12 al 18 de diciembre	19 al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	54	54
Maquinaria	7	7
Frentes de Trabajo	6	4
