

PSV Arco Norte

Colima

- Avance global

• Programado: 56.62%

• Real: 60.20%

• Semanal: 2.1%

• Financiero: 34.11%
- 

Inversión total 2025-2026: 436.0 mdp

Meta total: 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
- 

Inversión 2026: 251.0 mdp

Meta 2026: 267 m (45.2% (superestructura, pavimentos, accesos, iluminación y obras complementarias bajo puente))
- 


Inicio: 10 de junio de 2025

Término: abril 2026
- 

306,810 habitantes beneficiados
- 

1,308 empleos generados
- 

15 min ahorro en tiempo

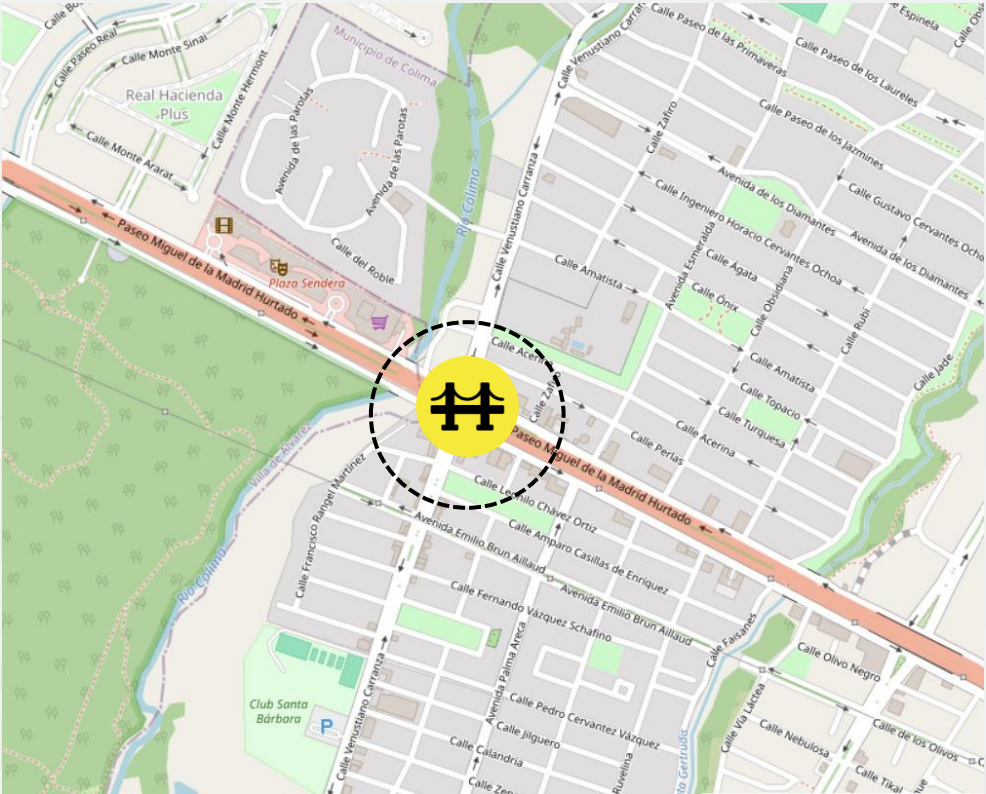

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto


Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN

PSV Libramiento Arco Norte

Colima

Elementos	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	23/01/26 al 29/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	104.42	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	494.09	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	168.35	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	244.83	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

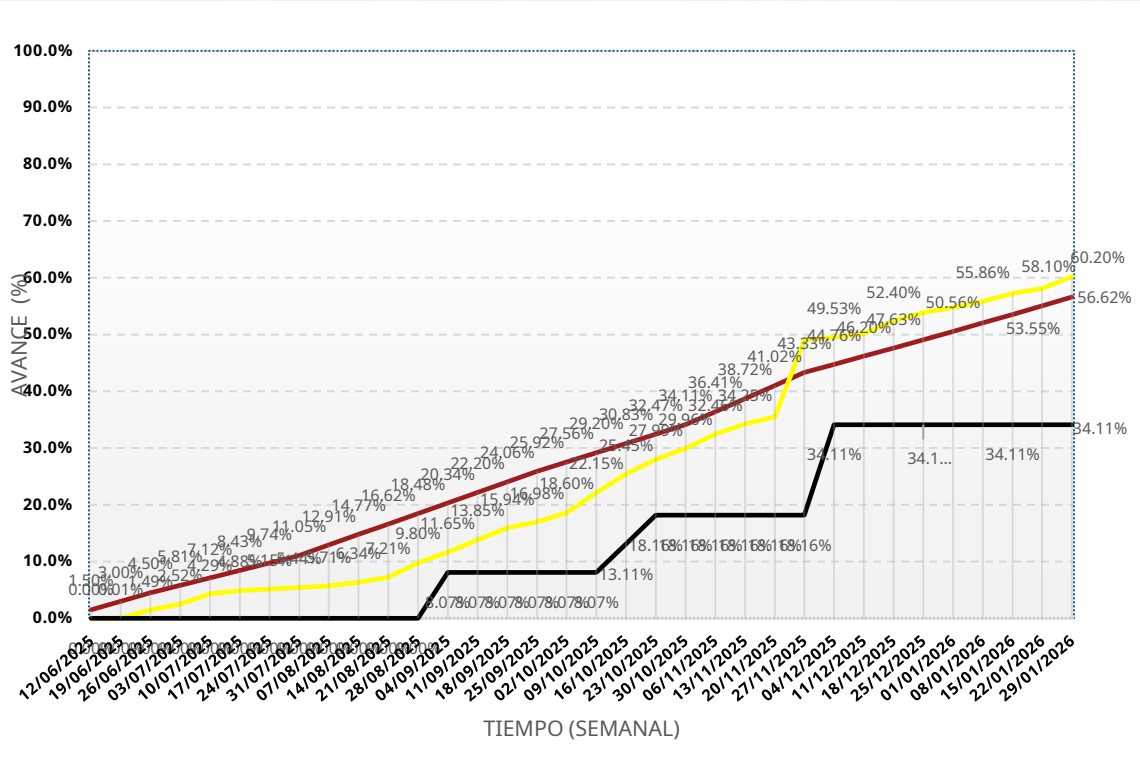

	16 de enero al 22 de enero	23 de enero al 29 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	80	80
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
