

PSF Arco Sur

Colima

- Avance global

• Programado: 62.88%

• Real: 63.10%

• Semanal: 1.50%

• Financiero: 47.22%
- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp

Inversión 2025: 280 mdp

Inversión 2026: 350.0 mdp
- 

Meta total: 1.2 km (puente y accesos)

Meta 2026: 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
- 

Inicio: 03-Julio de 2025

Término: abril de 2026

Término meta 2025: Diciembre


Término meta 2026: Abril
- 

157,048 habitantes beneficiados
- 

1,431 empleos generados
- 

15 min ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025

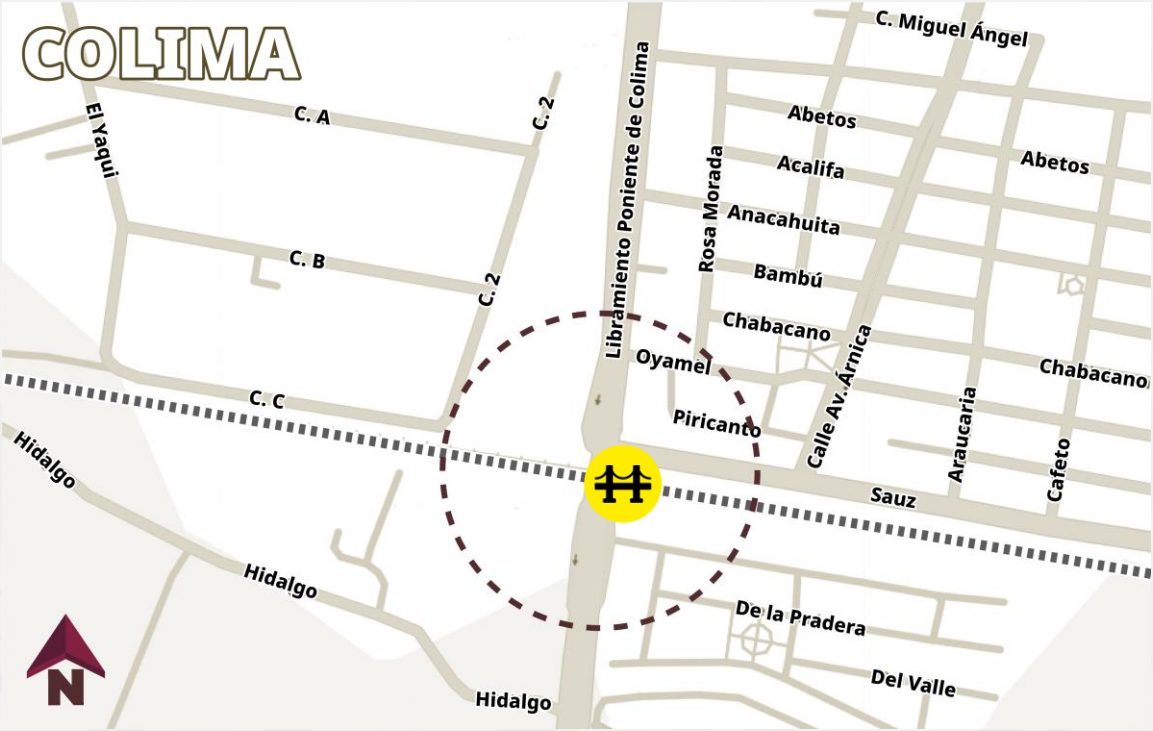

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	23/01/2026 al 29/01/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	-	-	-	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 477.55	-	-	-	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	-	-	-	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	-	-	-	Partida concluida
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	-	-	-	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	-	-	-	Partida concluida
Accesos al PSF (m)	896.00	384.96	511.04	12.77	35.42	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	-	-	-	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	-	-	-	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	36.00	4.00	0.00	2.00	
Cabezales (pza)	24.00	21.00	3.00	2.17	1.00	
Apoyos (pza)	168.00	5.16	162.84	7.59	0.00	

