


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 57.3%
- Real: 40.7%
- Semanal: 1.5%
- Financiero: 39.0%

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

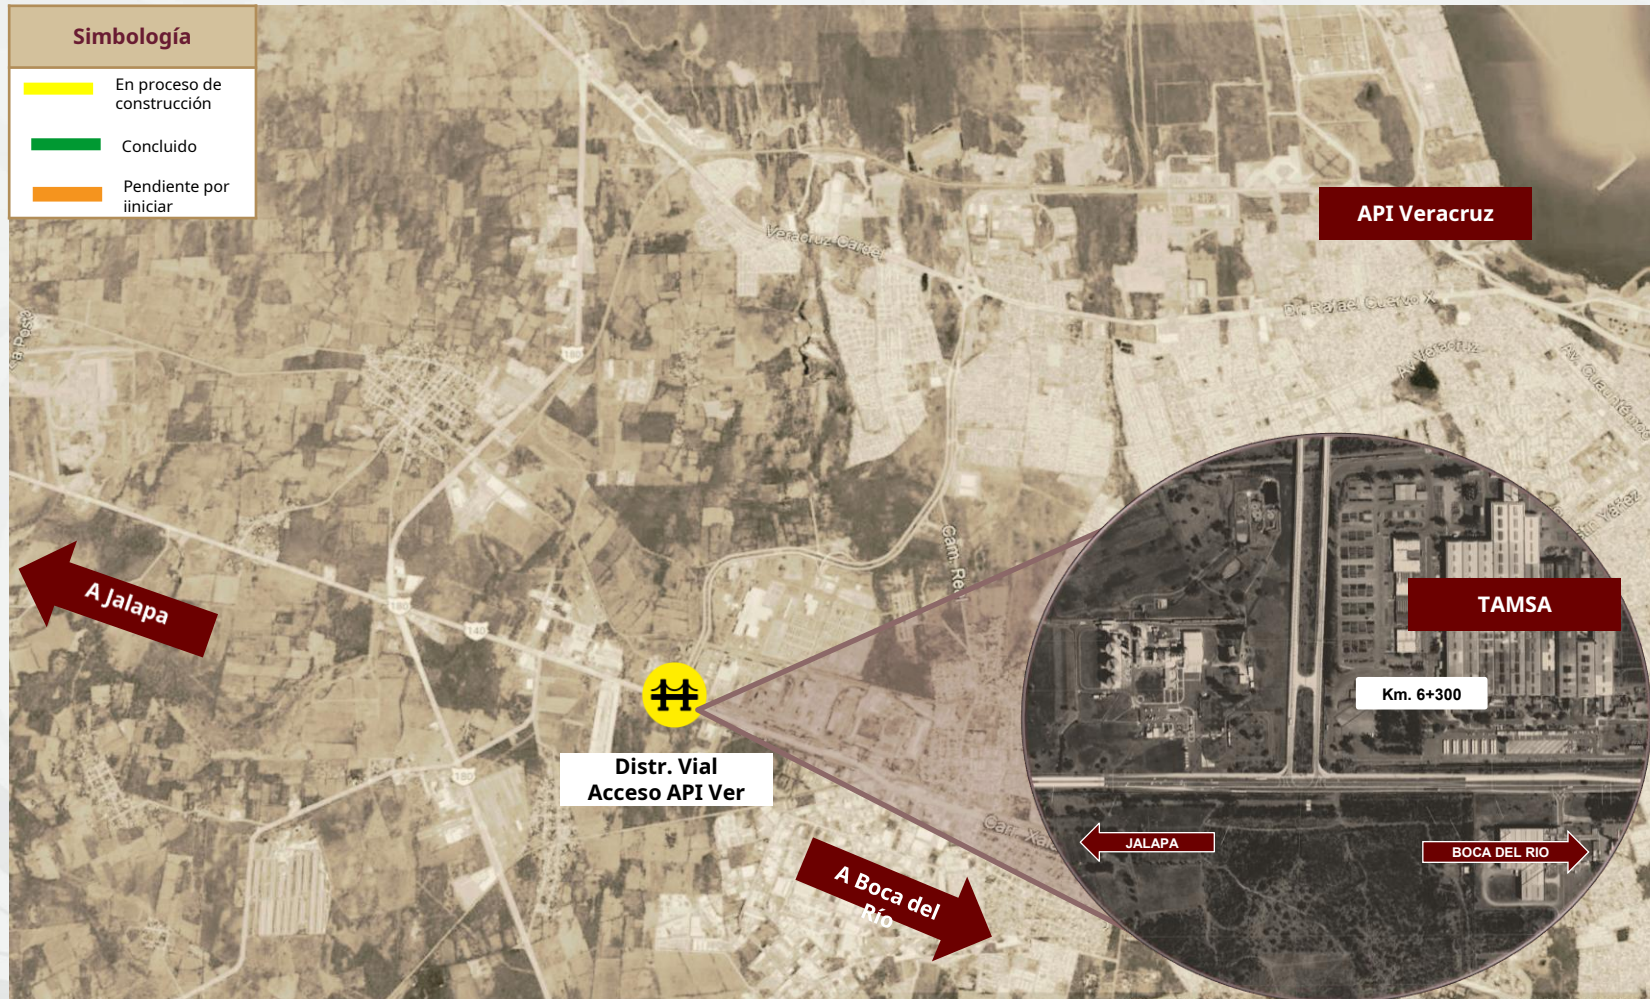

 **Inversión total: 867.3 mdp**
Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km

 **Inversión 2026: 500 mdp**
Meta 2026: 1.18 km de PSV

 **Inicio: 14 de julio de 2025**
Término: junio de 2026

 **780,441 habitantes beneficiados**

 **2,602 empleos generados**

 **25 min ahorro en tiempo**

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 23 al 29/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.09	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	3,718.50	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	2,617.90	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,378	90.0%	153.10	127.60	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	548.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	386.30	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.20	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	8.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	117	88.6%	15	19	9.0	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	85	77.3%	25	14	10.0	
Losa (claro)	pza.	22.00	17	77.3%	5	4	2.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

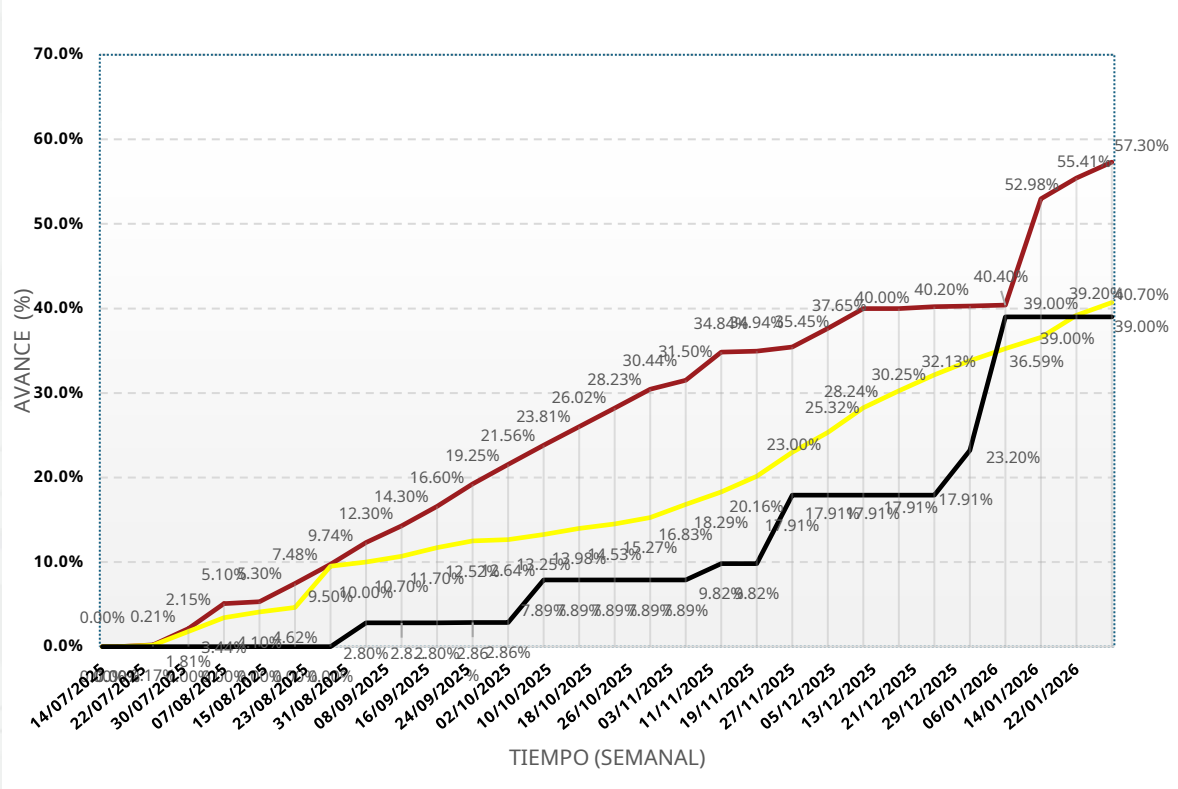

	16 de Enero al 22 de Enero	23 de Enero al 29 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	134	107
Maquinaria	38	39
Frentes de trabajo	5	5
