


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 60.96%
- Real: 42.47%
- Semanal: 0.94%
- Financiero: 39.0%

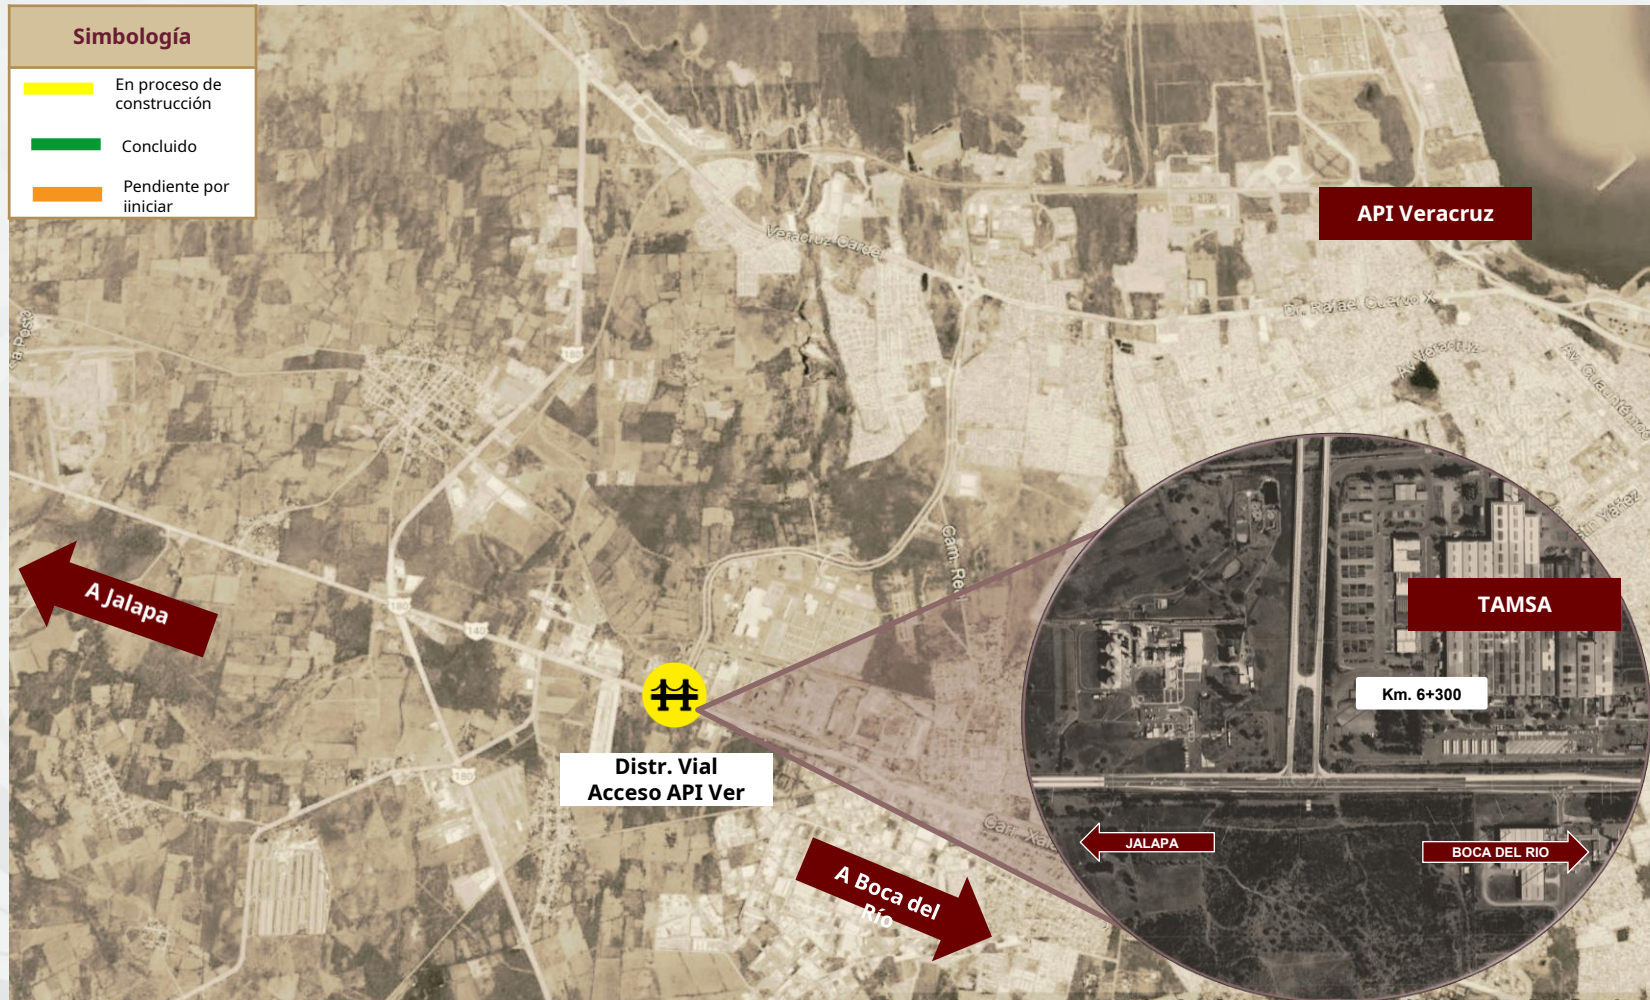

 **Inversión total: 867.3 mdp**
Meta total 2025-2026: 1.97 km

 **Inversión 2025: 367.3 mdp**
Meta 2025: 0.78 km de PSV
Inversión 2026: 500 mdp
Meta 2026: 1.18 km de PSV

 **Inicio: 14 de julio de 2025**
Término meta total: junio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

 **780,441** habitantes beneficiados

 **2,602** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 06 al 12/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.09	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	3,718.50	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	2,617.90	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,377.9	90.0%	153.10	127.60	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	548.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	983.0	0.0%	2,107.00	386.30	888.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.20	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	19	0.0	Concluido en el cpo B
Diafragmas	pza.	110	95	86.4%	15	14	5.0	
Losa (claro)	pza.	22	19	86.4%	3	4	1.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

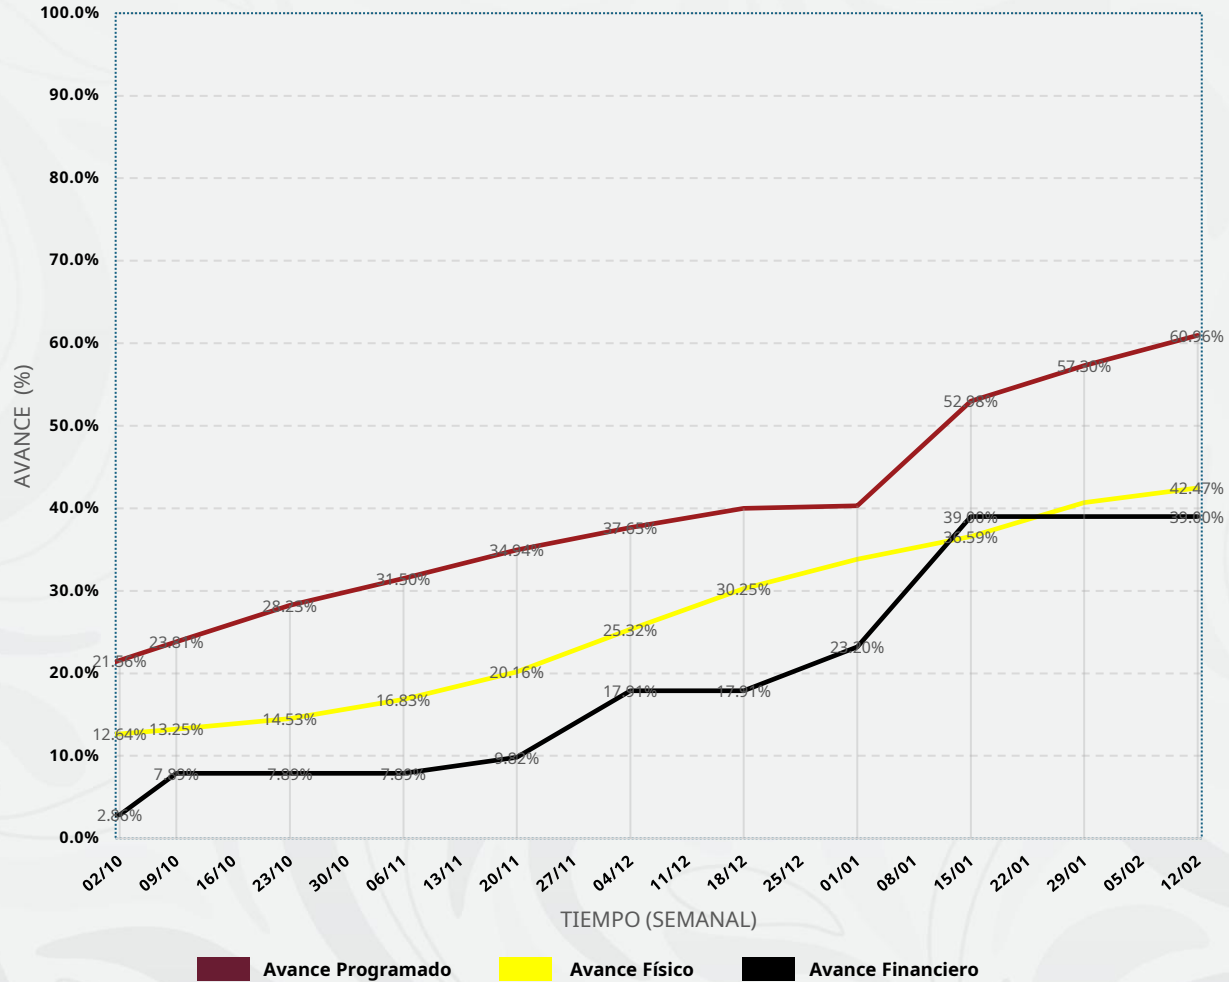

	30 de Enero al 05 de Febrero	06 de Febrero al 12 de Febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	107	105
Maquinaria	39	43
Frentes de trabajo	5	5

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo A (programa 2026)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 06 al 12/02/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.07	0.0	0.0%	4.07	0.00	0	Programa 2026
Despalme	m³	6,292.00	522.0	8.3%	5,770.00	0.00	391	Programa 2026
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0	Programa 2026
Excavaciones	m³	49,951.00	2,126	4.3%	47,825.00	0.00	0	Programa 2026
Terraplenes	m³	36,650.00	0	0.0%	36,650.00	0.00	0	Programa 2026
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,530.00	0	0.0%	1,530.00	0.00	0	Programa 2026
Terraplenes en Rampa	m³	4,385.00	0	0.0%	4,385.00	0	0	Programa 2026
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	0	0	Programa 2026
Paraderos	pza.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Programa 2026
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	104	79%	28	0	1	Programa 2026
Zapatas	pza.	21	0	0.0%	21	0	0	Programa 2026
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
Cabezales	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	0	0	Programa 2026
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0	0	Programa 2026
