

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 66.22%
- Real: 82.40%
- Semanal: 4.17%
- Financiero: 60.13%



Inversión total 2025-2026: 405.0 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 225.0 mdp
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: febrero 2026 (primera etapa)



862,037 Habitantes beneficiados




1,140 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Beneficios: Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

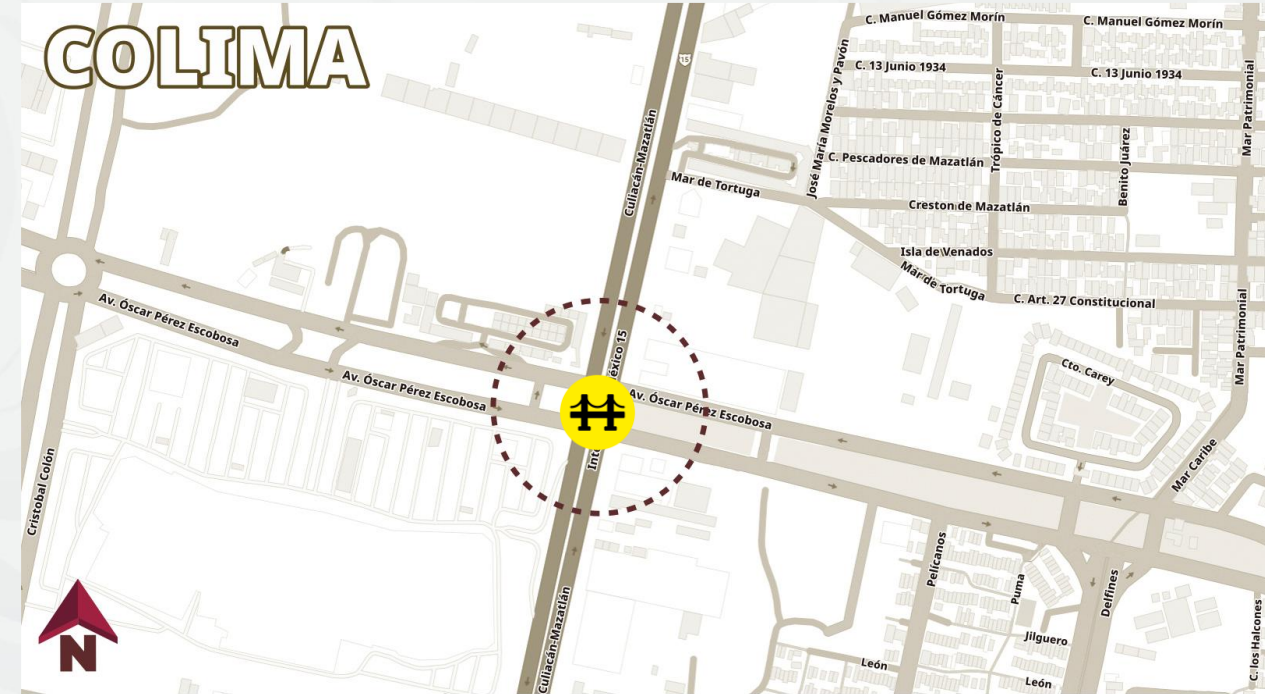


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

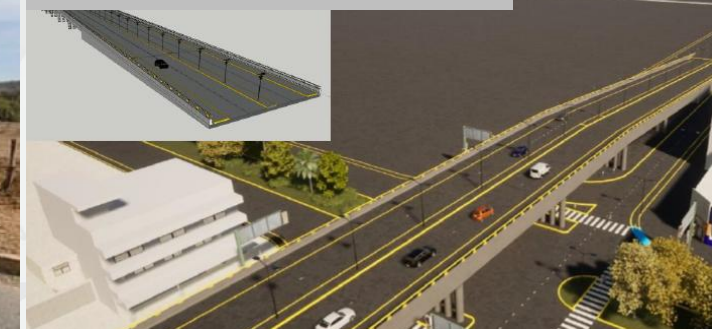

Proyecto


Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

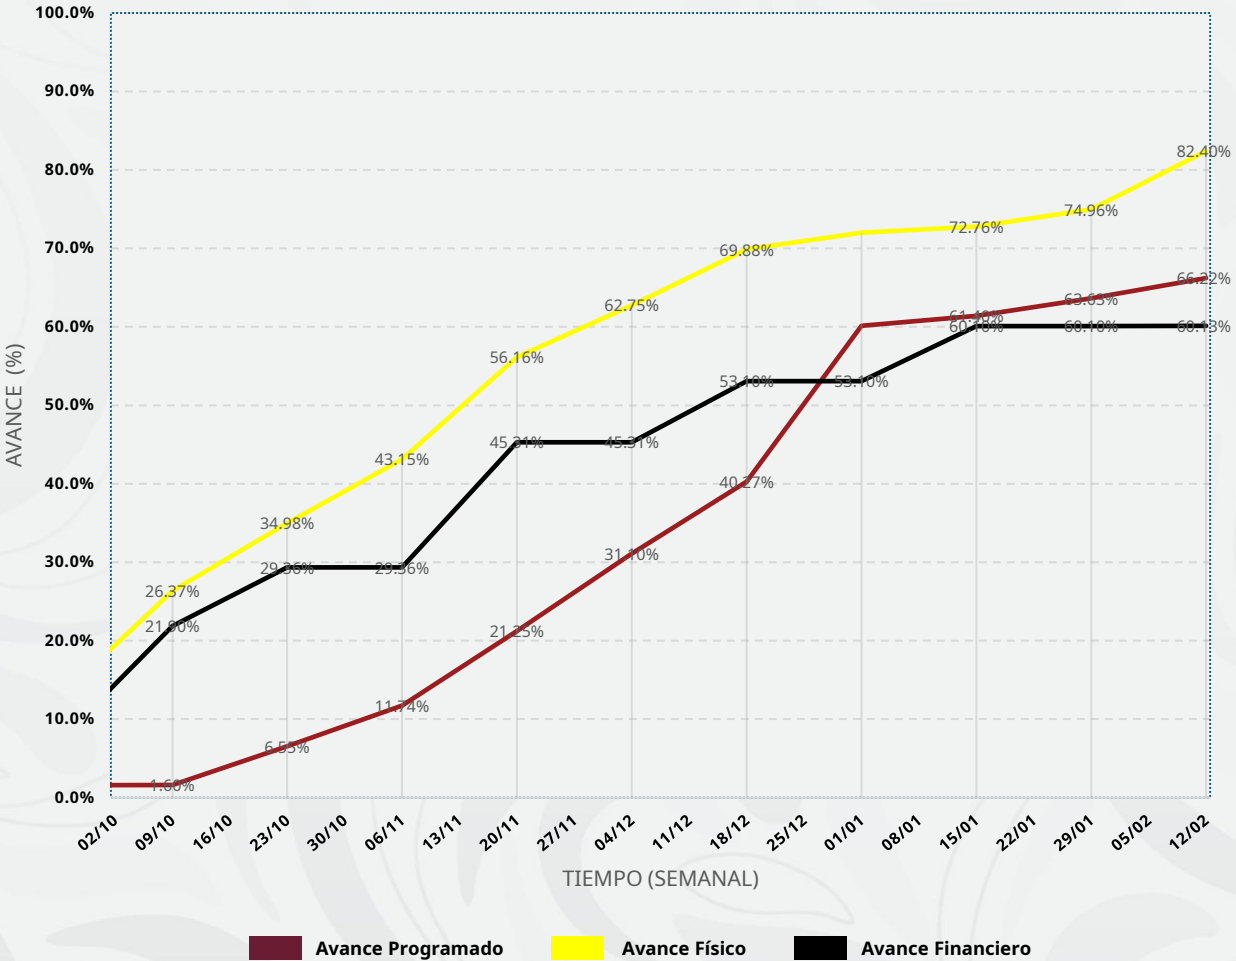

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 06 al 12/02/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes Nebrazka	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	m3	5,266	1,017	19.3%	4,249.0	0.00	0.0	Concluido
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	1.00	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	179.00	106.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.00	310.0	Concluido
Alumbrado	Actividad	2	1.8	90.0%	0.2	0	0.8	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	1	70.0%	0	0	0.7	
Barrera Central	m	587.0	428	72.9%	159.0	0	148.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	1,914.0	38.0%	3,118.00	0	101.0	
Relleno Fluido	m3	3,992.0	957.0	24.0%	3,035.00	0	448.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	

	Del 30 de Enero al 05 de Febrero	Del 06 de Febrero al 12 de Febrero
Personal	138	138
Maquinaria	13	13
Frentes de trabajo	9	9
