

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Avance global

- Programado: 37.65%
- Real: 25.31%
- Semanal: 2.32%
- Financiero: 17.91%

Avance 2025

- Programado: 94.12%
- Real: 63.3%
- Semanal: 0.6%
- Financiero: 45.62%

Convenio de reprogramación SICT 6.29-303-2396-2025

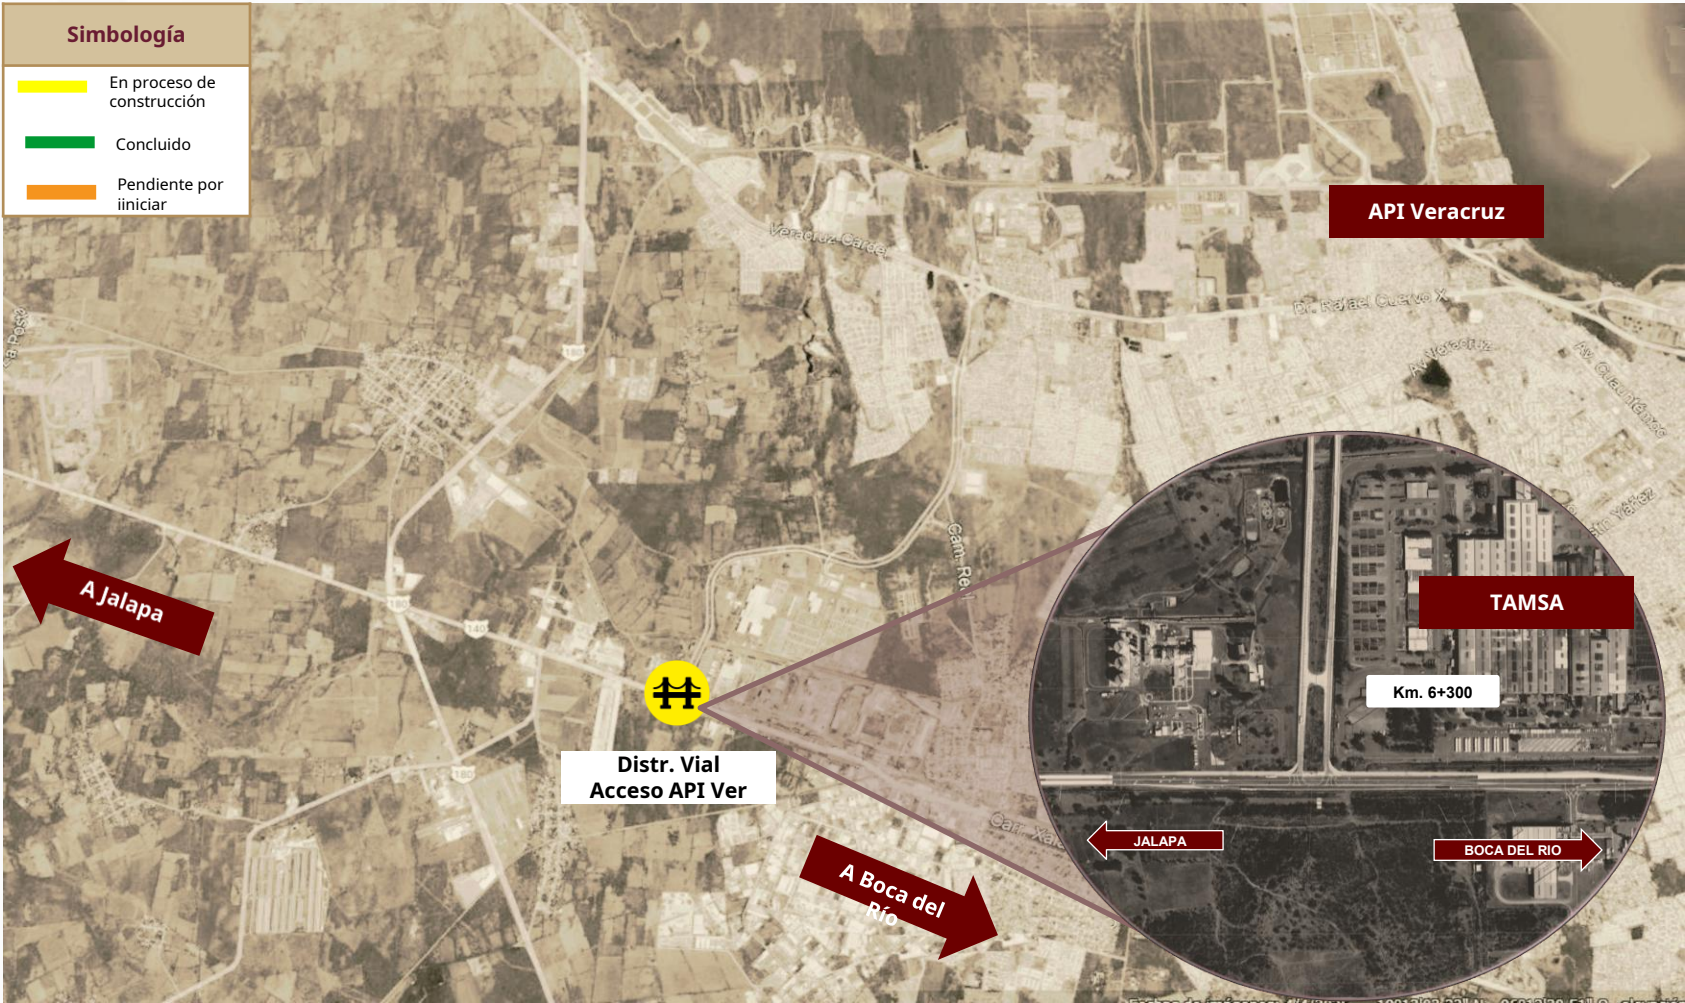

Inversión total 2025-2026: 840 mdp
Inversión 2025: 326 mdp | 0.78 km de PSV
(0.6km de PSV)

Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km

Inicio: 14 de julio de 2025
Término: junio de 2026
Termino meta 2025: Diciembre

780,441 habitantes beneficiados

2,235 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 28 al 04/12/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.50	622.50	622.5	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	15,488.00	1,933.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	24,599.0	67.1%	12,051.00	12,051.00	5,242.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	765.50	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	2,192.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	1,030.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluida la construcción de pilotes del cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluida la construcción de zapatas del cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Se concluyó la construcción de columnas del cpo B
Cabezales	pza.	23	22	95.7%	1	2	1.0	Se tienen 20 cabezales concluidos y 3 cabezales más en proceso
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	60	45.5%	72	24	7.0	Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	42	31.8%	90	11	6	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	20	18.2%	90	14	10	
Losa (claro)	pza.	22.00	4	18.2%	18	4	2	En proceso de colocón de cimbra, el claro 22-23 del cpo B

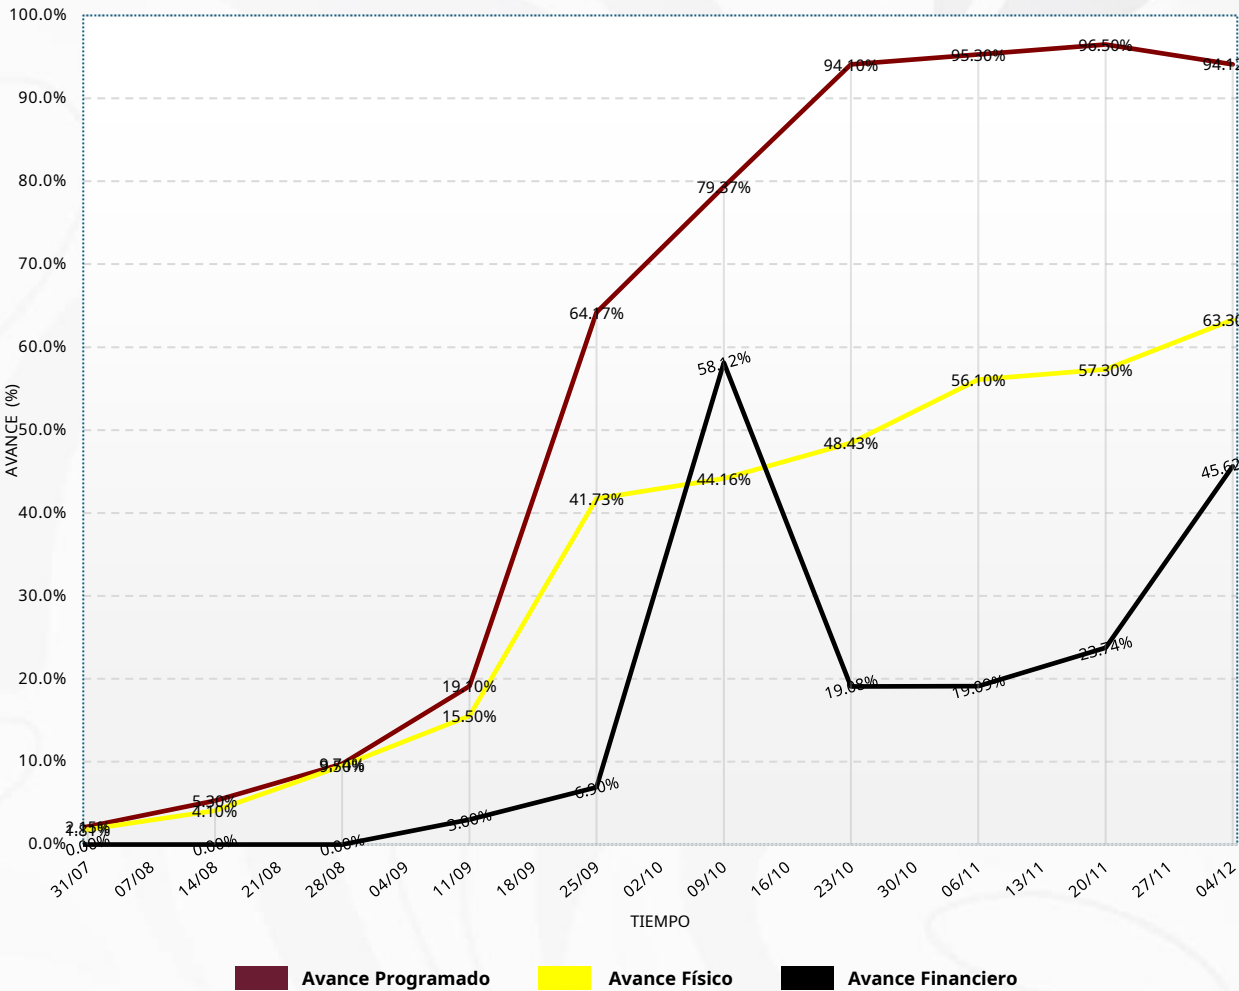

	21 de Noviembre al 27 de Noviembre	28 de Noviembre al 04 de Diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	136	138
Maquinaria	30	33
Frentes de trabajo	6	6
