



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Puente Los Muros

Jojutla, Morelos
8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur
8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

PSV Arco Norte

Colima

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Puente

Alameda Oriente

CDMX

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

PSF Arco Sur

sobre el camino Arco Sur

Colima

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Distribuidor Vial Acceso al Puerto de Veracruz

Veracruz

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Puente Amado Nervo (Federación) Km 15+680

Nayarit - Jalisco
8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Distribuidor Vial

Santa Ana

Tlaxcala

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Puente

El Chical

Colima

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Presa Las Trancas

Colima

8 de Diciembre, 2025



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Paso Superior C.F. MEX 15

Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

8 de Diciembre, 2025

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa

- Avance global

- Programado: 31.1%
 - Real: 62.75%

- Semanal: 1.8%
 - Financiero: 45.31%
- Avance 2025

- Programado 90.0%
 - Real: 96.5%

- Semanal: 2.73%
 - Financiero: 80.67%

- 

Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp

Inversión 2025: 200.0 mdp | (65% de PSV)

Se ejecuta mayor porcentaje del PSV este año
- 

Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
- 

Inicio: 18 de agosto de 2025


Término: abril 2026

Término meta 2025: Diciembre
- 

862,037 Habitantes beneficiados
- 

1,140 empleos generados
- 

20 min ahorro en tiempo

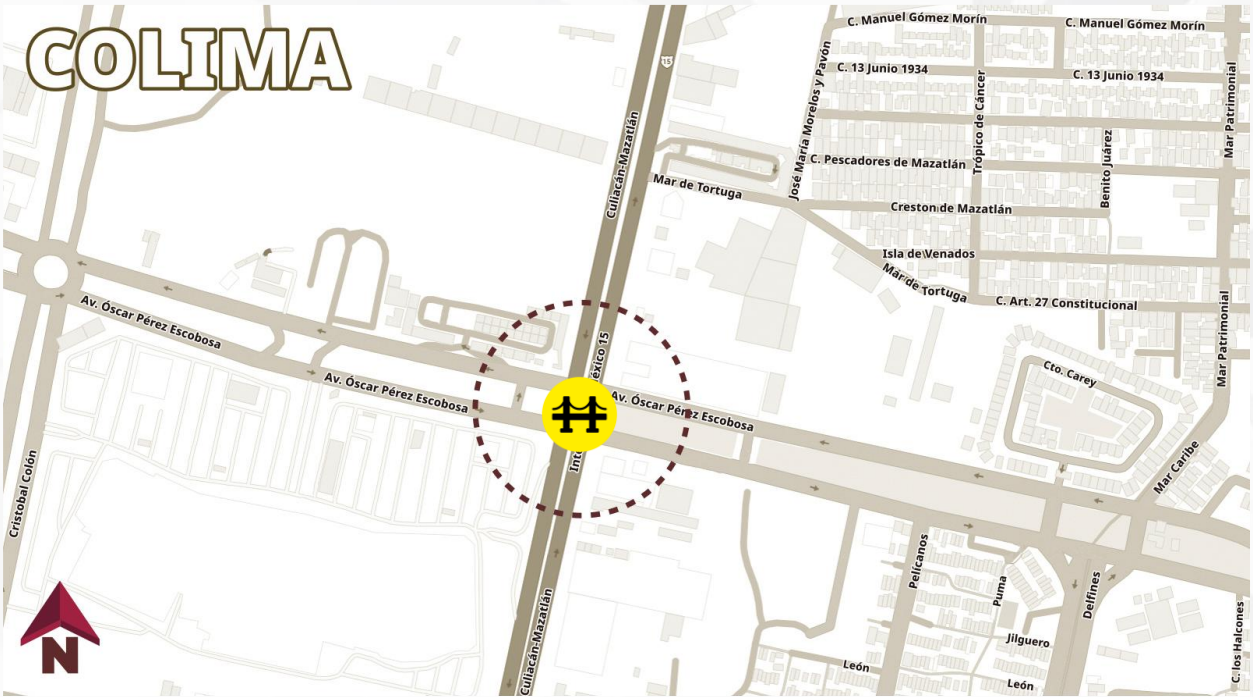


Empresas	
• Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.	
• Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.	

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 28 al 04/12/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes AASHTO IV								
Superestructura	pieza	77	77	100.0%	0	2	8.0	
Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	11	11	100.0%	0	1	2.0	
Superestructura								
Fabricación de Trabes Nebrazka	pieza	11	1	9.1%	10	3	1.0	Se continúan los trabajos de fabricación
Superestructura	pieza	11	1	9.1%	10	3	1.0	Se continúan los trabajos de fabricación
Montaje de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	1	9.1%	10	3	1.0	Se continúan los trabajos de fabricación
Muro Mecánicamente estabilizado	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
(Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,032.0	75.6%	333	227.5	185.0	Se continúan trabajos de colocación de escamas
Muro Mecánicamente estabilizado								
(Colocacion de Escamas)	m3	12,940	4,960	38.3%	7,980	1,091.3	755.6	Se continua con los trabajos de relleno
Muro Mecánicamente estabilizado								
Relleno	pieza	4	0	0.0%	4	0	0.0	Se inició con el armado de acero de refuerzo
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0	0.0	Se inició con el armado de acero de refuerzo
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulilca	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

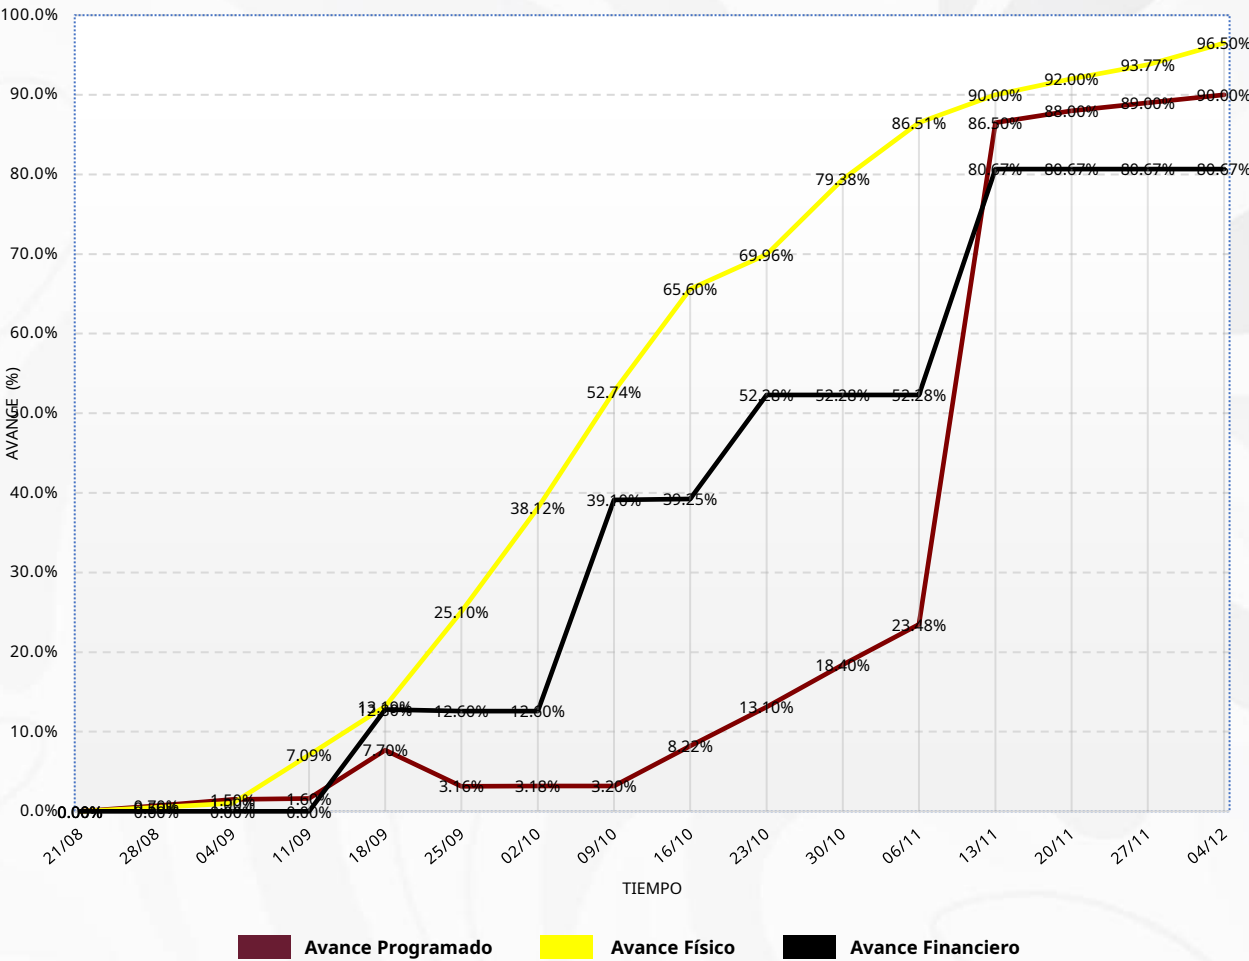

	Del 21 de noviembre al 27 de noviembre	Del 28 de noviembre al 04 de Diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	171	171
Maquinaria	32	32
Frentes de trabajo	8	11
