

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 25.52%

• Real: 31.30%

• Semanal: 1.30%

• Financiero: 15.20%

Avance 2025

• Programado: 100.00%

• Real: 100.00%

• Semanal: 9.29%

• Financiero: 100.00%

 Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 Inicio: 16 de julio de 2025

Término: mayo de 2026


Termino meta 2025: 31 de diciembre

 73,215 habitantes beneficiados

 1,950 empleos generados

 20 min ahorro en tiempo

• **Nota:** La meta establecida para el 2025 (14 % de Distribuidor) ya se cumplió, sin embargo se siguen ejecutando trabajos que aumentan la meta global.

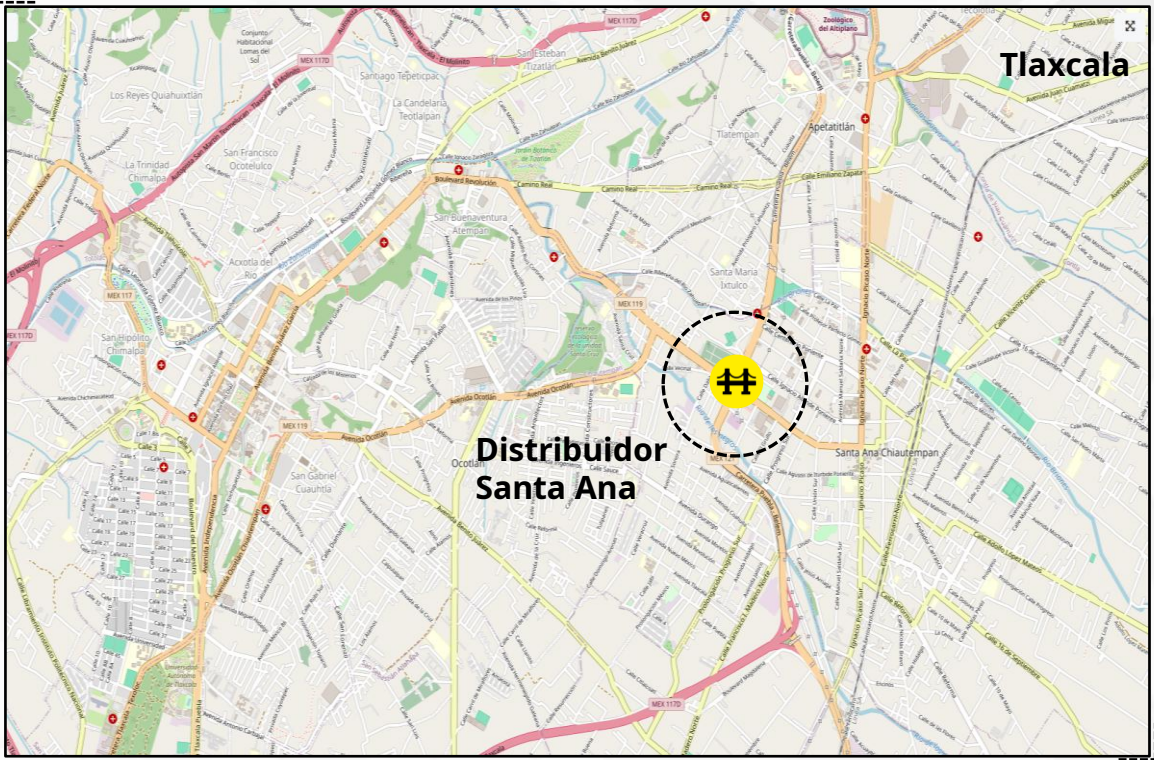


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

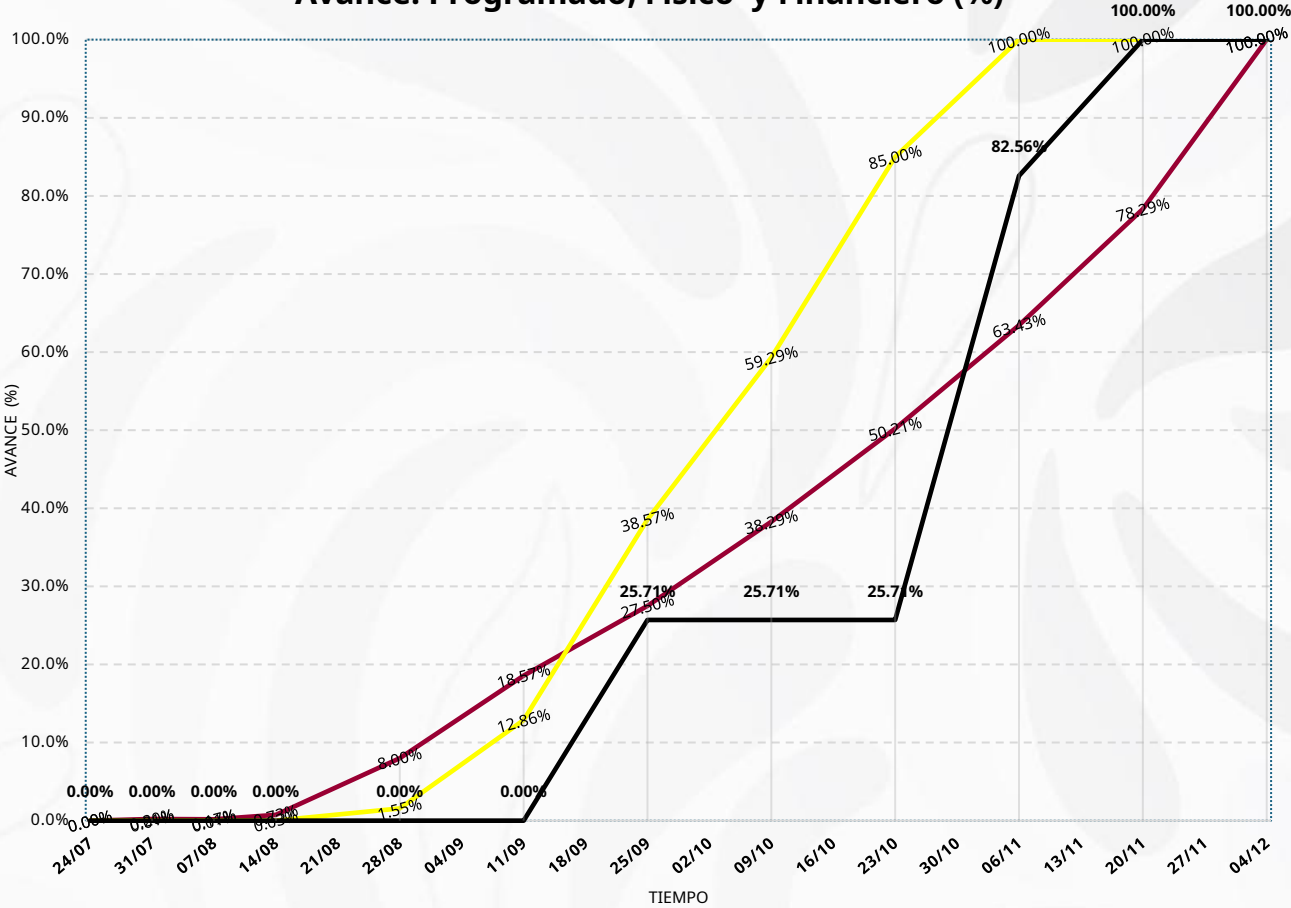

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	21 al 27 de noviembre	28 al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	114	115
Maquinaria	13	12
Frente de trabajo	16	14

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	28 al 04-12-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	31.30% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.52%	1.30%	Se trabaja en zapatas de los ejes #9; así como columnas #4,5 y 7 al #10.
