

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 31.42%
- Real: 53%
- Semanal: 7.96%
- Financiero: 26.30%

Avance 2025

- Programado: 67.96%
- Real: 100.0%
- Semanal: 2.57%
- Financiero: 55.12%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp
Inversión 2025: 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km **(46% del puente (cimentación y subestructura))**

 **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

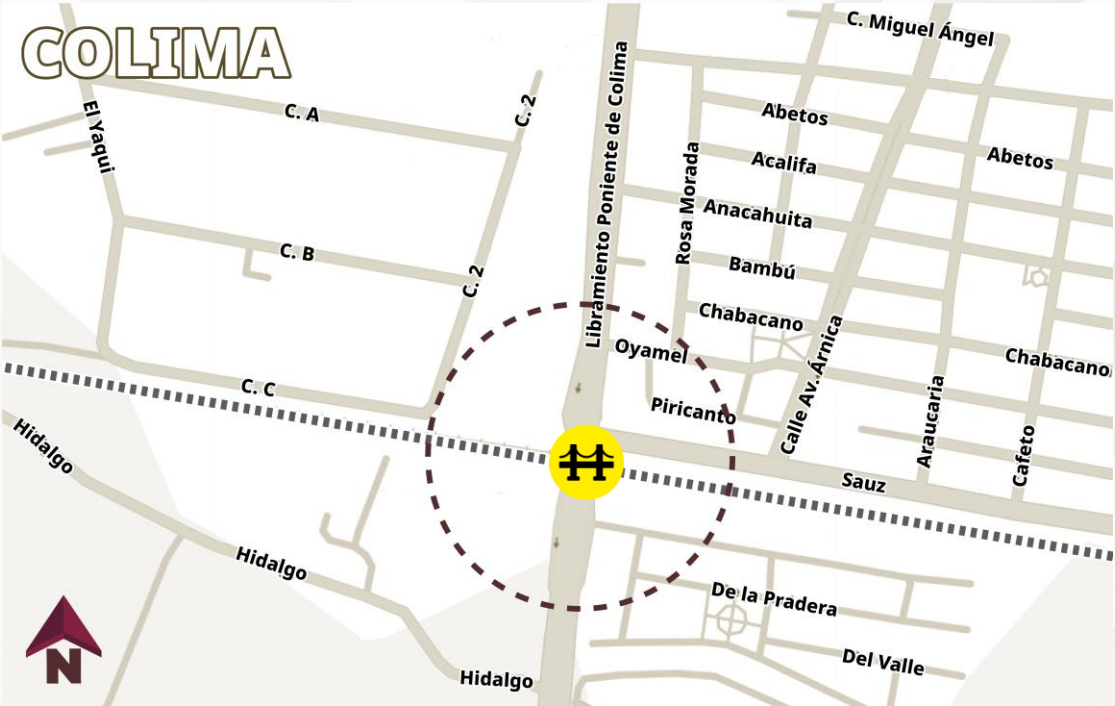

PSF Arco Sur


Colima



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

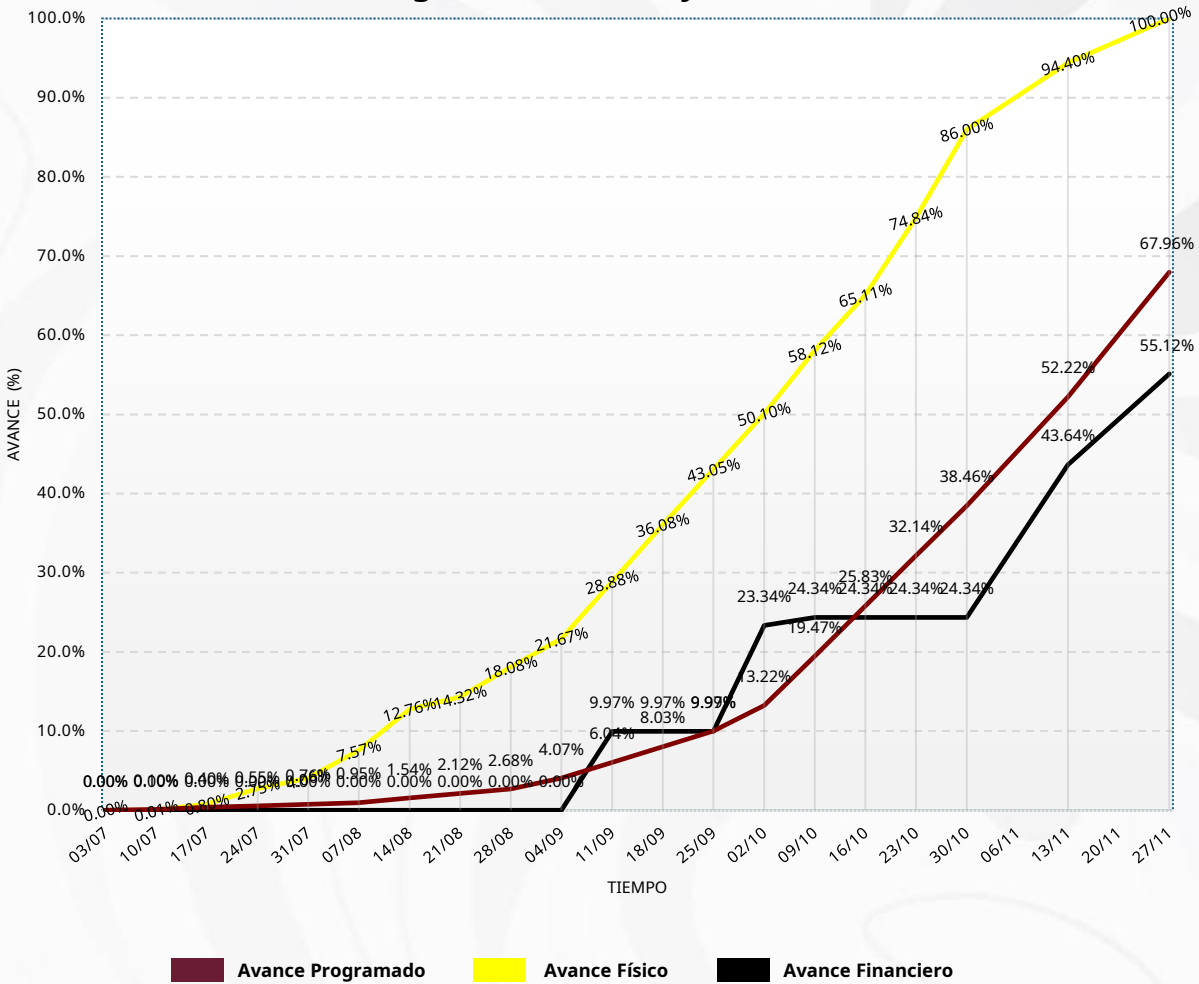

	14 de al 20 de noviembre	21 de al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	268	268
Maquinaria	45	45
