

Puente El Chical

Colima


Avance global

- Programado: 16.08 %
- Real: 59 %
- Semanal: 25.99 %
- Financiero: 19.50 %

Avance 2025

- Programado: 70.55 %
- Real: 100.00 %
- Semanal: 25.53 %
- Financiero: 85.52 %

-  **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp
-  **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente
-  **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025
-  **4,053** habitantes beneficiados
-  **330** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

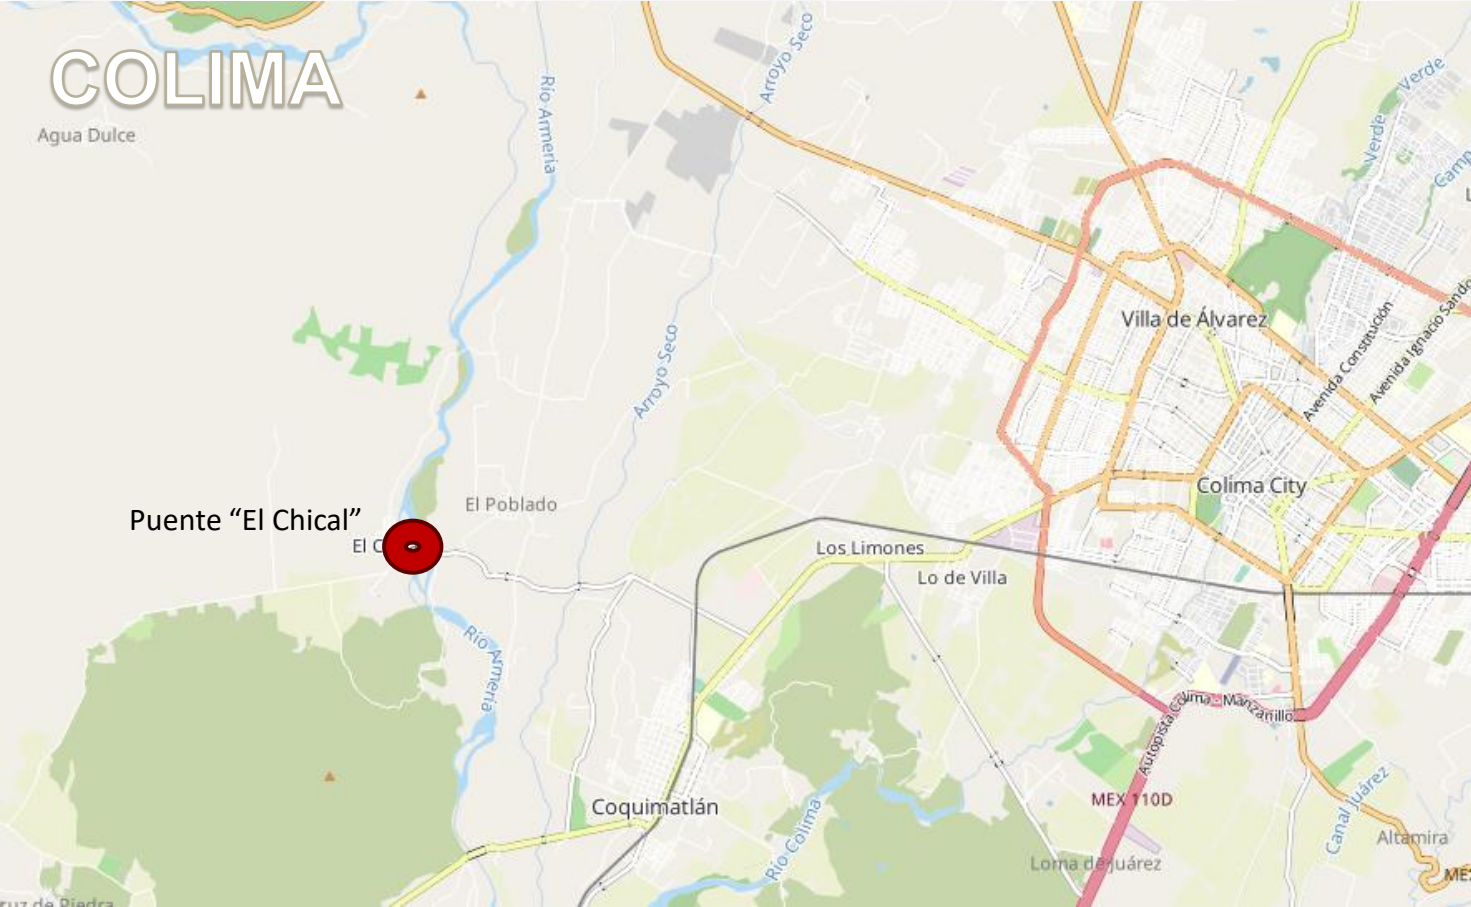


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

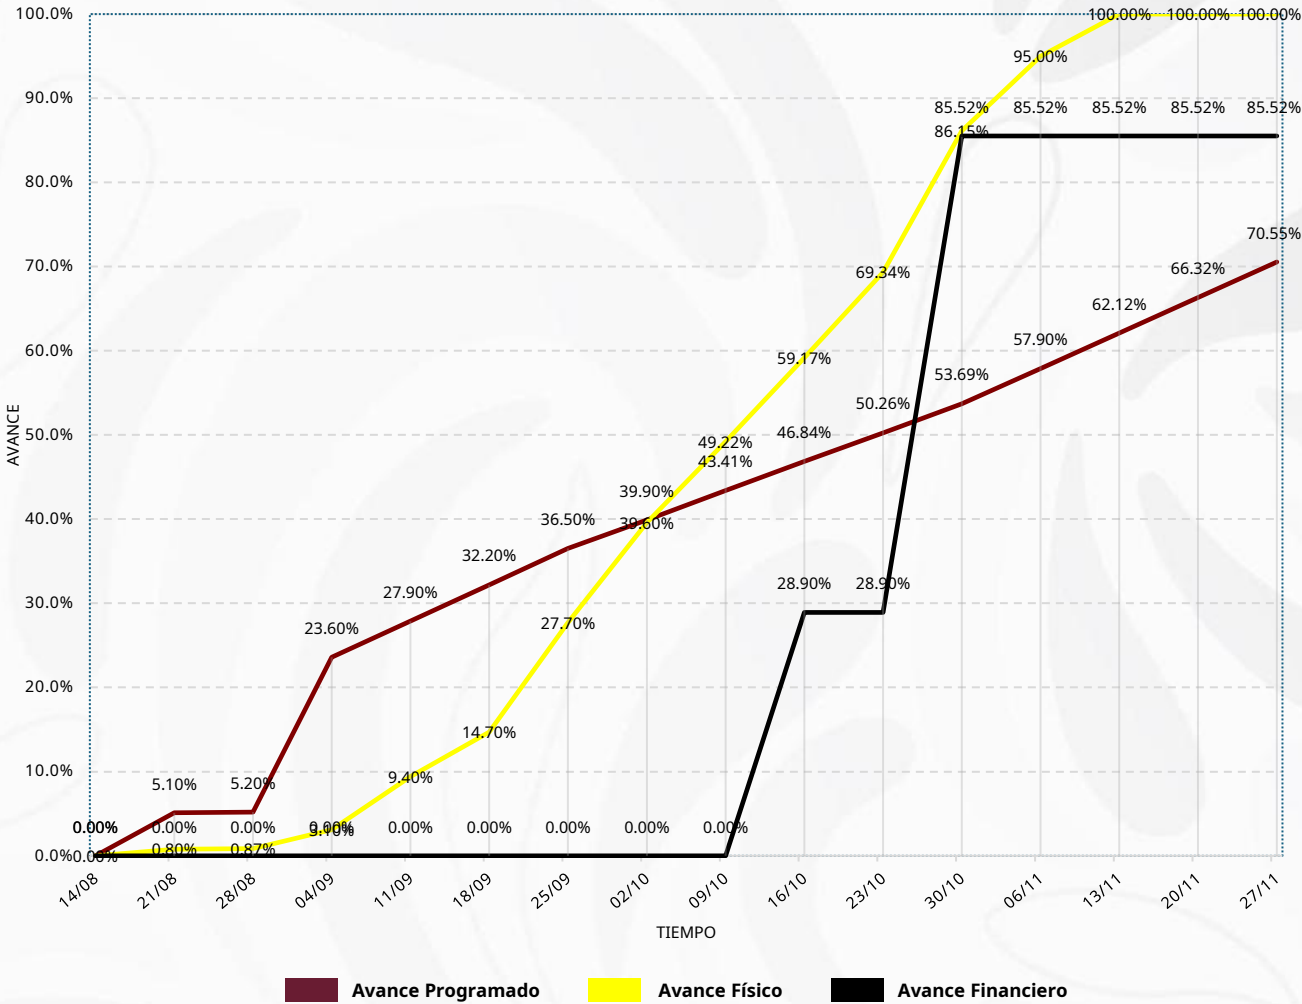

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25	
				Programado	Ejecutado
Resumen de Obra					
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	3.0	0.0
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	3.0	0.0
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	9.0	1.0	1.0	2.0
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	30.0	15.0	5.0	15.0
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	112,950.0	12,050.00	9,000	13,100

	14 de Noviembre al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 27 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	33	31
Maquinaria	6	5
