

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 39.24%
- Real: 33.0%
- Semanal: 12.84%
- Financiero: 17.91%

Avance 2025

- Programado: 98.0%
- Real: 63.9%
- Semanal: 6.6%
- Financiero: 45.62%

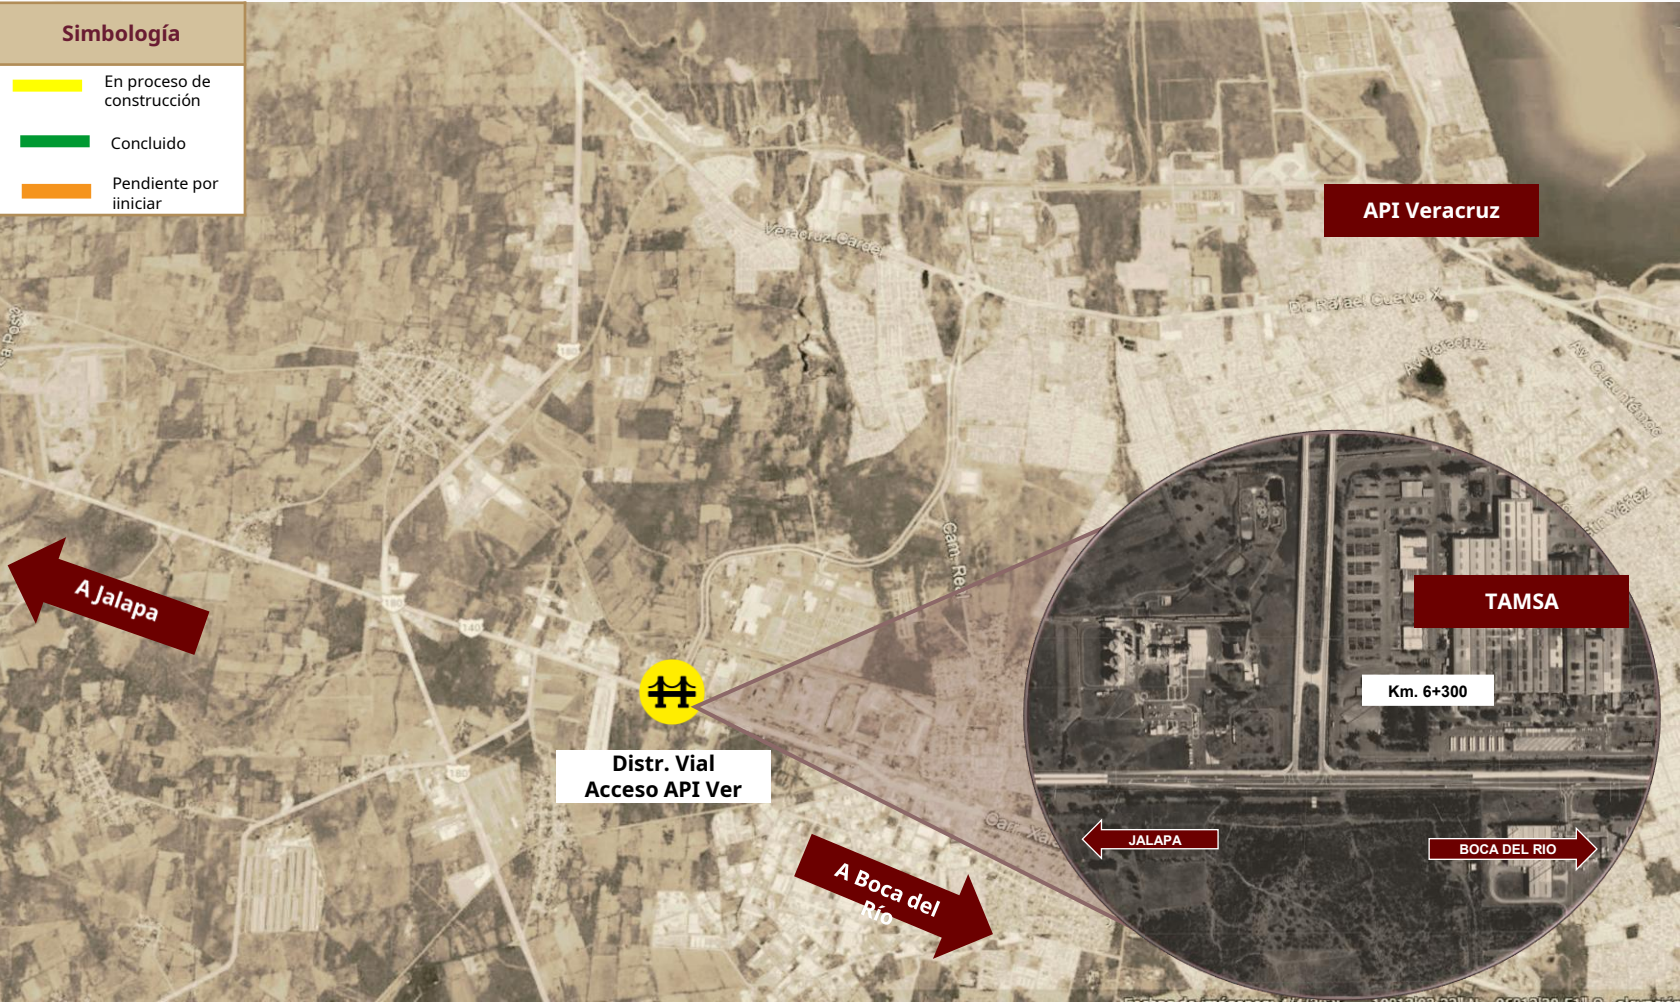

Inversión total 2025-2026: 840 mdp
Inversión 2025: 326 mdp | 0.78 km de PSV
(0.6km de PSV)



Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: junio de 2026
Termino meta 2025: Diciembre



780,441 habitantes beneficiados



2,235 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 21 al 27/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	6,590.0	91.4%	623.00	623.00	345.0	Continua el despalme en cuerpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	34,638.0	66.5%	17,421.00	17,421.00	2,220.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	19,357.0	52.8%	17,293.00	8,646.50	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	510.30	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	1,461.30	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	618.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0	Concluida la construcción de pilotes del cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0	Concluida la construcción de zapatas del cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0	Se concluyó la construcción de columnas del cpo B
Cabezales	pza.	23	21	91.3%	2	2	1	Se tienen 20 cabezales concluidos y 3 cabezales más en proceso
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	53	40.2%	79	20	10	Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	36	27.3%	96	20	24	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	10	9.1%	100	17	5	
Losa (claro)	pza.	22.00	2	9.1%	20	2.5	2	En proceso de colocón de cimbra, el claro 22-23 del cpo B

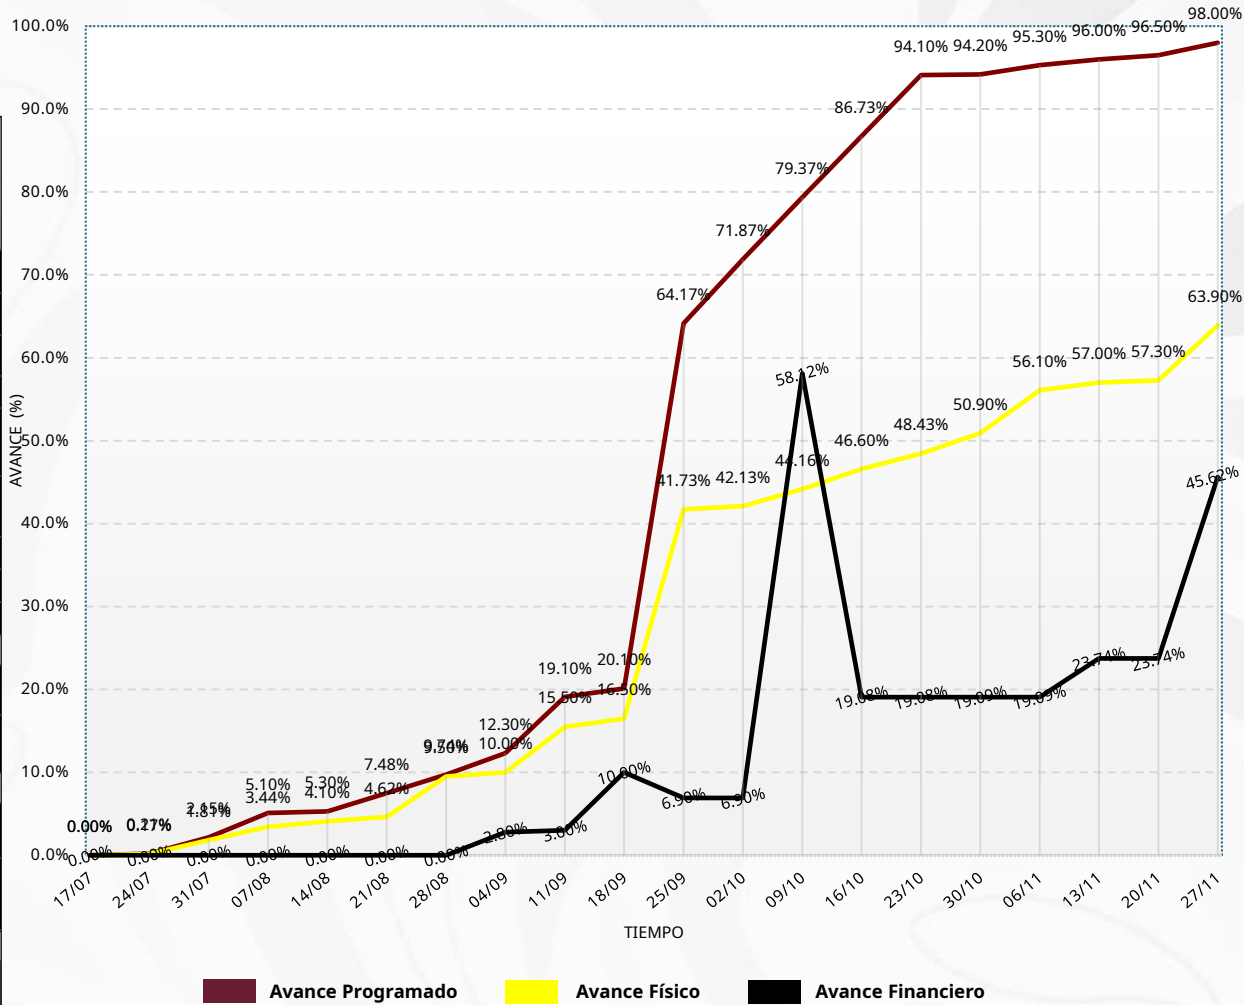

	14 de Noviembre al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 27 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	128	136
Maquinaria	27	30
