

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 26.17%
- Real: 60.95%
- Semanal: 4.8%
- Financiero: 45.31%

Avance 2025

- Programado 89.0%
- Real: 93.77%
- Semanal: 1.77%
- Financiero: 80.67%



Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (65% de PSV) (50% de PSV)
Se ejecuta mayor porcentaje del PSV este año



Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: abril 2026
Término meta 2025: Diciembre




862,037 Habitantes beneficiados



1,140 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

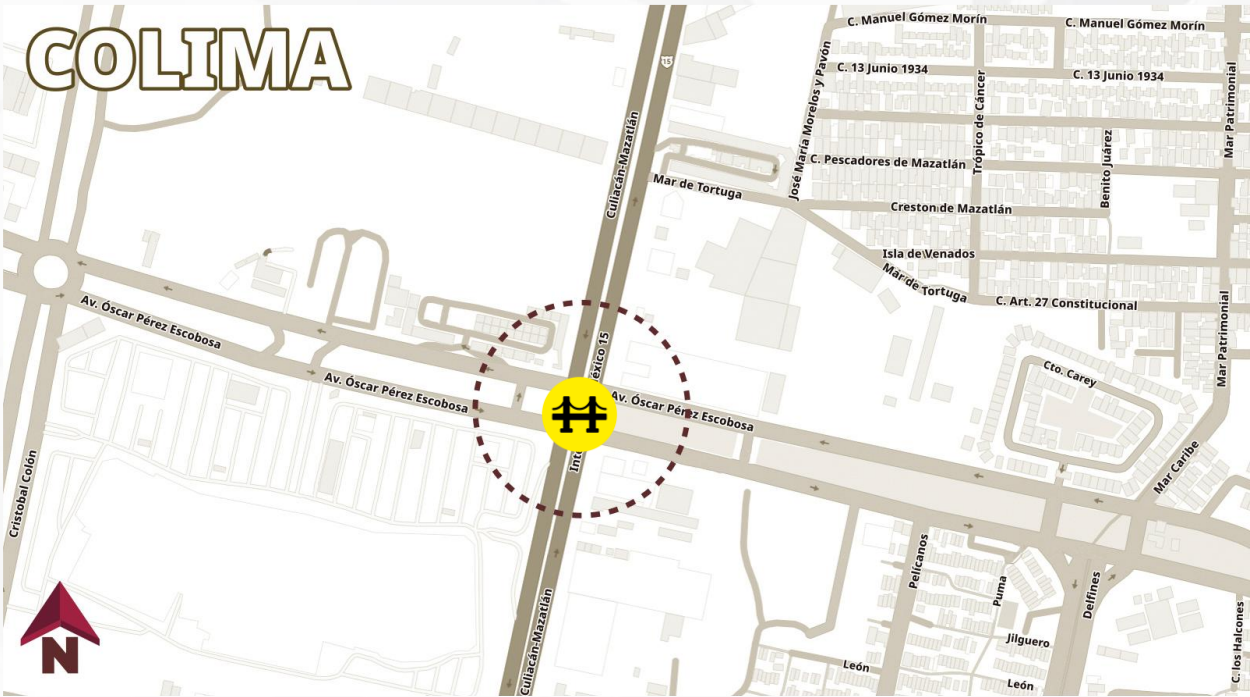


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

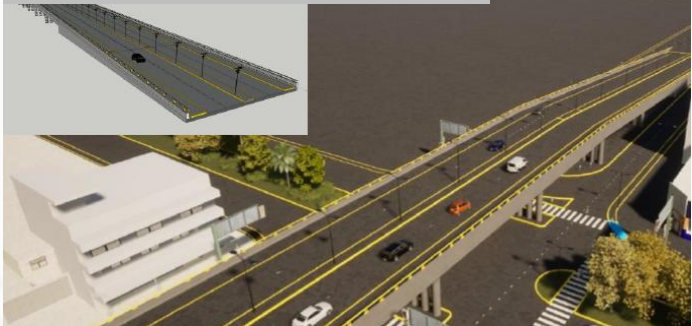

Proyecto

Empresas


- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 21 al 27/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Se continua trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Se concluye la construcción de los
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.5	Se tiene un total de 38 columnas concluidas
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0	8	Se tiene un total de 42 trabes AASHTO IV
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	69	89.6%	8	2	14	
Superestructura Fabricación de Trabes Nebraska	pieza	11	9	81.8%	2	1	3	
Superestructura Montaje de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	0	0.0%	11	3	0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0	Concluyó la fabricación de escamas
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	847.0	62.1%	518	227.5	338.0	
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	4,205	32.5%	8,736	1,091.3	1,713.5	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

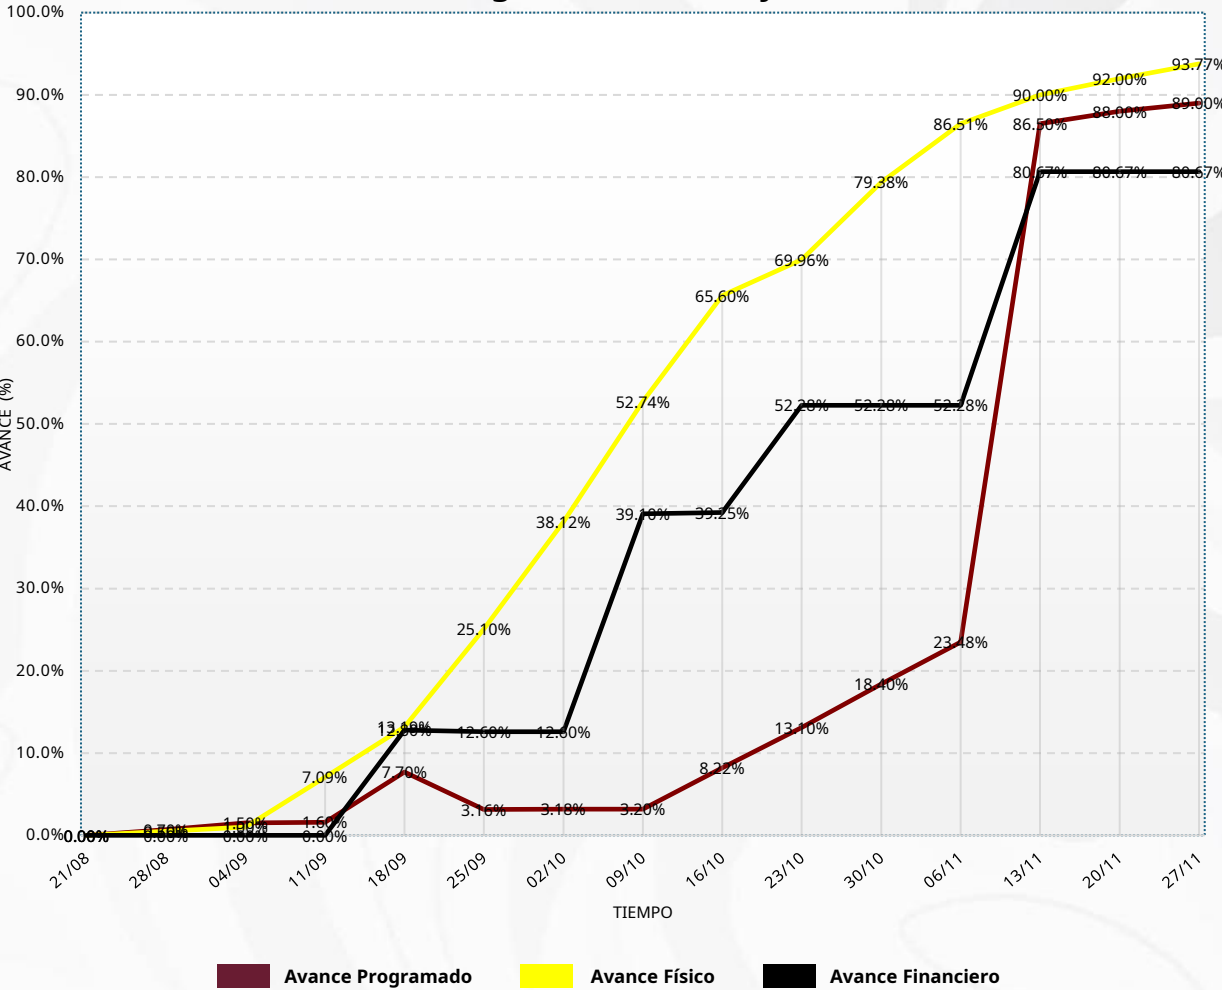

	Del 14 de noviembre al 20 de noviembre	Del 21 de noviembre al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	178	171
Maquinaria	31	32
