

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

- Avance global

• Programado: 25.00%

• Real: 30%

• Semanal: 12.4%

• Financiero: 15.20%
- Avance 2025

• Programado: 85.71%

• Real: 100.00%

• Semanal: 22.14%

• Financiero: 100.00%
- Nota:

La meta establecida para el 2025 (14 % de Distribuidor) ya se cumplió, sin embargo se siguen ejecutando trabajos que aumentan la meta global.

- 

Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial
- 

Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)
- 

Inicio: 16 de julio de 2025

Término: Mayo de 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre




73,215 habitantes beneficiados



1,950 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

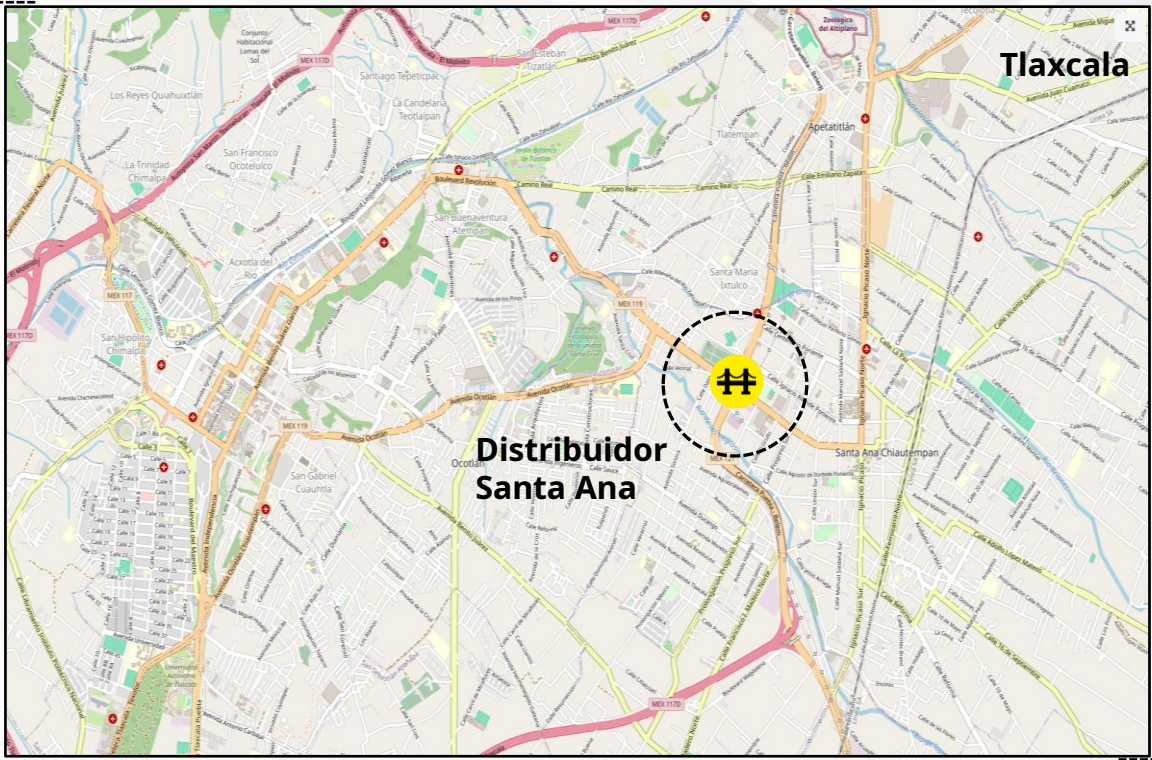


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

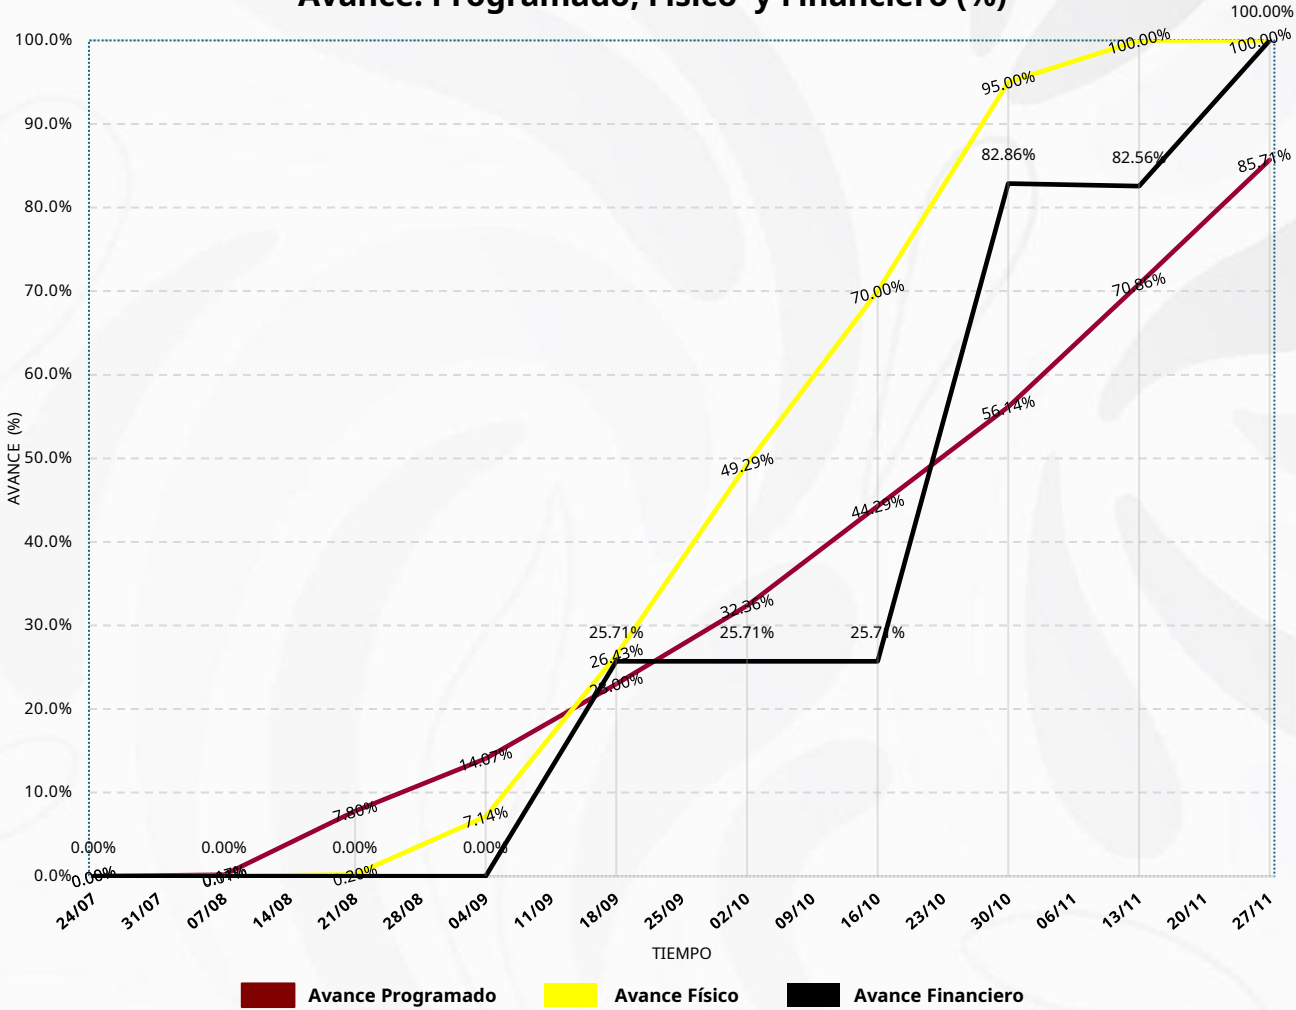

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	21 al 27-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	20.70% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	1.04%	3.10%	Se trabaja en zapatas de los ejes #4,5 y 7; así como columnas #9 al #12.

	14 al 20 de noviembre	21 al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	115	114
Maquinaria	15	13
