

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 16.32%
- Real: 52.26%
- Semanal: 9.11%
- Financiero: 45.31%

Avance 2025

- Programado 86.5%
- Real: 90.0%
- Semanal: 3.5%
- Financiero: 80.67%



Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (50% de PSV)



Meta total: PSV | 0.811 km longitud total



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: Agosto 2026
Término meta 2025: Diciembre




862,037 Habitantes beneficiados



1,140 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

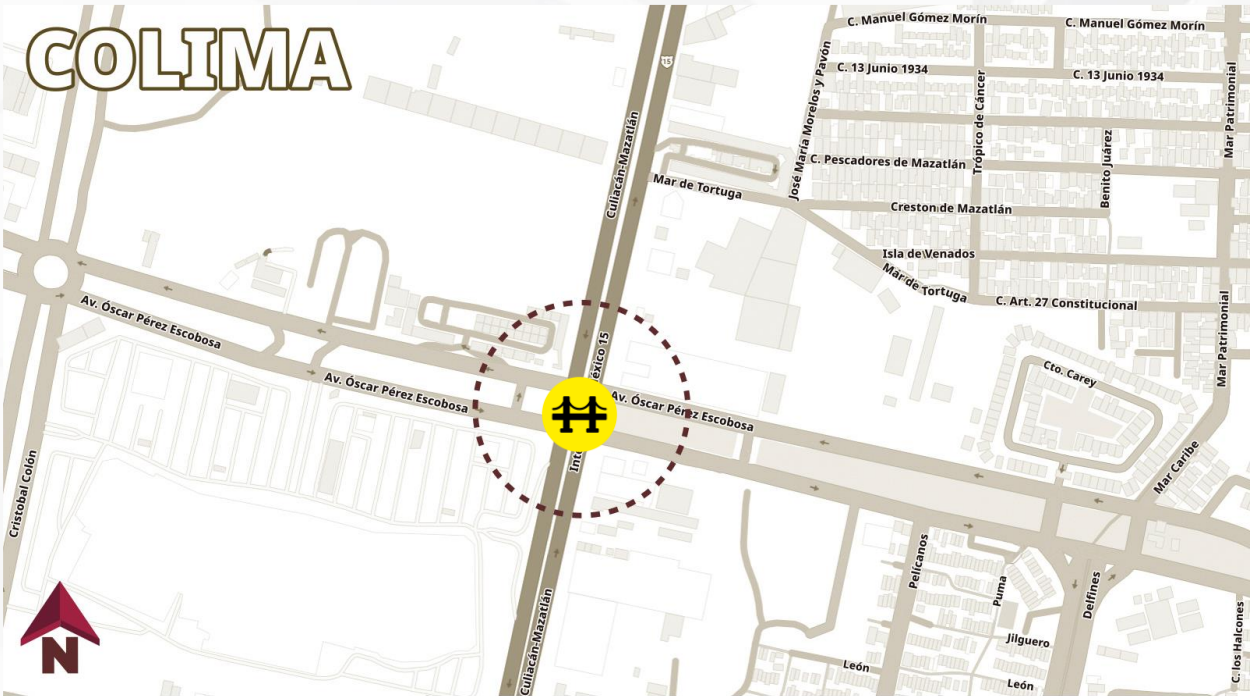


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

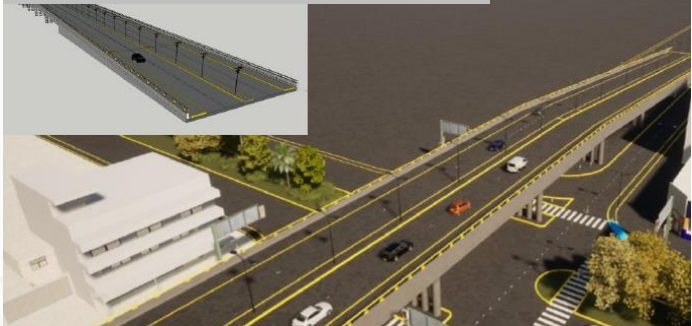

Proyecto

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 07 al 13/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Se continúan trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.00	0.0	Se concluye la construcción de los
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	8.3	92.2%	0.7	0.35	1.3	Se tiene un total de 30 columnas concluidas
Superestructura	Actividad	77	61	79.2%	16	8	19.0	Se tiene un total de 42 trabes AASHTO IV
Fabricación de Trabes AASHTO IV	pieza	77	39	50.6%	38	6.3	15.0	
Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	11	3	27.3%	8	1.6	2.0	
Fabricación de Trabes Nebraska	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Montaje de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Fabricación de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Se concluyó la fabricación de las
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocación de Escamas)	m2	1,365	416.0	30.5%	949	86.3	0.0	Inicio la colocación de escamas
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	979	7.6%	11,961	1,495.1	0.0	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0.0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

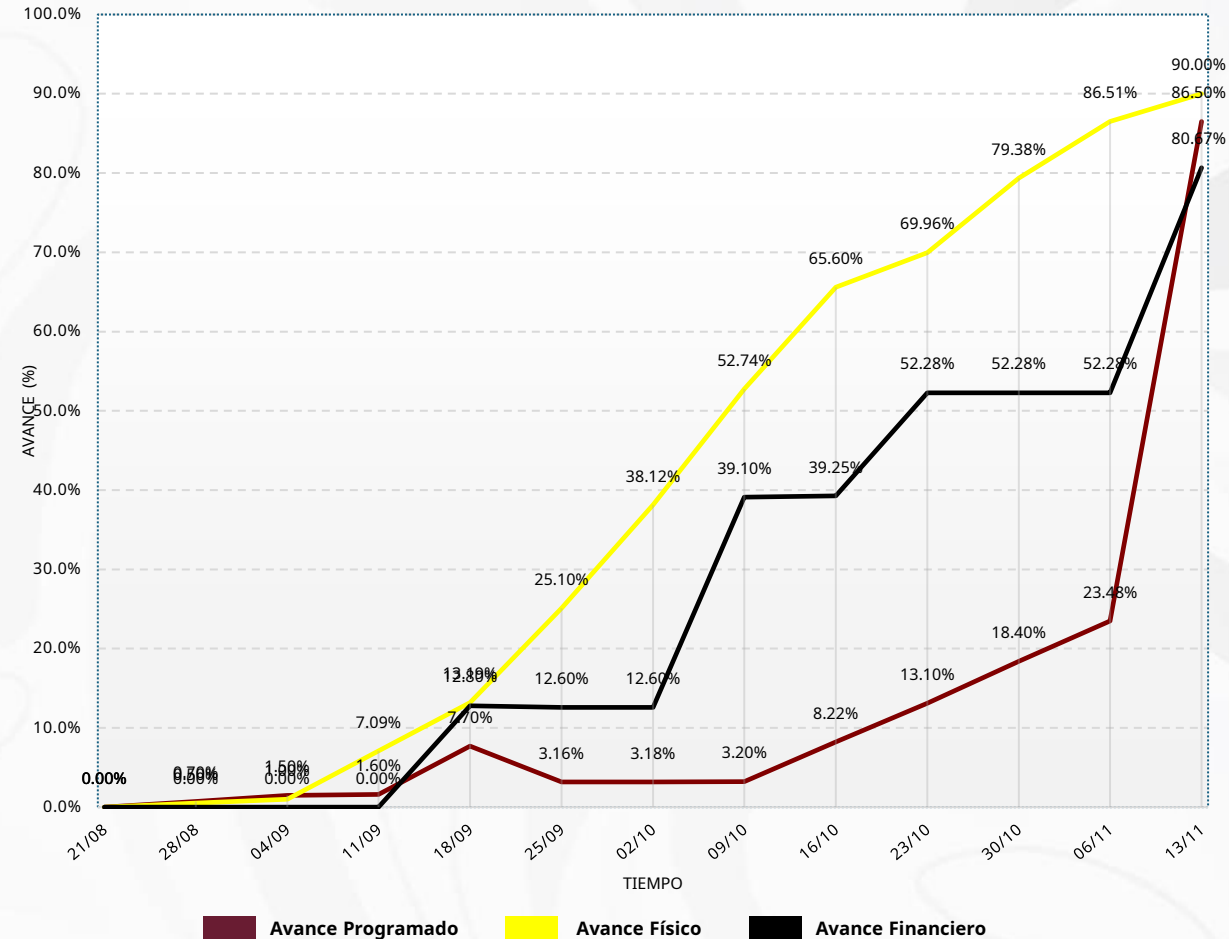

	Del 31 de octubre al 06 de noviembre	Del 07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	181	178
Maquinaria	27	31
