

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 9.92%

• Real: 15.80%

• Semanal: 1.80%

• Financiero: 11.60%

Avance 2025

• Programado: 70.86%

• Real: 100.00%

• Semanal: 0.00%

• Financiero: 82.56%

• **Nota:** La meta establecida para el 2025 (14 % de Distribuidor) ya se cumplió, sin embargo se siguen ejecutando trabajos que aumentan la meta global.



Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial



Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inicio: 16 de julio de 2025

Término: 31 de diciembre de 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre



73,215 habitantes beneficiados




1,950 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

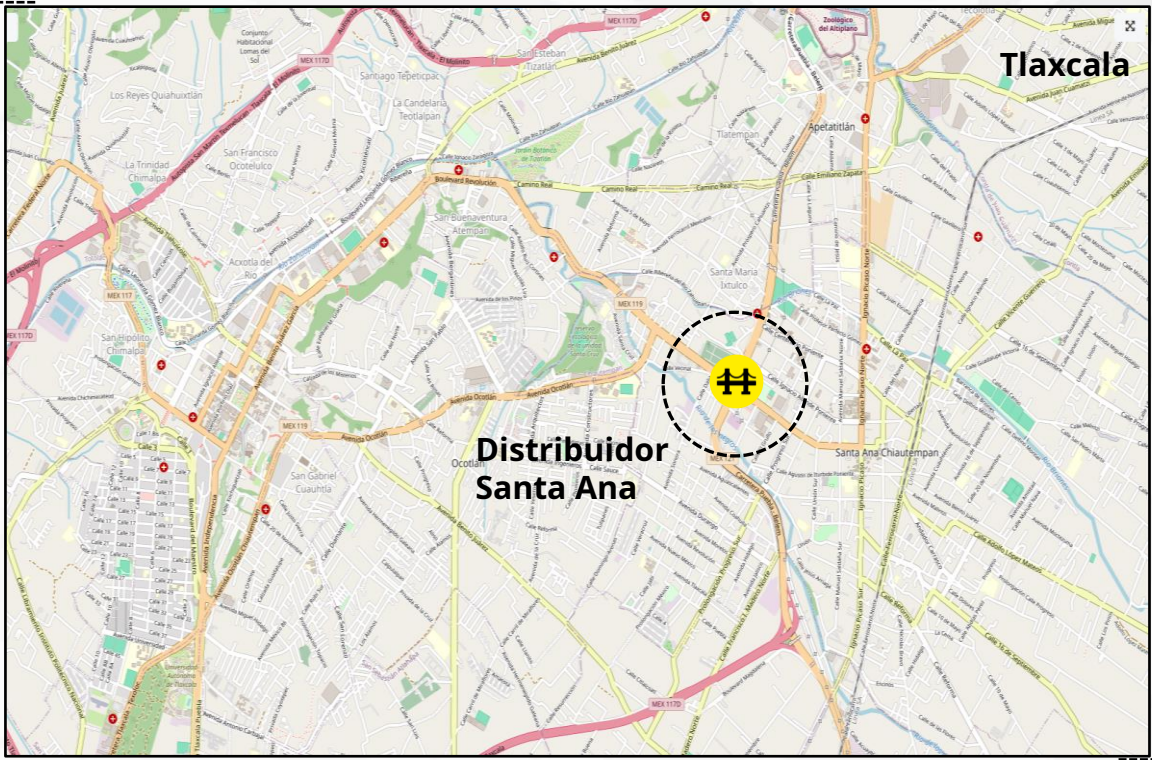

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	07 al 13-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	15.80% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	1.04%	1.80%	Se trabaja en pilas de los ejes #17 y 18; zapatas en los ejes #7 a 8 y columnas #12 al #15.

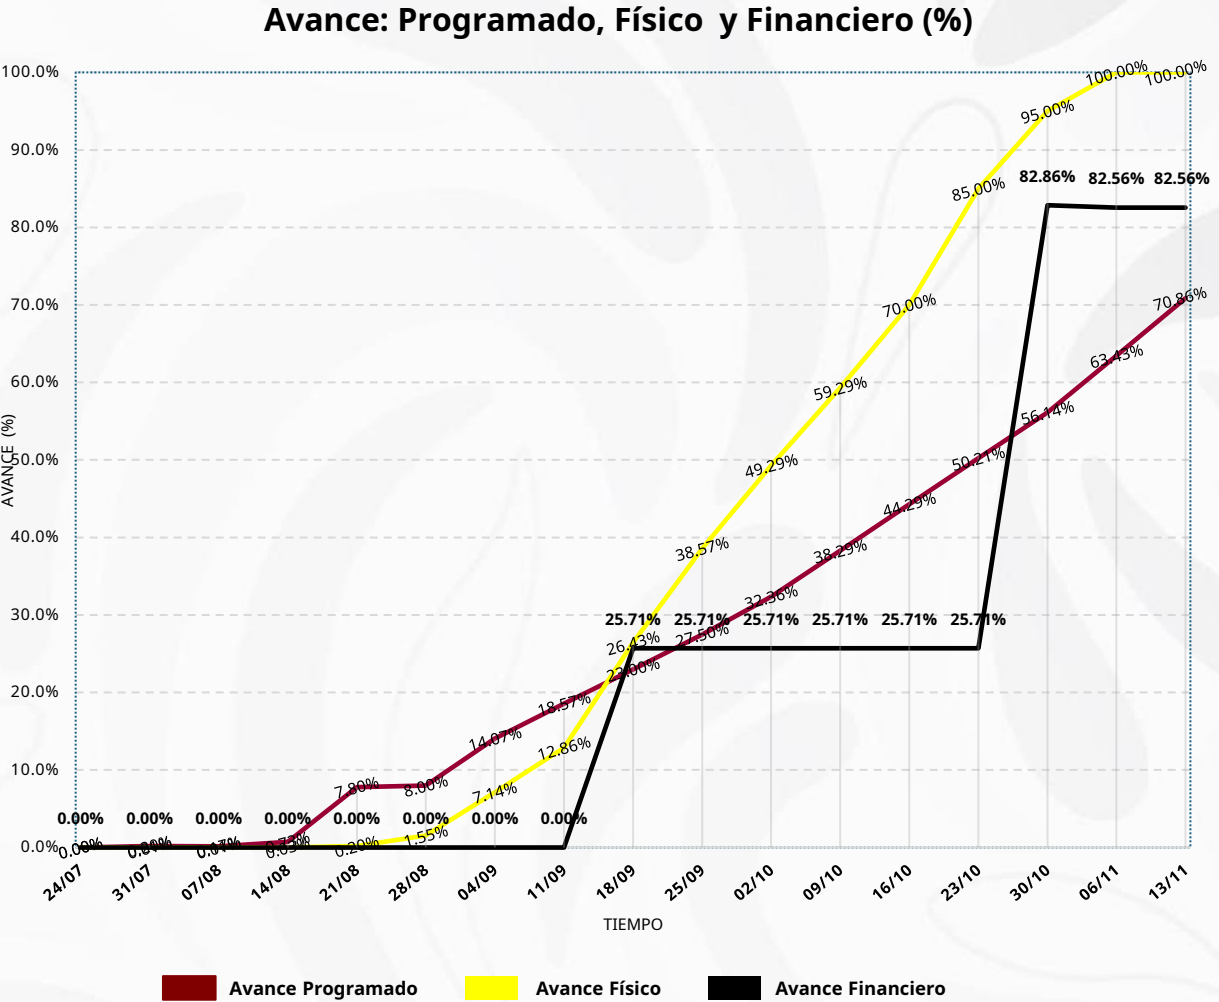

	31octubre al 06 de noviembre	07 al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	115	110
Maquinaria	21	20
