

# Puente La Presa Trancas

## Colima

**Avance global**

- Programado: 26.70 %
- Real: 13.26 %
- Semanal: 1.81 %
- Financiero: 13.26 %

**Avance 2025**

- Programado: 66.75 %
- Real: 33.15 %
- Semanal: 4.52 %
- Financiero: 33.15 %

 **Inversión total 2025-2026:** 90.0 mdp  
**Inversión 2025:** 30.0 mdp


 **Meta total:** 0.601 km  
**Meta 2025:** 38.6 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025  
**Fecha de término:** 10 de agosto, 2026  
**Termino meta 2025:** 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

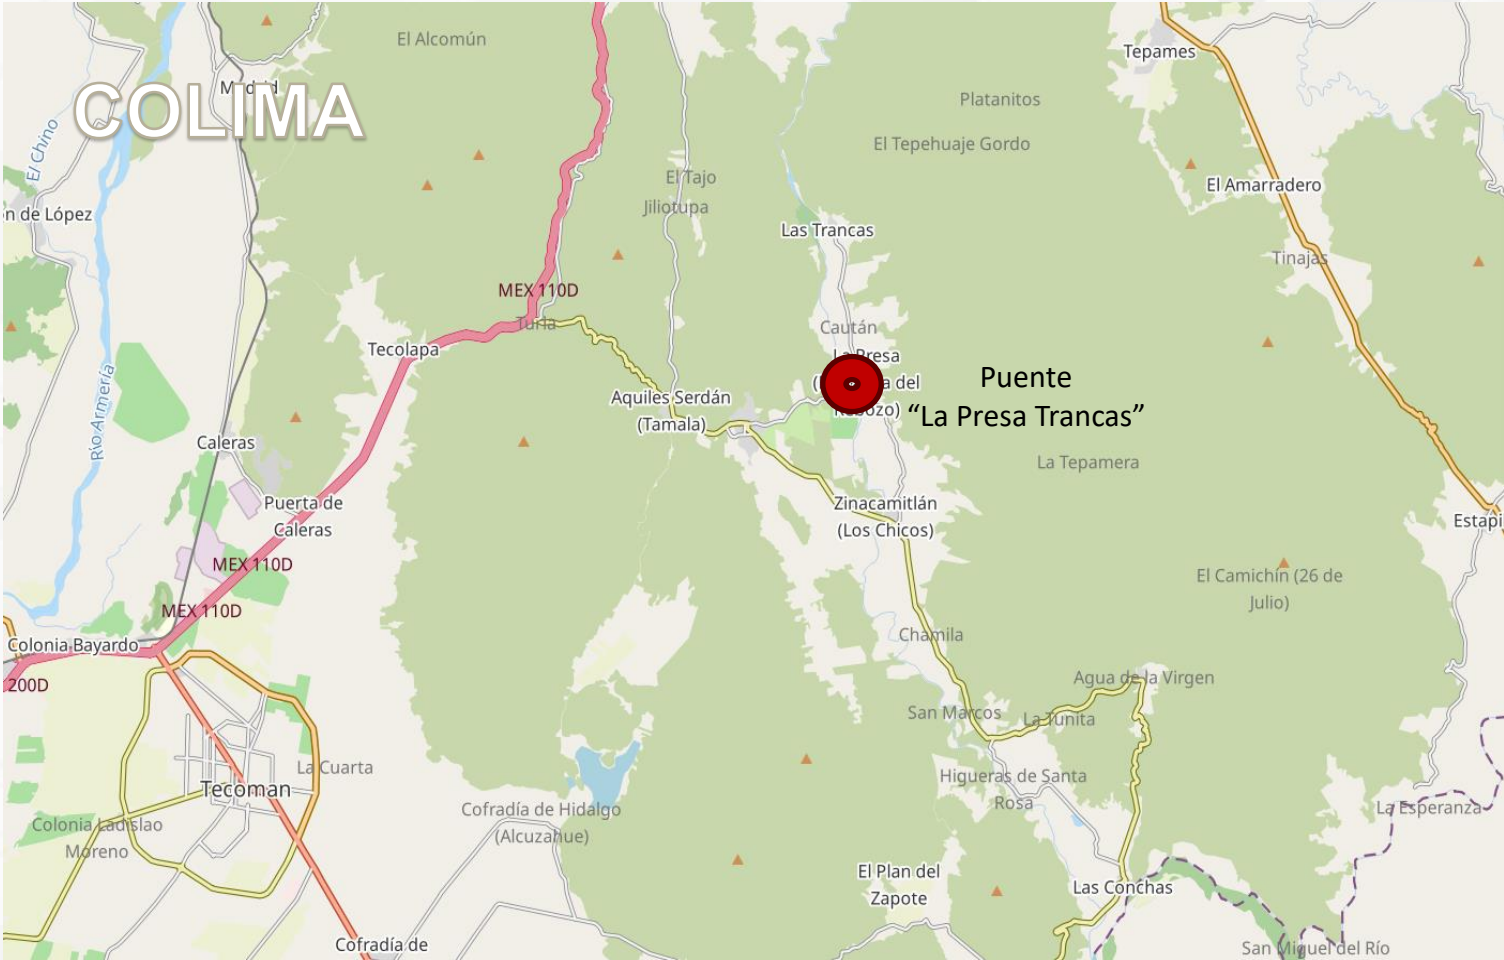

| Tramo                                    | Empresas                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Puente La Presa Trancas | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> ANMA INGENIERÍA, SA DE CV</li></ul> |

# Puente La Presa Trancas

## Colima

| Elemento                                              | Intervención | Ejecutado<br>acumulado | Faltante | 07/11/25 al 13/11/25 |           | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                                       |              |                        |          | Programado           | Ejecutado |               |
| Preliminares                                          |              |                        |          |                      |           |               |
| Desmonte y Despalme (Ha)                              | 0.83         | 0.83                   | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |               |
| Subestructura                                         |              |                        |          |                      |           |               |
| Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.              | 26.00        | 9.00                   | 17.0     | 2.4                  | 0.00      |               |
| Pilas de cimentación (Armado). Pza.                   | 26.00        | 20.0                   | 6.00     | 1.5                  | 0.00      |               |
| Pilas de cimentación (Colado). Pza.                   | 26.00        | 9.00                   | 17.00    | 2.4                  | 0.00      |               |
| Columnas. Pza.                                        | 2.00         | 0.00                   | 2.00     | 0.3                  | 0.00      |               |
| Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.               | 4.00         | 0.00                   | 4.00     | 1.3                  | 0.00      |               |
| Superestructura                                       |              |                        |          |                      |           |               |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación) | 18.00        | 5.00                   | 13.00    | 1.4                  | 3.30      |               |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)     | 18.00        | 0.00                   | 18.00    | 0.00                 | 0.00      |               |
| Colado de diafragma y losa. M3                        | 197.1        | 0.00                   | 197.1    | 0.00                 | 0.00      |               |
| Carpeta asfáltica. M3.                                | 220          | 0.00                   | 220      | 0.00                 | 0.00      |               |
| Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.              | 43.8         | 0.00                   | 43.8     | 0.00                 | 0.00      |               |
| Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.     | 182          | 0.00                   | 182      | 0.00                 | 0.00      |               |

