




Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 23.69%
- Real: 40.64%
- Semanal: 3.11%
- Financiero: 30.59%

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

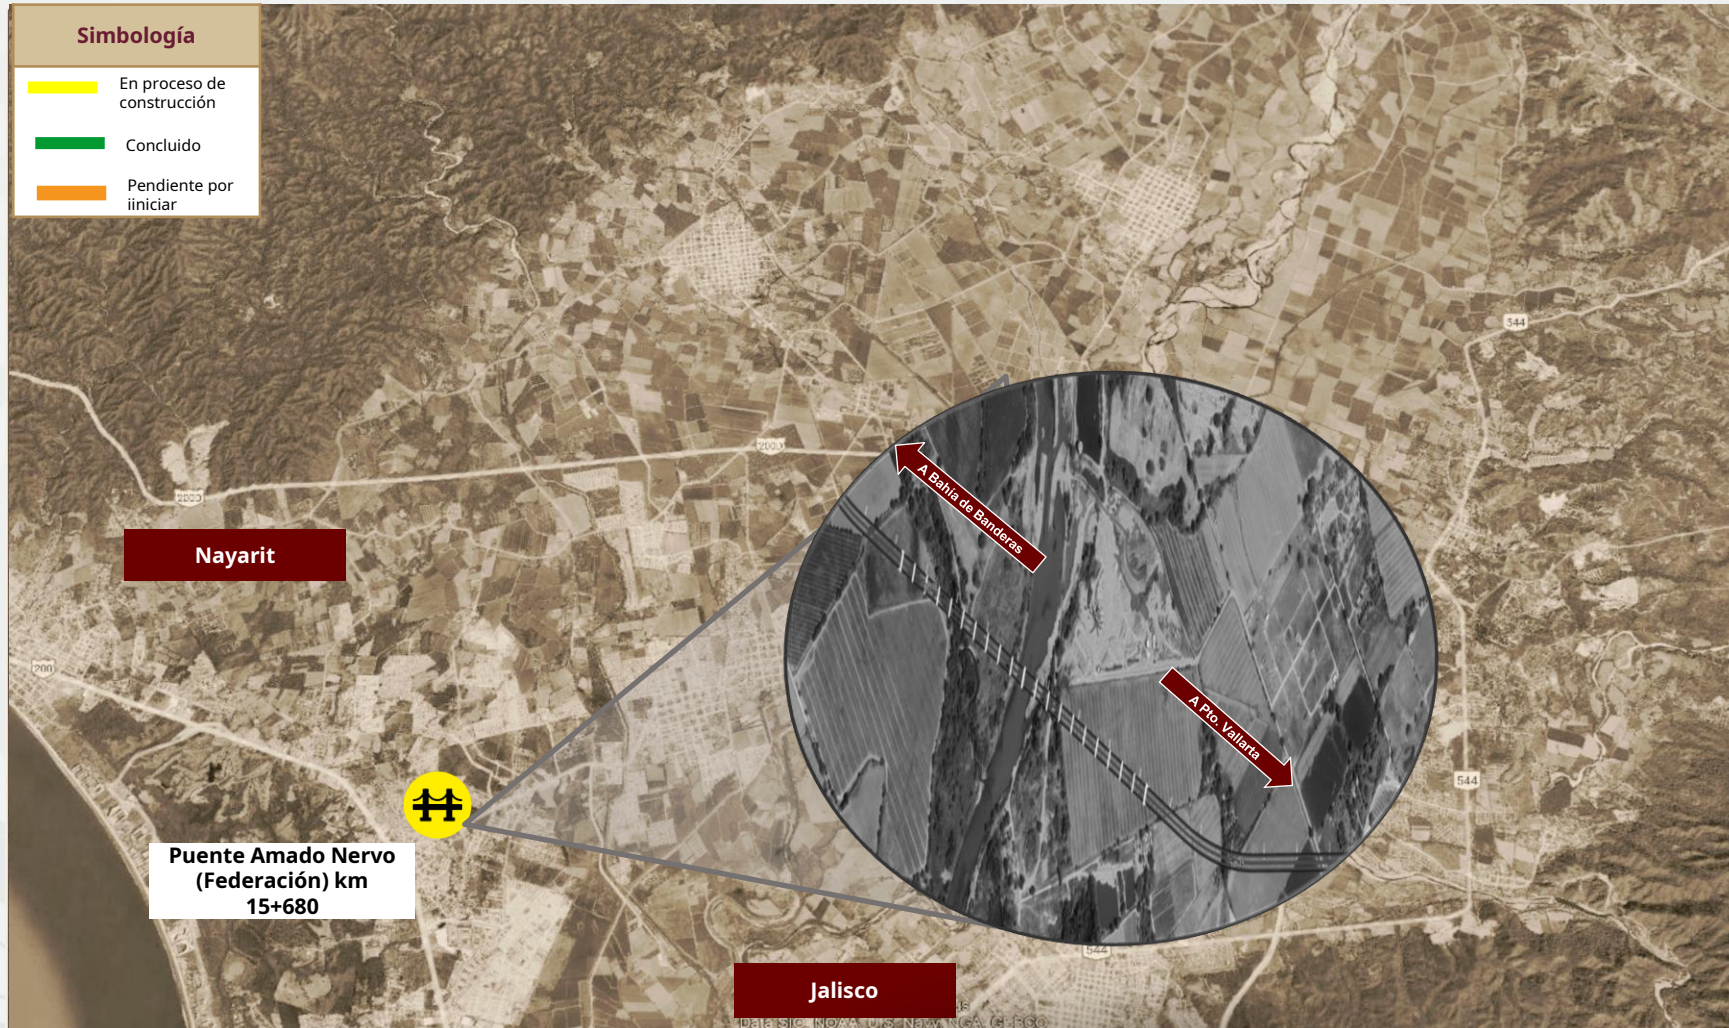

Inversión total 2025-2026: 930.0 mdp

Meta total: 1 Puente | 0.798 km

Accesos | 1.222 km



Inversión 2026: 700.0 mdp

Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025

Término: Septiembre de 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 16 al 22/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,866.2	56.0%	6,175.8	6,175.80	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	47,250	29.3%	113,867.0	3,450.50	0	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	10.40	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	119	94.4%	7	5	4	Se tienen coladas 115 columnas de los apoyos 1 al 10 y 12 al 21.
Cabezales	pza.	21	18	85.7%	3	1	0	Se tienen colados 18 cabezales de los apoyos 1 al 6, 8, 9 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	75	46.9%	85	6	16	Se tienen coladas 75 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	60	37.5%	100	8	20	Se tienen montados los claros 5-6, 14-15 , 16-17, 18-19 y 19-20. Se encuentran en proceso 4-5 y 17-18
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	278	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	399	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2	43.8%	2.00	0	0	Se continúa el acomo de cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.3	65.0%	0.70	0.7	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

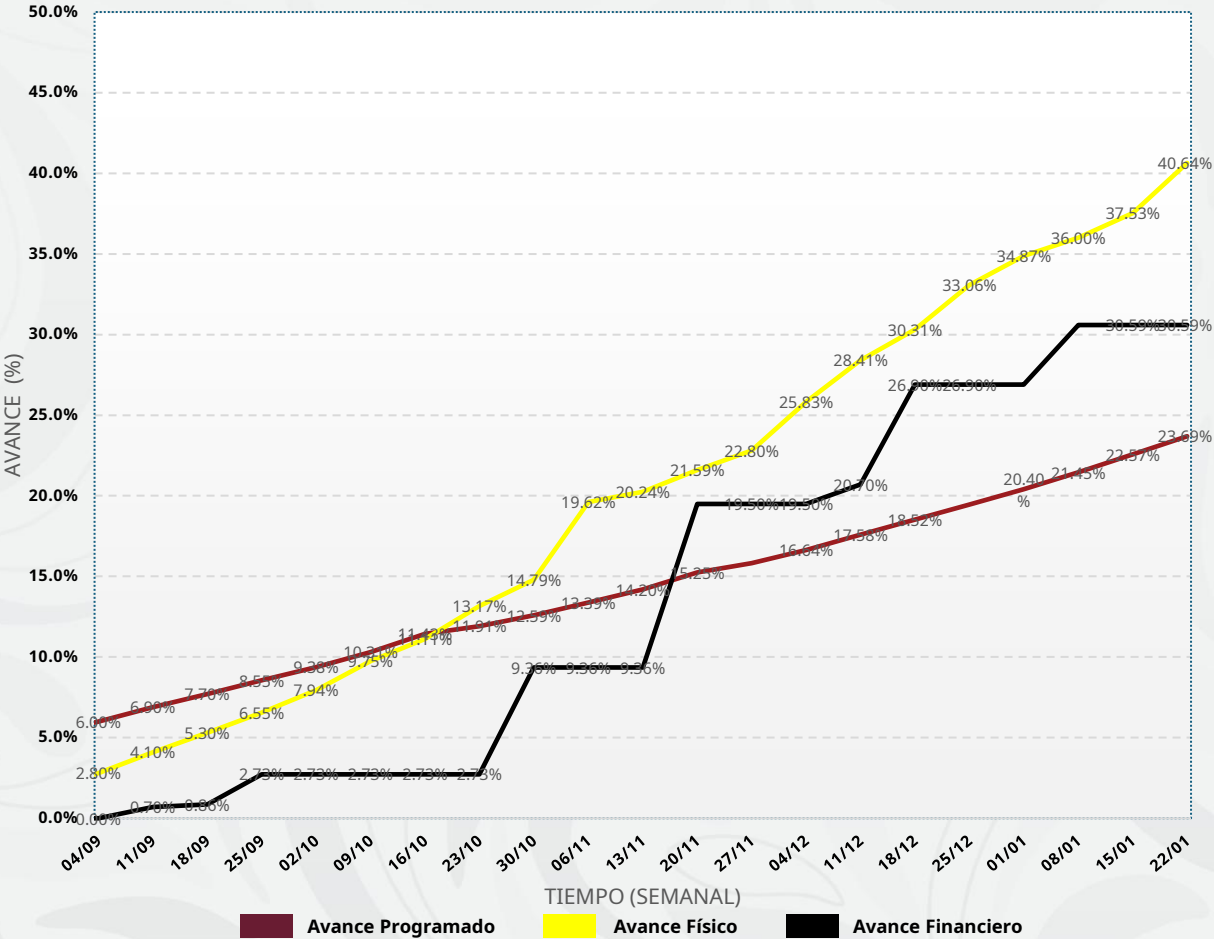

	09 de Enero al 15 de Enero	16 de Enero al 22 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	60	85
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
