

# PSV Arco Norte

## Colima



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**

- Programado: 55.04%
- Real: 58.10%
- Semanal: 0.85%
- Financiero: 34.11%



**Inversión total 2025-2026:** 436 mdp

**Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.



**Inversión 2026:** 251.0 mdp

**Meta 2026:** 267 m (45.2% (superestructura, pavimentos, accesos, iluminación y obras complementarias bajo puente))



**Inicio:** 10 de junio de 2025

**Término:** abril 2026




**306,810** habitantes beneficiados



**1,308** empleos generados



**15 min** ahorro en tiempo

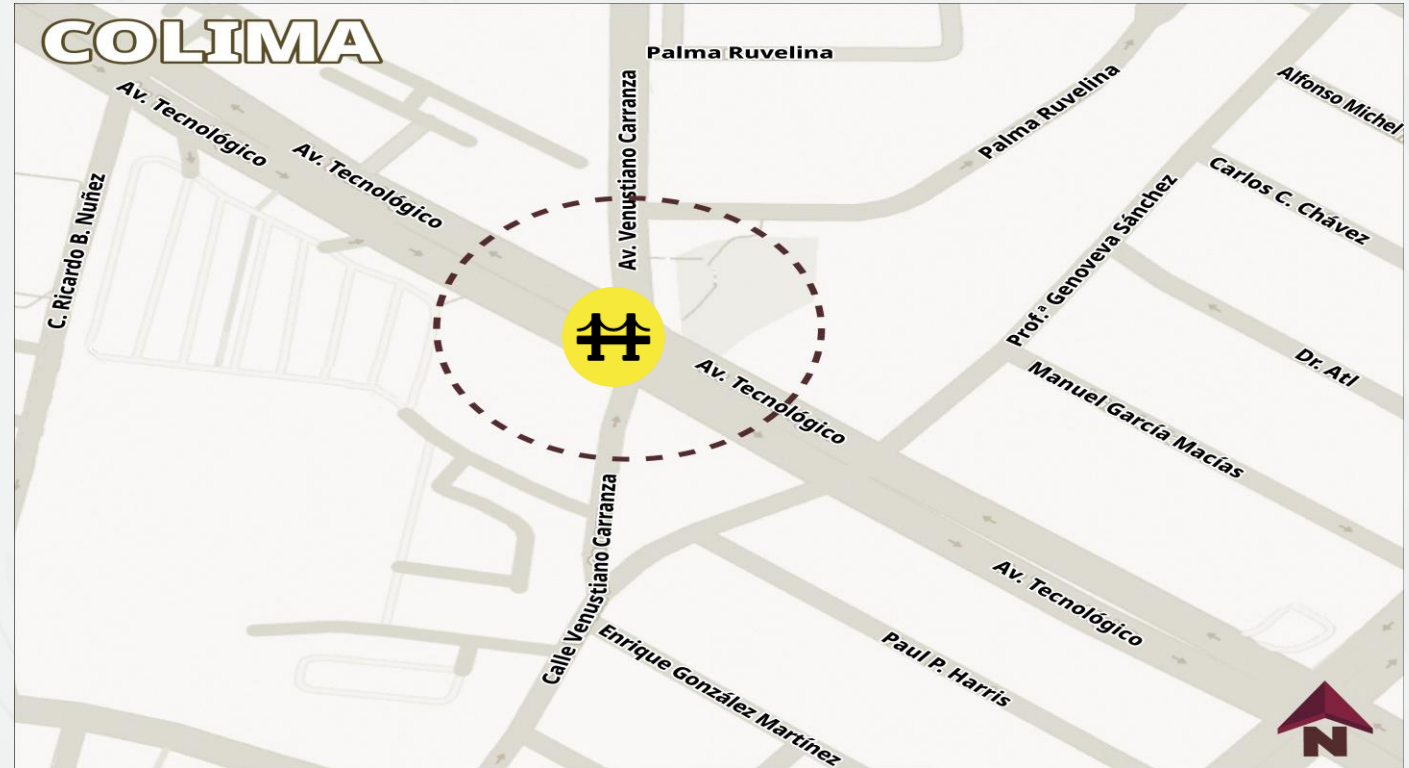

**Nivel de Servicio C**



**Situación actual**

**Nivel de Servicio en estudio**



**Proyecto**

| Tramo                                                 | Empresas                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratista:</b> IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</li> <li>• <b>Supervisión:</b> JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V</li> </ul> |

# PSV Libramiento Arco Norte


## Colima

ACTUALIZADA



Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

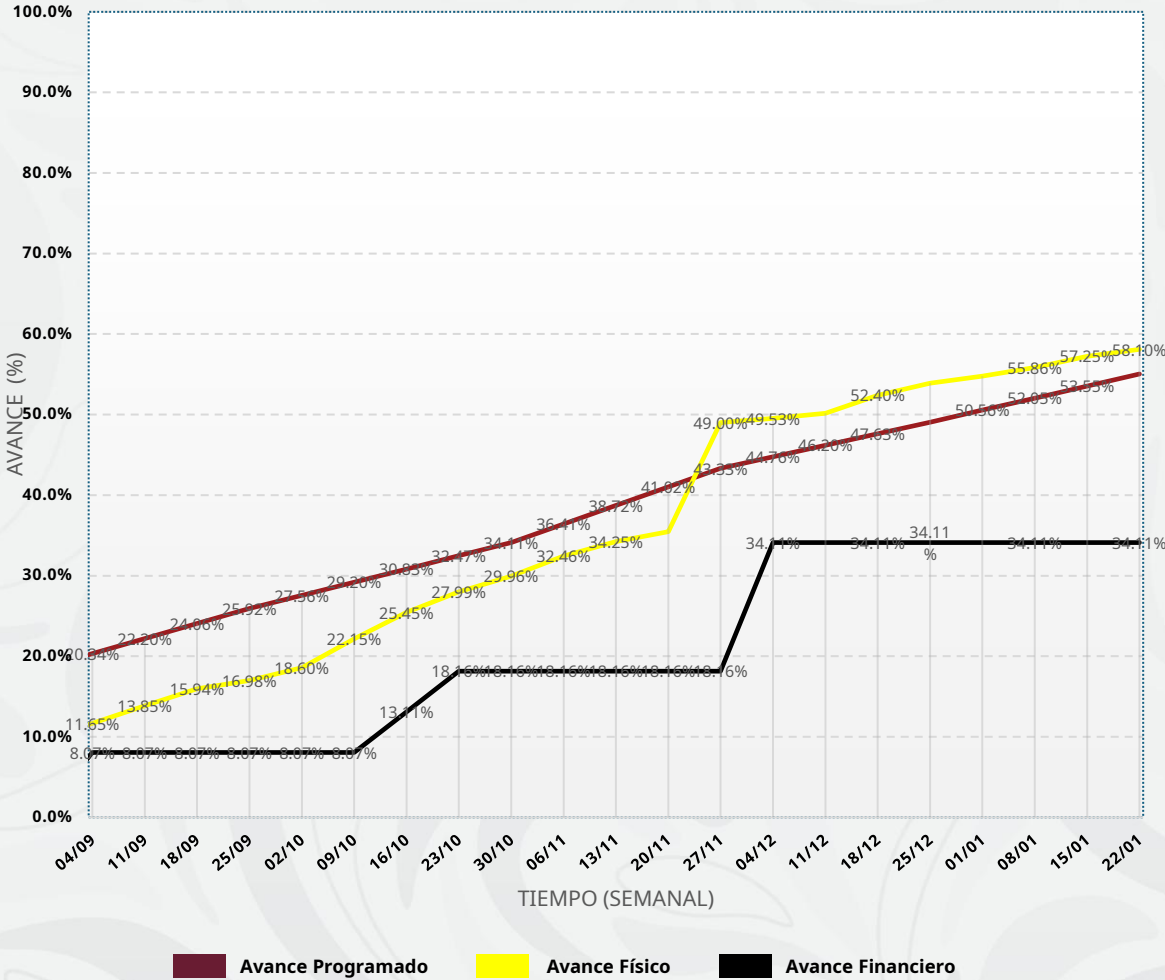

| Elemento                                          | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 16/01/26 al 22/01/26 |           | Observaciones       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|
|                                                   |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |                     |
| Trabajos diversos                                 |              |                     |          |                      |           |                     |
| Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza) | 530.0        | 530.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Demolición (m)                                    | 350.0        | 350.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Red de media tensión subterránea (m)              | 2,100.0      | 2,100.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Reubicación acueducto 36" (m)                     | 736.0        | 736.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Terracerías                                       |              |                     |          |                      |           |                     |
| Corte (m³)                                        | 9,295.00     | 0.00                | 9,295.00 | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Terraplén (m³)                                    | 9,292.00     | 0.00                | 9,292.00 | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Subyacente (m³)                                   | 3,233.00     | 0.00                | 3,233.00 | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Subrasante (m³)                                   | 4,706.00     | 0.00                | 4,706.00 | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Subestructura                                     |              |                     |          |                      |           |                     |
| Pilas (pza)                                       | 76.00        | 76.00               | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Zapatas (pza)                                     | 20.00        | 20.00               | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Columnas (pza)                                    | 42.00        | 42.00               | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |
| Cabezales (pza)                                   | 22.00        | 22.00               | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Trabajos concluidos |

|                              | 09 de enero al 15 de enero | 16 de enero al 22 de enero |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 80                         | 80                         |
| Maquinaria                   | 19                         | 19                         |
| Frentes de trabajo           | 5                          | 5                          |
