

Puente El Chical

Colima



Avance global

- Programado: 47.96 %
- Real: 82.44%
- Semanal: 2.76 %
- Financiero: 24.0 %



Inversión total 2025-2026: 137 mdp

Meta total: 0.736 km



Inversión 2026: 94 mdp

Meta 2026: 76.0 % del Puente



Fecha de inicio: 11 de agosto, 2025

Fecha de término: Marzo, 2026




4,053 habitantes beneficiados



411 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

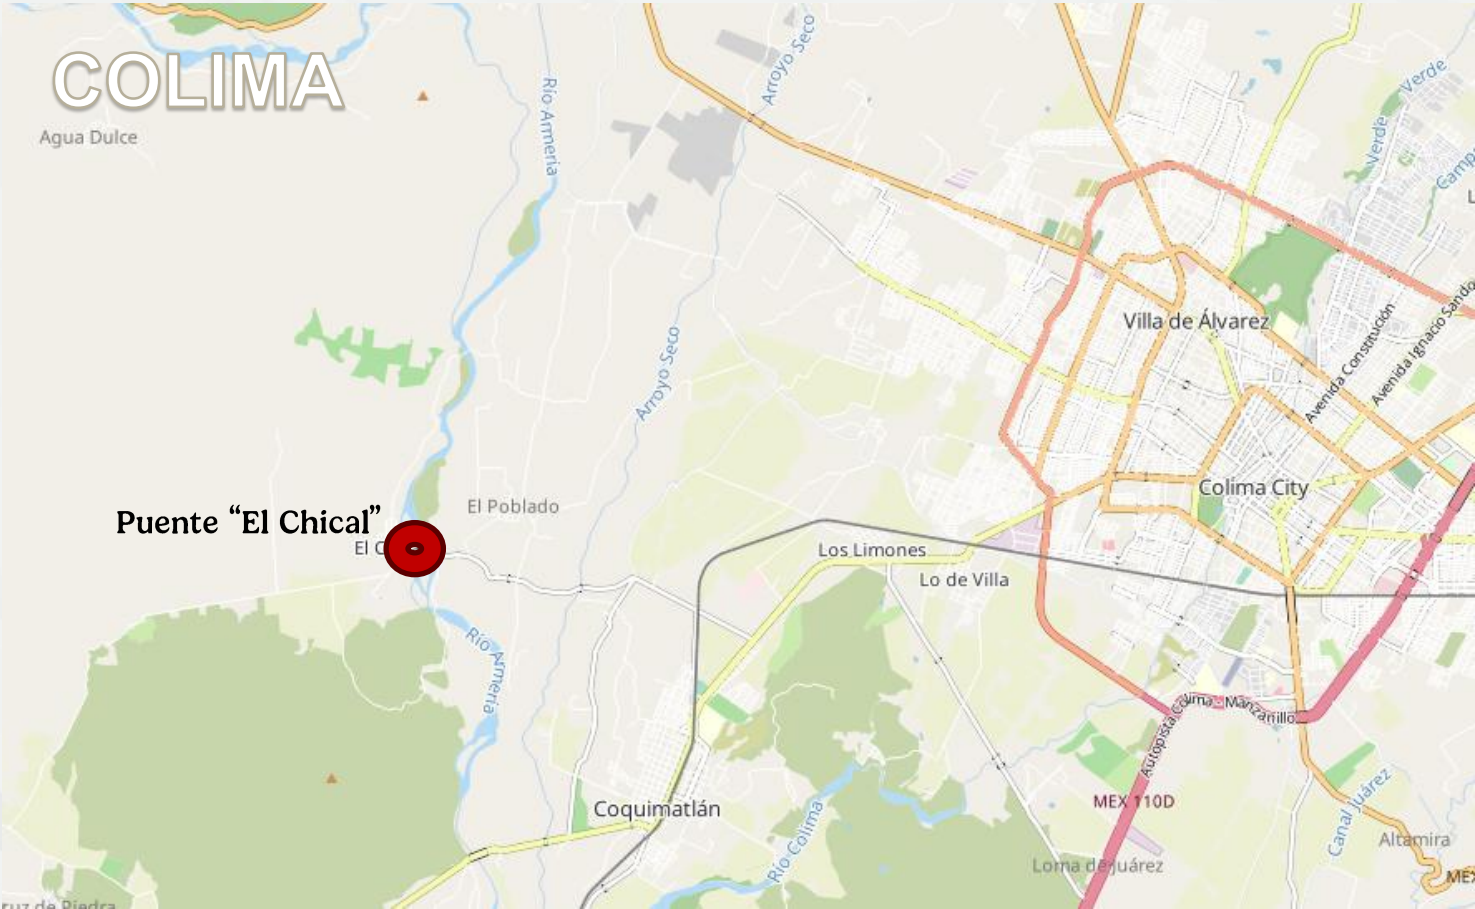

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima


ACTUALIZADA



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	16/01/26 al 22/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.00	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	432.0	216.0	0.0	144.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	240.0	480.0	0.0	240.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

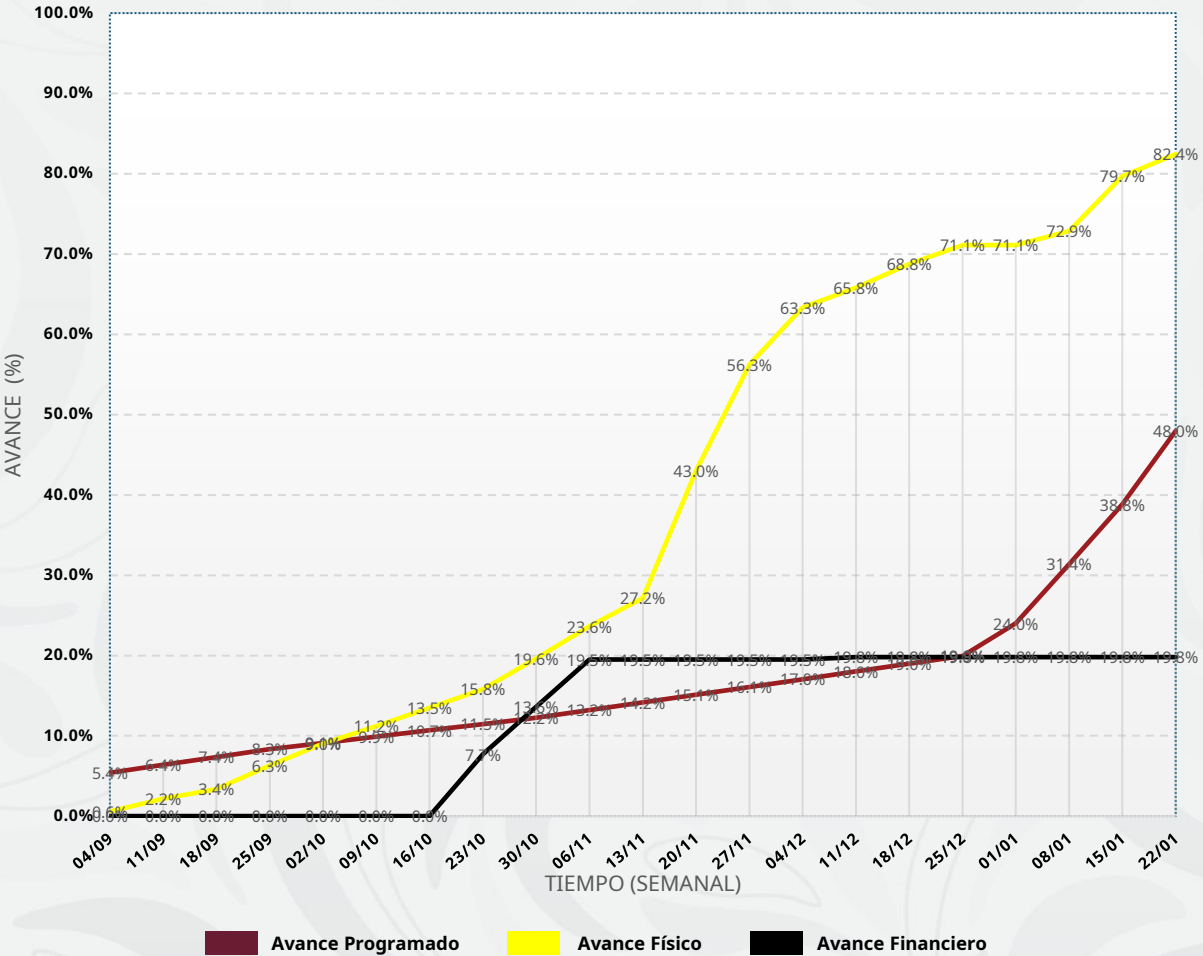

	09 de Enero al 15 de Enero	16 de Enero al 22 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	31	31
Maquinaria	5	5
Frentes de trabajo	5	5
