




Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 55.41%
- Real: 50%
- Semanal: 2.61%
- Financiero: 39.0%

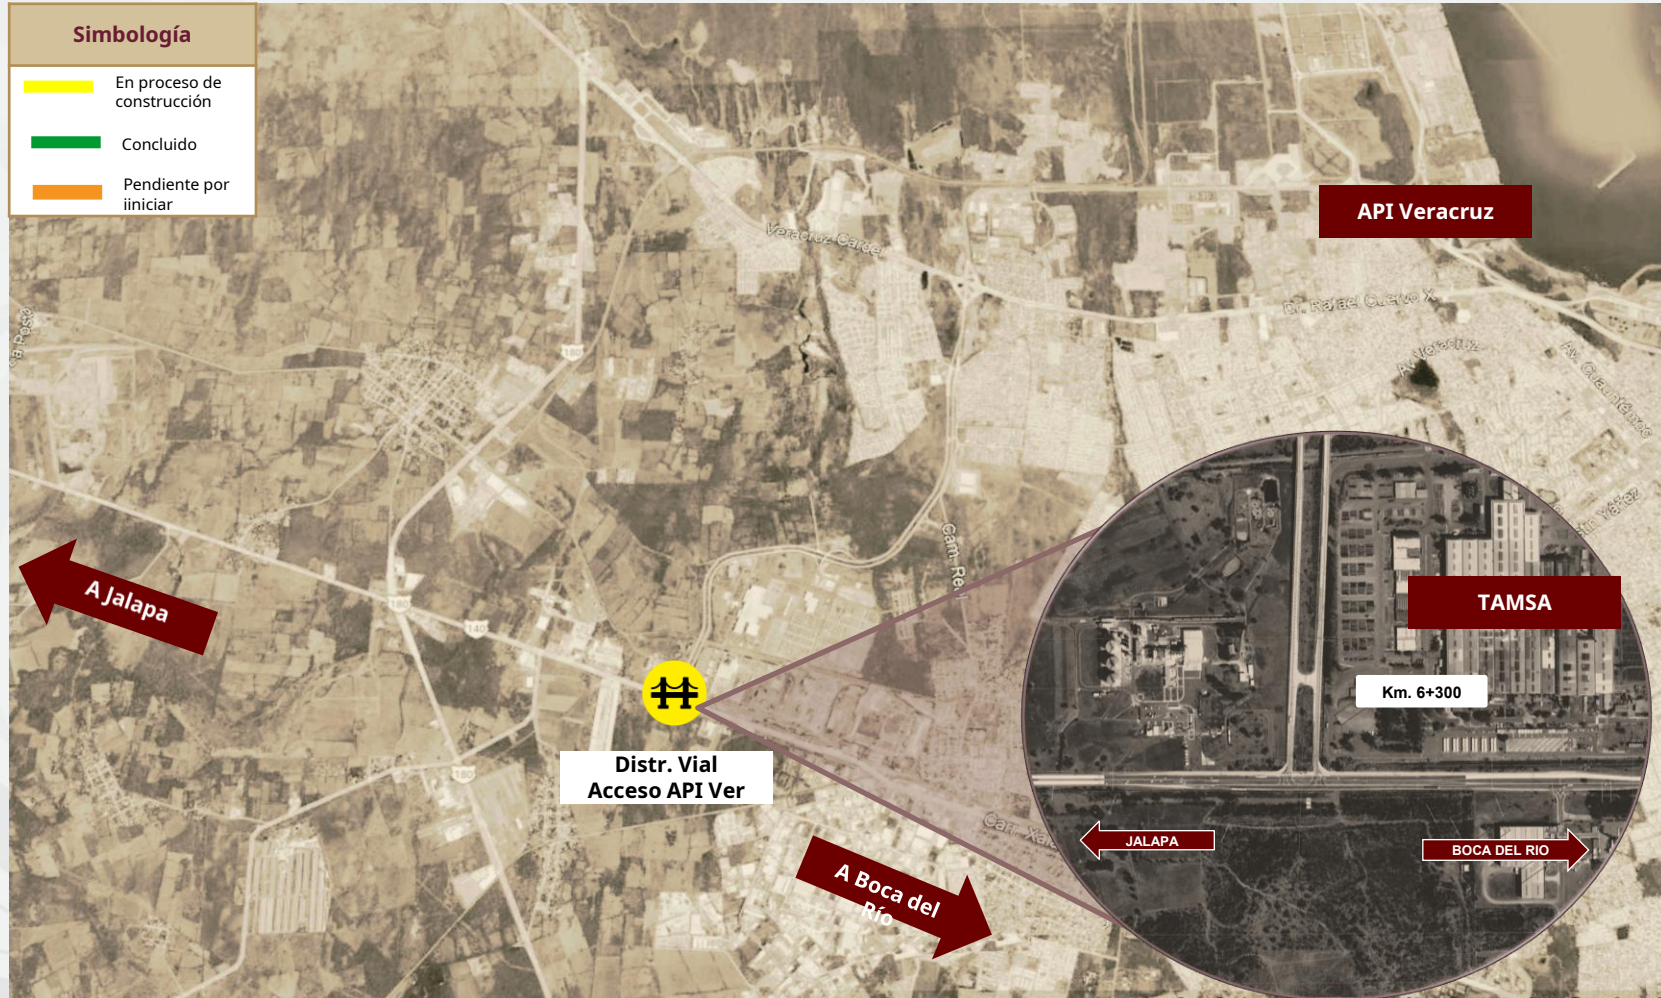

Inversión total: 867.3 mdp
Meta total 2025-2026: 1.97 km
 1 PSV: 0.872 km
 Accesos: 0.532 km
 Transiciones: 0.566 km



Inversión 2026: 500 mdp
Meta 2026: 1.18 km de PSV



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: junio de 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,602 empleos generados



25 min ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

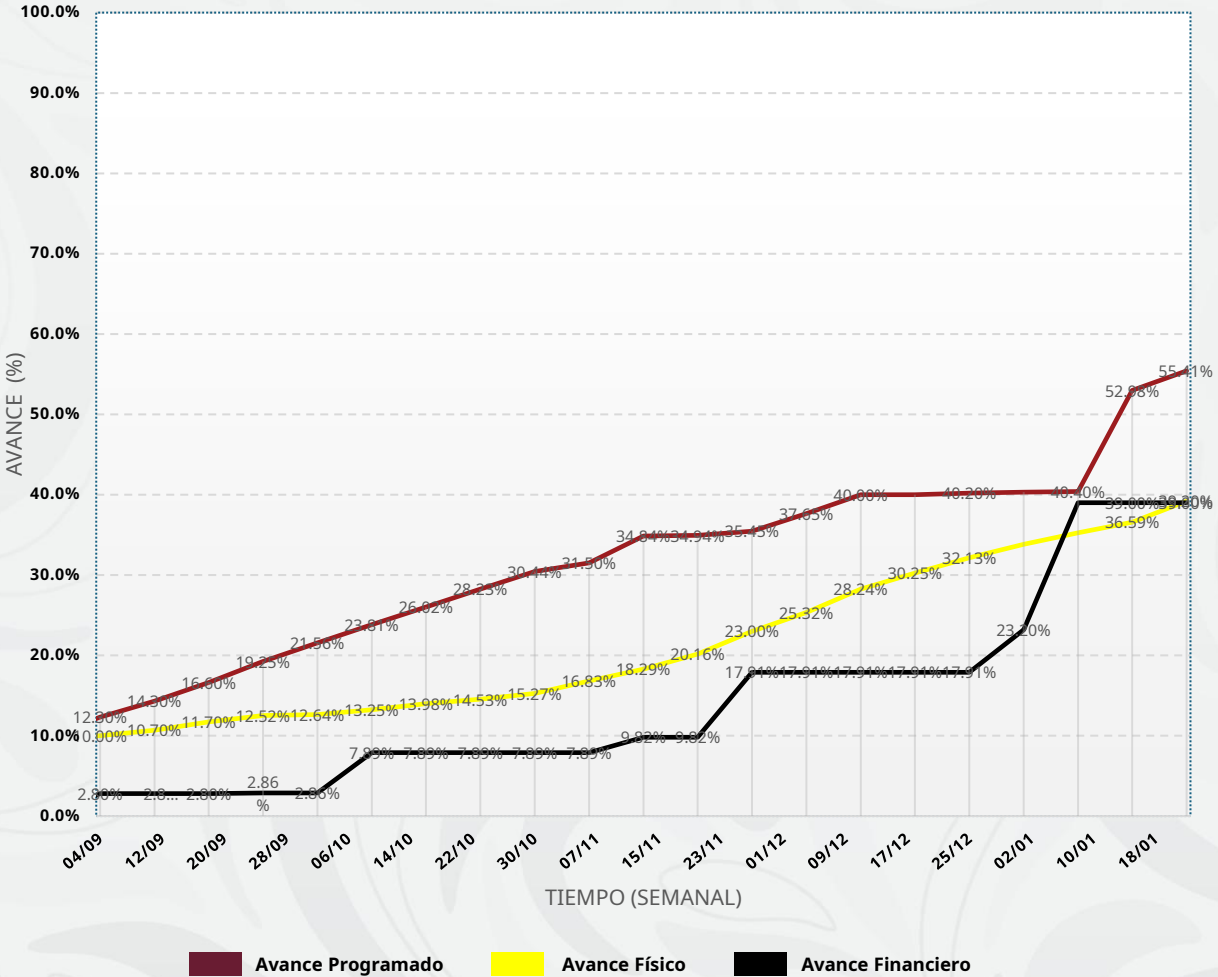

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 16 al 22/01/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	15,488.00	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	9,120.00	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,378	90.0%	153.00	765.50	1,378.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	2,192.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	772.50	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	124	93.9%	8	11	12.0	Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	108	81.8%	24	19	12.0	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	75	68.2%	35	14	5.0	
Losa (claro)	pza.	22.00	15	68.2%	7	4	1.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

	09 de Enero al 15 de Enero		16 de Enero al 22 de Enero	
Fuerza de Trabajo (personas)	107		134	
Maquinaria	35		38	
Frentes de trabajo	5		5	
