

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 62.42%
- Real: 73.78%
- Semanal: 1.02%
- Financiero: 60.1%



Inversión total 2025-2026: 405.0 mdp
Inversión 2026: 180.0 mdp



Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
Meta 2026: 34% de PSV | 0.27 km



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: marzo 2026



862,037 Habitantes beneficiados




1,215 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

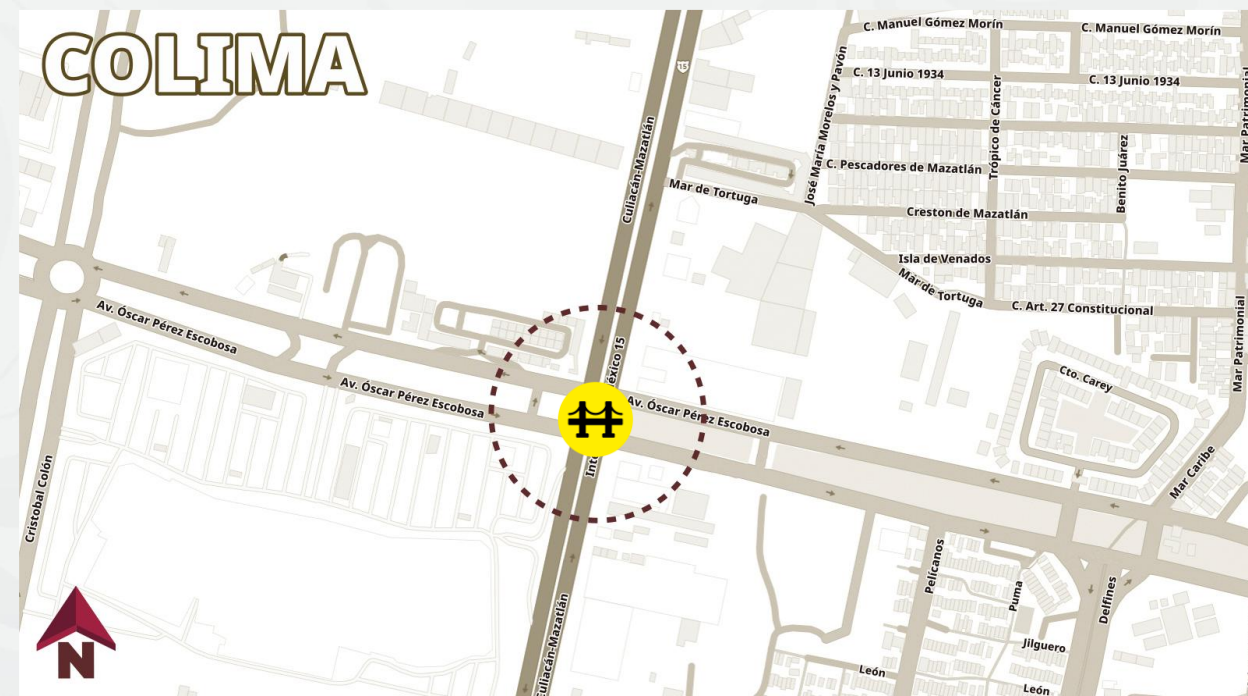


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

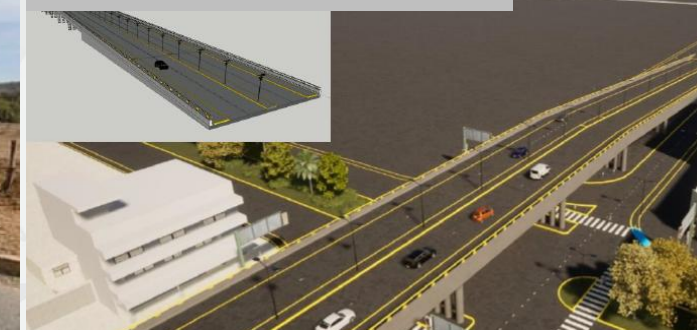

Proyecto


PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez
Sinaloa

ACTUALIZADA



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

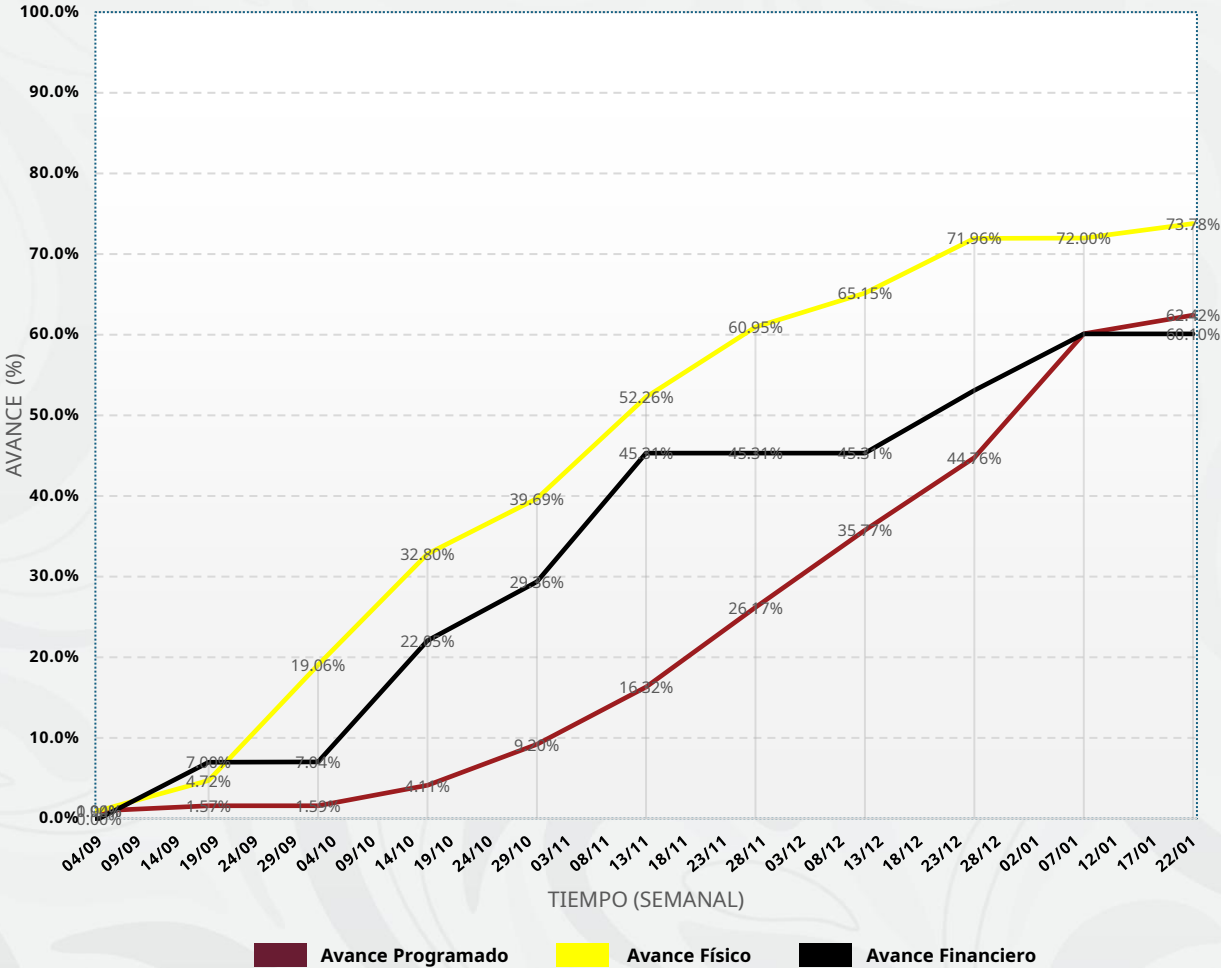

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 16 al 22/01/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Obras inducidas	Actividad	8	0	0.0%	8	0.0	0.0	
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura								
Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes Nebraska	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura								
Montaje de Trabes Nebraska NU240	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m	421.2	112.0	26.6%	309.2	0.0	112.0	
Dala de Cerramiento	Pieza	3	3	100.0%	0.0	0.00	0.0	Se avanza con el armado de acero de refuerzo del
Losa de concreto Hidráulico	Pieza	4	2	50.0%	2.0	1.00	0.0	
Junta de Calzada	m	958	330	34.4%	628.0	179.00	330.0	
Guarnición	m	958	0	0.0%	958.0	0.00	0.0	
Parapeto	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
Barrera Central	m	269.0	0	0.0%	269.0	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	526.0	10.5%	4,506.00	0	526.0	
Relleno Fluido	m3	3,992.0	205.0	5.1%	3,787.00	0	205.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	

	Del 09 de Enero al 15 de Enero	Del 16 de Enero al 22 de Enero
Personal	89	89
Maquinaria	10	13
Frentes de trabajo	9	9
