

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 29.48%
- Real: 38.90%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 24.10%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp
Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2026: 600 mdp
Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025
Término: julio de 2026




73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

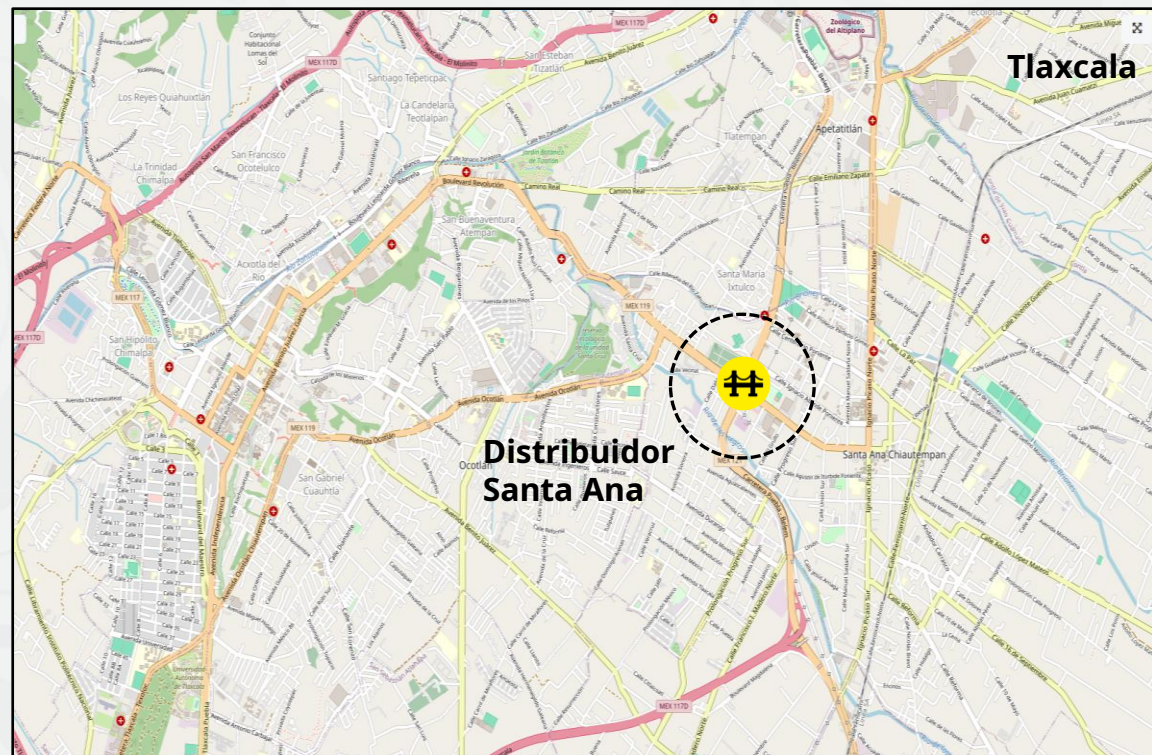


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	16 al 22-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	38.90% 1 Distribuidor Vial	61.10% de 1 Distribuidor Vial	0.49%	0.40%	Se trabaja en: Construcción de cabezales eje #10, 13 y 14, columnas octagonales de eje #5, columnas circulares eje #3 y pilas coladas en sitio eje #6.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

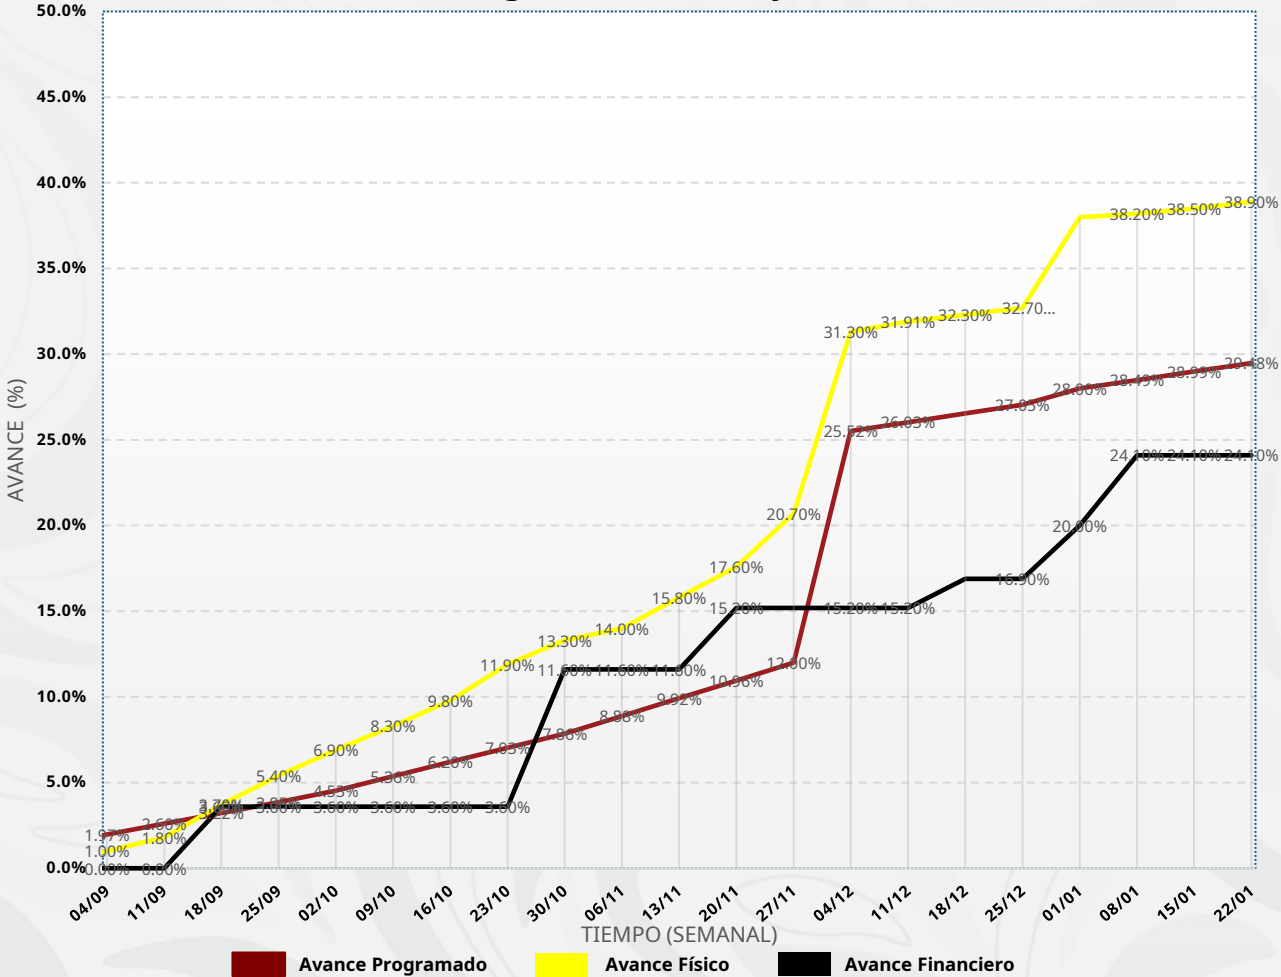

	09 al 15 de enero	16 al 22 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	92	90
Maquinaria	10	14
Frente de trabajo	12	13
