

# Puente La Presa Trancas

## Colima



**Avance global**

- Programado: 49.00 %
- Real: 44.88 %
- Semanal: 2.70 %
- Financiero: 29.98 %



**Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp  
**Meta total:** 0.601 km



**Inversión 2026:** 55.0 mdp  
**Meta 2026:** 61.4 % del Puente



**Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025  
**Fecha de término:** Abril, 2026




**4,053** habitantes beneficiados



**258** empleos generados



**15 min** ahorro en tiempo

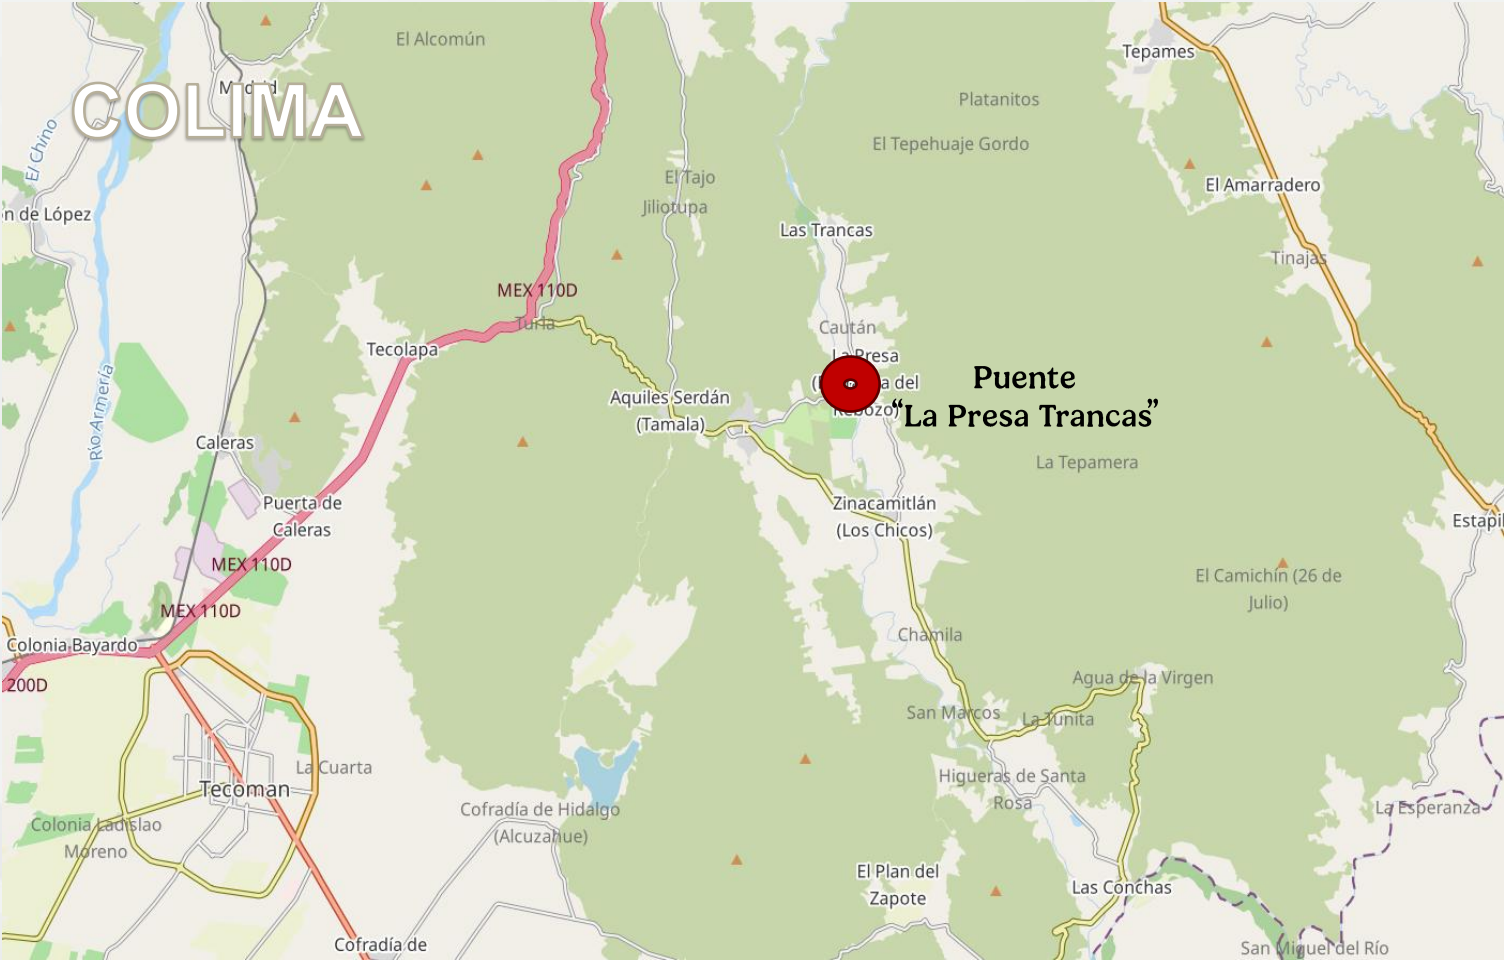

| Tramo                                    | Empresas                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Puente La Presa Trancas | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> ANMA INGENIERÍA, SA DE CV</li></ul> |


# Puente La Presa Trancas

## Colima



| Elemento                                              | Intervención | Ejecutado | Faltante | 16/01/26 al 22/01/26 |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
|                                                       |              | acumulado |          | Programado           | Ejecutado |
| Preliminares                                          |              |           |          |                      |           |
| Desmonte y Despalme (Ha)                              | 0.83         | 0.83      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Subestructura                                         |              |           |          |                      |           |
| Pilas de cimentación (Perforación). Pza.              | 26.00        | 26.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Pilas de cimentación (Armado). Pza.                   | 26.00        | 26.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Pilas de cimentación (Colado). Pza.                   | 26.00        | 26.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Columnas. Pza.                                        | 2.00         | 0.00      | 2.00     | 2.00                 | 0.00      |
| Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.               | 4.00         | 0.00      | 4.00     | 2.00                 | 0.00      |
| Superestructura                                       |              |           |          |                      |           |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación) | 18.00        | 18.00     | 0.00     | 2.00                 | 3.00      |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)     | 18.00        | 0.00      | 18.00    | 0.00                 | 0.00      |
| Colado de diafragma y losa. M3                        | 197.1        | 0.00      | 197.1    | 0.00                 | 0.00      |
| Carpeta asfáltica. M3.                                | 220          | 0.00      | 220      | 0.00                 | 0.00      |
| Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.              | 43.8         | 0.00      | 43.8     | 0.00                 | 0.00      |
| Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.     | 182          | 0.00      | 182      | 0.00                 | 0.00      |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

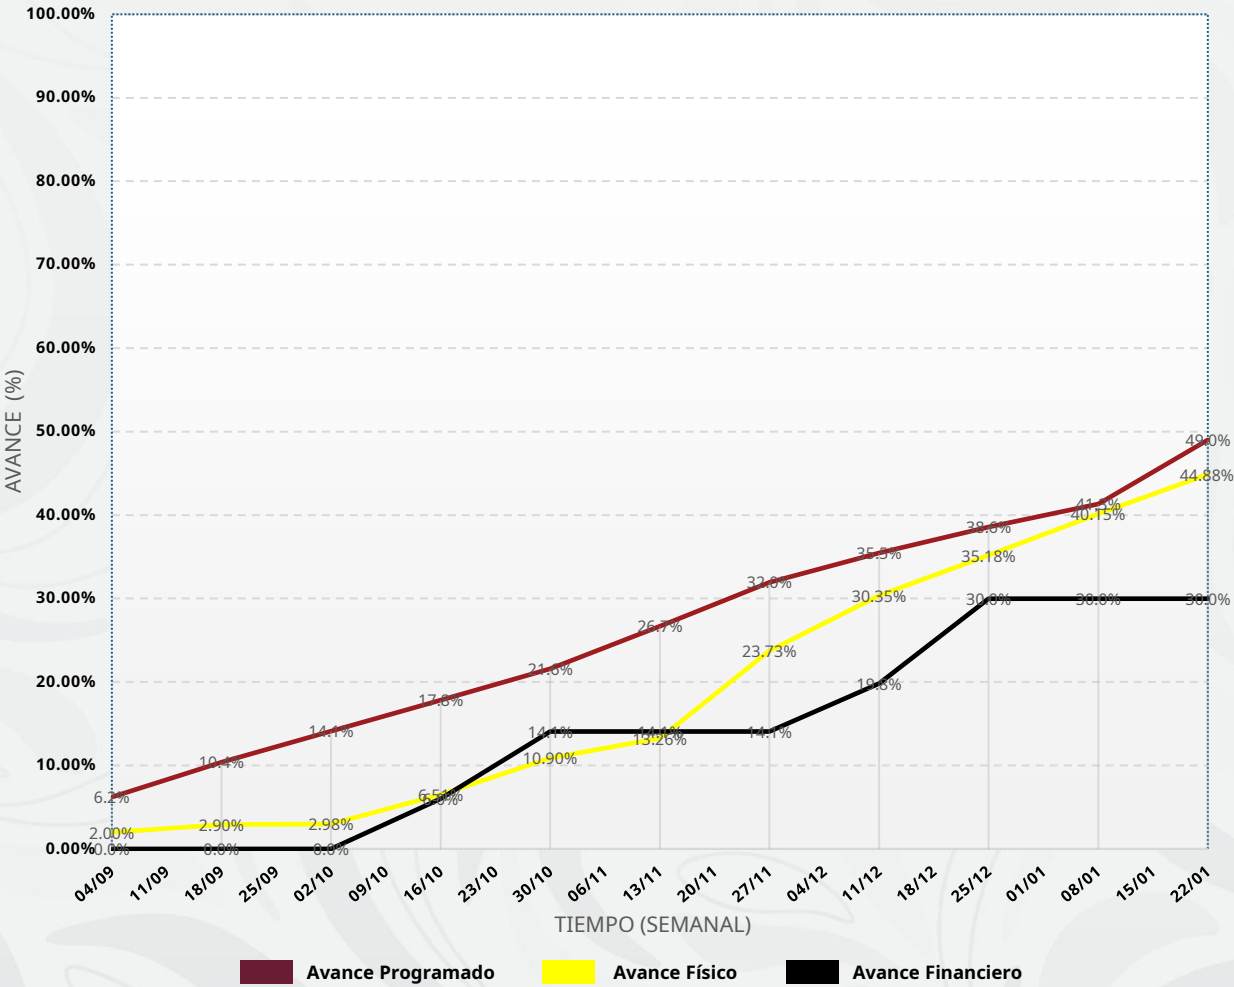

|                              | 09 de enero al 15 de enero | 16 de enero al 22 de enero |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 39                         | 39                         |
| Maquinaria                   | 7                          | 7                          |
| Frentes de trabajo           | 6                          | 7                          |
