


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 46.24%
- Real: 45.42%
- Semanal: 0.47%
- Financiero: 39.0%

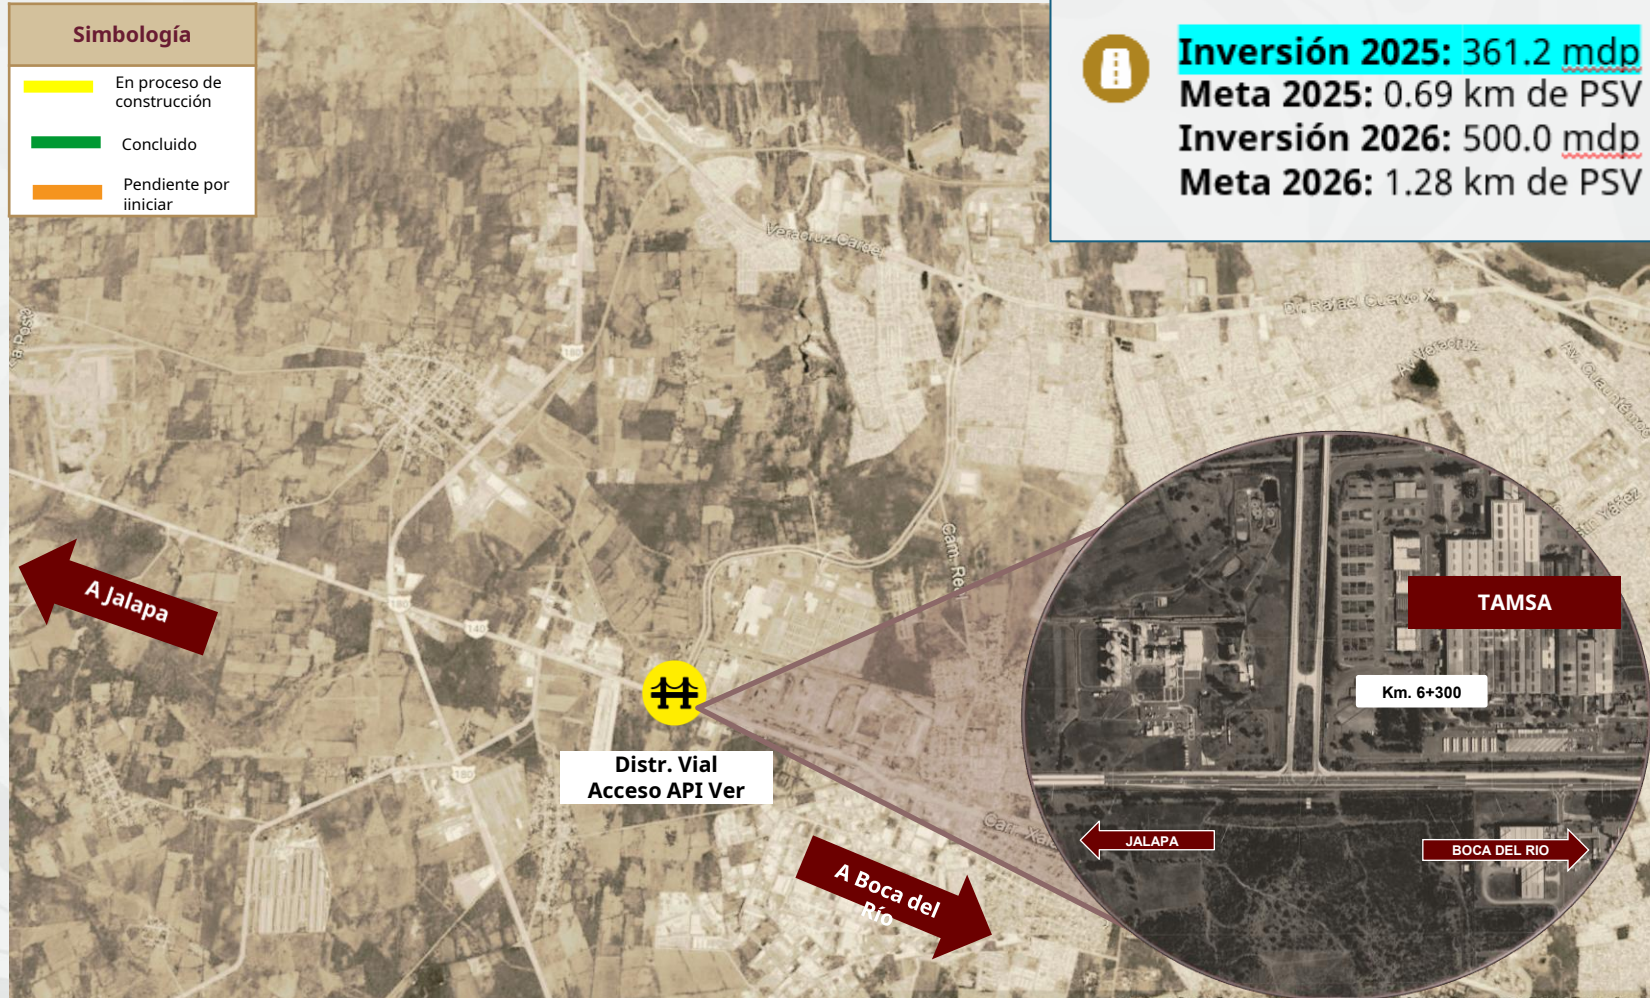

Inversión total: 867 mdp*
Meta total 2025-2026: 2 km*



Inversión 2025: 361.2 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV



Inversión total: 819.7 mdp
Meta total 2025-2026: 2 km



Inversión 2025: 319.7 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV



Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: junio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,601 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido


Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

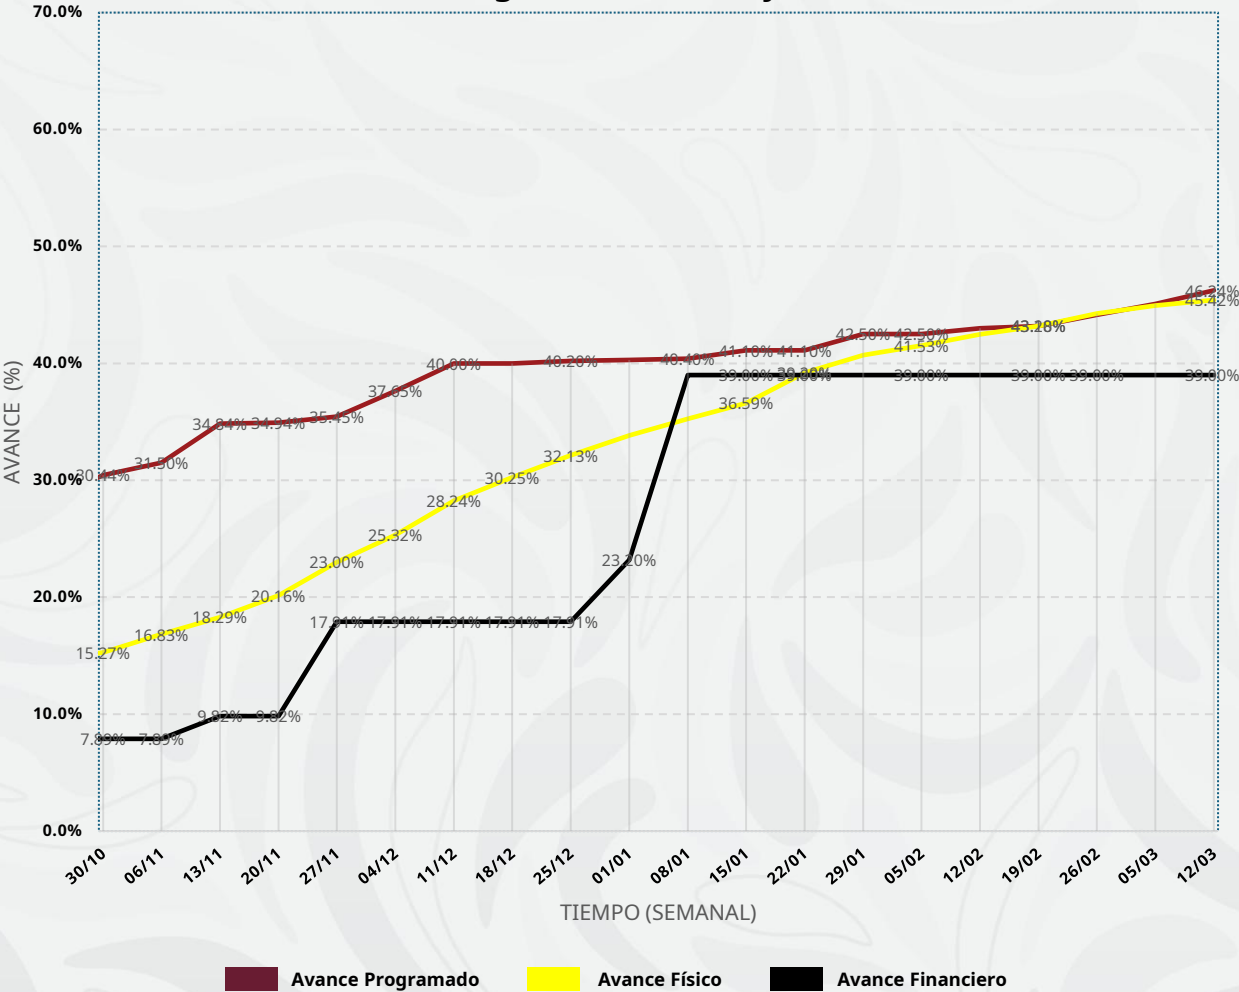

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 06 al 12/03/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.0	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.0	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Cortes	m³	52,059.00	52,059.0	100.0%	0.0	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Terraplenes	m³	36,650.00	36,650.0	100.0%	0.0	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	3,061.00	0.0	0.0%	3,061.0	1,020.30	0.0	Reprogramación
Base asfáltica	m³	3,731.00	3,131.0	83.9%	600.0	300.00	0.0	Reprogramación
Carpeta asfáltica	m³	2,425.00	0.0	0.0%	2,425.0	303.10	0.0	Reprogramación
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Losa (claro)	pza.	22	22	100.0%	0	2	0.0	Concluido en el cpo B
Guarnición	pza.	22	13	59.1%	9	6	5.0	Reprogramación
Barrera Central	pza.	22	5	22.7%	17	6	5.0	Reprogramación

	27 de Febrero al 05 de Marzo	06 de Marzo al 12 de Marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	104	112
Maquinaria	35	36
Frentes de trabajo	5	5
